
























Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ay '21 X V D	10 may '21 M J S	17 may '21 L X
1		MODULO 2 (B3-B4)	112 días?	lun 10/05/21	mar 21/09/21			
2		OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	100 días?	lun 10/05/21	mar			
3		OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PRELIMINARES	100 días?	lun 10/05/21	mar 07/09/21			
4		CONSTRUCCIONES PROVINCIONALES	1 día?	mar 11/05/21	mar 11/05/21			
5		OFICINA DE OBRA	1 día?	mar 11/05/21	mar 11/05/21			
6		CASETA DE GUARDIANIA	1 día?	mar 11/05/21	mar 11/05/21			
7		CARTEL DE OBRA 7.2 x 3.6 m	1 día?	mar 11/05/21	mar 11/05/21			
8		CERCO PROVINCIONAL	1 día?	mar 11/05/21	mar 11/05/21			
9		SERVICIOS HIGIENICOS PROVINCIONALES	1 día?	mar 11/05/21	mar 11/05/21			
10		INSTALACIONES PROVINCIONALES	1 día?	mar 11/05/21	mar 11/05/21			
11		AGUA PARA LA CONSTRUCCION	1 día?	mar 11/05/21	mar 11/05/21			
12		ENERGIA ELECTRICA	1 día?	mar 11/05/21	mar 11/05/21			
13		CONEXIÓN A INTERNET	1 día?	mar 11/05/21	mar 11/05/21			
14		DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION	1 día?	mar 11/05/21	mar 11/05/21			
15		TRABAJOS PRELIMINARES	2 días?	lun 10/05/21	mar 11/05/21			
16		LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	1 día?	lun 10/05/21	lun 10/05/21			
17		TRAZO Y REPLANTEO	1 día?	mar 11/05/21	mar 11/05/21			
18		SALUD Y SEGURIDAD	100 días	lun 10/05/21	mar 07/09/21			
19		IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD	100 días	lun 10/05/21	mar 07/09/21			
20		EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	100 días	lun 10/05/21	mar 07/09/21			
21		SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	100 días	lun 10/05/21	mar 07/09/21			
22		ESTRUCTURAS	102 días	lun 10/05/21	jue 09/09/21			
23		MOVIMIENTO DE TIERRAS	43 días	mié 12/05/21	jue 01/07/21			
24		EXCAVACIONES	6 días	mié 12/05/21	mar 18/05/21			



Proyecto: MODULO 2 (bloque 3) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





















Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ay '21				10 may '21				17 may '21			
						X	V	D	M	J	S	L	X				
25		EXCAVACIONES CON MAQUINARIA	3 días	mié 12/05/21	vie 14/05/21												
26		EXCAVACION MANUAL	5 días	jue 13/05/21	mar 18/05/21												
27		CORTE DE TERRENO NATURAL DE 15 cm	3 días	jue 13/05/21	sáb 15/05/21												
28		REFINE DEL TERRENO EXCAVACION	1 día	vie 14/05/21	vie 14/05/21												
29		RELLENOS	8 días	mar 22/06/21	jue 01/07/21												
30		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	4 días	mar 22/06/21	vie 25/06/21												
31		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO-ARFNA	4 días	jue 24/06/21	lun 28/06/21												
32		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO-AFIRMADO	4 días	sáb 26/06/21	jue 01/07/21												
33		NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO	2 días	lun 17/05/21	mar 18/05/21												
34		NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO	2 días	lun 17/05/21	mar 18/05/21												
35		ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	5 días	vie 14/05/21	mié 19/05/21												
36		ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	5 días	vie 14/05/21	mié 19/05/21												
37		ELIMINACIÓN DE MATERIAL C/MAQUINA	3 días	lun 17/05/21	mié 19/05/21												
38		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	41 días	vie 14/05/21	jue 01/07/21												
39		CONCRETO PARA SOLADOS e=10 cm C:H 1:10	2 días	vie 14/05/21	sáb 15/05/21												
40		CONCRETO PARA FALSOPISO C:H 1:8 e=10 cm	2 días	mié 30/06/21	jue 01/07/21												
41		OBRAS DE CONCRETO ARMADO	98 días	vie 14/05/21	jue 09/09/21												
42		ZAPATAS	30 días	vie 14/05/21	jue 17/06/21												
43		CONCRETO EN ZAPATAS f'c=280 kg/cm2	3 días	jue 10/06/21	sáb 12/06/21												
44		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS	6 días	vie 14/05/21	jue 20/05/21												
45		ENCOFRADO PARA ZAPATAS	2 días	mié 16/06/21	jue 17/06/21												
46		VIGAS DE CONEXIÓN	16 días	jue 03/06/21	lun 21/06/21												
47		CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION	2 días	sáb 19/06/21	lun 21/06/21												
48		ENCOFRADO PARA VIGAS DE CONEXIÓN	9 días	vie 11/06/21	lun 21/06/21												



Proyecto: MODULO 2 (bloque 3) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





















Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ay '21 X	V	D	10 may '21 M	J	S	17 may '21 L	X	V
49		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CONEXIÓN	9 días	jue 03/06/21	sáb 12/06/21									
50		SOBRECIMENTOS REFORZADOS	26 días	sáb 19/06/21	mar 20/07/21									
51		CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO f'c=175 kg/cm2	2 días	lun 19/07/21	mar 20/07/21									
52		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	5 días	jue 15/07/21	mar 20/07/21									
53		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en SOBRECIMENTOS	2 días	sáb 19/06/21	lun 21/06/21									
54		COLUMNAS	54 días	lun 17/05/21	lun 19/07/21									
55		CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	5 días	mié 14/07/21	lun 19/07/21									
56		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	22 días	mar 22/06/21	sáb 17/07/21									
57		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS	23 días	lun 17/05/21	vie 11/06/21									
58		VIGAS	25 días	mar 27/07/21	jue 26/08/21									
59		CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	2 días	mié 25/08/21	jue 26/08/21									
60		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	17 días	mar 27/07/21	mar 17/08/21									
61		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS	11 días	mar 03/08/21	sáb 14/08/21									
62		LOSAS ALIGERADAS	21 días	jue 05/08/21	sáb 28/08/21									
63		CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2	4 días	mié 25/08/21	sáb 28/08/21									
64		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS	15 días	jue 05/08/21	sáb 21/08/21									
65		LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO	3 días	jue 19/08/21	sáb 21/08/21									
66		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS.	6 días	vie 20/08/21	jue 26/08/21									
67		COLUMNETAS	52 días	jue 17/06/21	jue 19/08/21									
68		CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2	1 día	jue 19/08/21	jue 19/08/21									
69		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS	7 días	jue 12/08/21	jue 19/08/21									
70		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNETAS.	3 días	jue 17/06/21	sáb 19/06/21									
71		VIGA DE CONFINAMIENTO	8 días	jue 12/08/21	vie 20/08/21									
72		CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO f'c=175 kg/cm2	1 día	vie 20/08/21	vie 20/08/21									


Proyecto: MODULO 2 (bloque 3) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





















Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ay '21 X V D	10 may '21 M J S	17 may '21 L X
73		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	2 días	jue 12/08/21	vie 13/08/21			
74		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CONFINAMIENTO	2 días	jue 12/08/21	vie 13/08/21			
75		ESCALERAS	4 días	lun 06/09/21	jue 09/09/21			
76		CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2	1 día	jue 09/09/21	jue 09/09/21			
77		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS	2 días	lun 06/09/21	mar 07/09/21			
78		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS	2 días	mar 07/09/21	mié 08/09/21			
79		LOSAS MACIZAS	5 días	mar 31/08/21	sáb 04/09/21			
80		CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2	1 día	sáb 04/09/21	sáb 04/09/21			
81		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS	4 días	mar 31/08/21	vie 03/09/21			
82		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS MACIZAS	2 días	jue 02/09/21	vie 03/09/21			
83		VARIOS	100 días	lun 10/05/21	mar 07/09/21			
84		MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL	100 días	lun 10/05/21	mar 07/09/21			
85		ARQUITECTURA	68 días?	jue 01/07/21	mar 21/09/21			
86		ALBAÑILERIA	22 días?	mar 20/07/21	lun 16/08/21			
87		MURO DE LADRILLO DE ARCILLA 18 H (09x13x24) AMARRE SOGA MORTERO 1:5	22 días	mar 20/07/21	lun 16/08/21			
88		MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H (09x013x0.24) AMARRE DE CAREZA JUNTA 1.5 cm MORTERO 1:1:5	1 día?	mar 20/07/21	mar 20/07/21			
89		REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	21 días	jue 12/08/21	lun 06/09/21			
90		TARRAJEO DE MUROS INTERIORES	15 días	jue 12/08/21	sáb 28/08/21			
91		TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES	13 días	jue 12/08/21	jue 26/08/21			
92		TARRAJEO COLUMNAS	21 días	jue 12/08/21	lun 06/09/21			
93		TARRAJEO DE VIGAS	17 días	jue 12/08/21	mié 01/09/21			
94		TARRAJEO FONDO DE ESCALERAS	2 días	jue 12/08/21	vie 13/08/21			
95		PREPARACION DE GRADAS DE ESCALERA DE CONCRETO C:A 1:8 e=2"	2 días	jue 12/08/21	vie 13/08/21			
96		PREPARACION DE DESCANZO DE ESCALERA C:A 1:8 e=2"	1 día	jue 12/08/21	jue 12/08/21			


Proyecto: MODULO 2 (bloque 3) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





















Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ay '21 X V D	10 may '21 M J S	17 may '21 L X
97		CIELORRASOS	18 días	sáb 28/08/21	sáb 18/09/21			
98		TARRAJEO CIELO RASO	18 días	sáb 28/08/21	sáb 18/09/21			
99		PISOS Y PAVIMENTOS	5 días	jue 01/07/21	mar 06/07/21			
100		CONTRAPISOS	3 días	jue 01/07/21	sáb 03/07/21			
101		CONTRAPISO DE 5 cm	3 días	jue 01/07/21	sáb 03/07/21			
102		PISOS	3 días	sáb 03/07/21	mar 06/07/21			
103		PISO DE CEMENTO PULIDO	3 días	sáb 03/07/21	mar 06/07/21			
104		CARPINTERIA METALICA	7 días	mar 14/09/21	mar 21/09/21			
105		PUERTA METALICA DOS HOJAS PIVOTANTE CON PLANCHAS DE FIERRO	1 día	sáb 18/09/21	sáb 18/09/21			
106		BARANDAS METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 "	3 días	sáb 18/09/21	mar 21/09/21			
107		PUERTAS ENROLLABLES DE FIERRO	6 días	mar 14/09/21	lun 20/09/21			
108		PINTURAS	8 días	lun 13/09/21	mar 21/09/21			
109		PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	7 días	lun 13/09/21	lun 20/09/21			
110		PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	6 días	lun 13/09/21	sáb 18/09/21			
111		PINTURA LATEX A 2 MANOS COLUMNAS	7 días	lun 13/09/21	lun 20/09/21			
112		PINTURA LATEX A 2 MANOS VIGAS	5 días	lun 13/09/21	vie 17/09/21			
113		PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS	8 días	lun 13/09/21	mar 21/09/21			
114		OTROS	1 día?	lun 13/09/21	lun 13/09/21			
115		KIT PUNTO ECOLOGICO 3 CUERPOS	1 día?	lun 13/09/21	lun 13/09/21			
116		INSTALACIONES SANITARIAS	42 días?	lun 10/05/21	sáb 26/06/21			
117		SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	2 días?	lun 10/05/21	mar 11/05/21			
118		SALIDA DE DRENAJE PLUVIAL PVC-SAL 2"	1 día	lun 10/05/21	lun 10/05/21			
119		TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL PVC - SAL DE 2"	2 días	lun 10/05/21	mar 11/05/21			
120		SUMIDERO DE BRONCE 3"	1 día?	lun 10/05/21	lun 10/05/21			


Proyecto: MODULO 2 (bloque 3) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ay '21 X V D	10 may '21 M J S	17 may '21 L X V
121		RED DE DESAGUE	2 días?	jue 24/06/21	vie 25/06/21			
122		RED DE DERIVACION	1 día?	jue 24/06/21	jue 24/06/21			
123		TUBERIA PARA DESAGUE PVC - SAL DE 4"	1 día?	jue 24/06/21	jue 24/06/21			
124		ACCESORIOS DE REDES	2 días?	jue 24/06/21	vie 25/06/21			
125		YEE PVC 4" a 2"	1 día?	jue 24/06/21	jue 24/06/21			
126		CODOS 45° PVC 4"	1 día?	jue 24/06/21	jue 24/06/21			
127		CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" con registro de 8"	2 días	jue 24/06/21	vie 25/06/21			
128		SISTEMA CONTRA INCENDIO	2 días	jue 24/06/21	vie 25/06/21			
129		TUBERIAS	2 días	jue 24/06/21	vie 25/06/21			
130		TUBERIA 2 1/2" ACERO SCH 40	2 días	jue 24/06/21	vie 25/06/21			
131		VARIOS	1 día	jue 24/06/21	jue 24/06/21			
132		GABINETE CONTRA INCENDIO	1 día	jue 24/06/21	jue 24/06/21			
133		PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS	1 día?	sáb 26/06/21	sáb 26/06/21			
134		PRUEBA HIDRAULICA	1 día?	sáb 26/06/21	sáb 26/06/21			
135		INSTALACIONES ELECTRICAS	28 días?	lun 16/08/21	vie 17/09/21			
136		SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZAS Y SEÑALES	28 días?	lun 16/08/21	vie 17/09/21			
137		SALIDAS	7 días	lun 16/08/21	lun 23/08/21			
138		SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	4 días	jue 19/08/21	lun 23/08/21			
139		SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	3 días	lun 16/08/21	mié 18/08/21			
140		SALIDA INTERRUPTOR COMNUTACION	1 día	lun 16/08/21	lun 16/08/21			
141		SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA	2 días	lun 16/08/21	mar 17/08/21			
142		SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA	4 días	lun 16/08/21	jue 19/08/21			
143		SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO Y TEMPERATURA	1 día	jue 19/08/21	jue 19/08/21			
144		SALIDA PARA ESTACION MANUAL	1 día	lun 16/08/21	lun 16/08/21			


Proyecto: MODULO 2 (bloque 3) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ay '21 X V D	10 may '21 M J S	17 may '21 L X V
145		CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS	6 días	jue 19/08/21	mié 25/08/21			
146		TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm	6 días	jue 19/08/21	mié 25/08/21			
147		TUBERIA TIPO CONDUIT 20 mm (SENSORES DE HUMO)	2 días	jue 19/08/21	vie 20/08/21			
148		CABLES	2 días	mar 31/08/21	mié 01/09/21			
149		CABLE TW 2.5 mm2	2 días	mar 31/08/21	mié 01/09/21			
150		CABLE TW 4 mm2	1 día	mar 31/08/21	mar 31/08/21			
151		CAJAS	1 día?	jue 19/08/21	jue 19/08/21			
152		CAJA DE PASE CUADRADA 100 x 100 x 100 mm	1 día?	jue 19/08/21	jue 19/08/21			
153		TABLEROS ELECTRICOS	2 días	lun 16/08/21	mar 17/08/21			
154		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	2 días	lun 16/08/21	mar 17/08/21			
155		TABLERO DE DISTRIBUCION EMPOTRADO	2 días	lun 16/08/21	mar 17/08/21			
156		SISTEMA DE TIERRA	2 días	lun 16/08/21	mar 17/08/21			
157		POZO A TIERRA	2 días	lun 16/08/21	mar 17/08/21			
158		ARTEFACTOS DE ALUMBRADO	3 días	mié 15/09/21	vie 17/09/21			
159		ARTEFACTO TIPO PHILIPS FOCO LED BULBO A60 7.5W IIIZ RI ANCA	3 días	mié 15/09/21	vie 17/09/21			
160		EQUIPO DOWNLIGHT REDONDO 24w	2 días	mié 15/09/21	jue 16/09/21			
161		LUZ DE EMERGENCIA	1 día	mié 15/09/21	mié 15/09/21			
162		SISTEMA CONTRA INCENDIO	1 día	mié 15/09/21	mié 15/09/21			
163		CENTRAL DE ALARMA CONGRA INCENDIO	1 día	mié 15/09/21	mié 15/09/21			
164		DETECTORES DE HUMO	1 día	mié 15/09/21	mié 15/09/21			
165		ESTACION MANUAL CONTRA INCENDIO	1 día	mié 15/09/21	mié 15/09/21			
166		SIRENA DE ALARMA CONTRA INCENDIO	1 día	mié 15/09/21	mié 15/09/21			

Proyecto: MODULO 2 (bloque 3) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
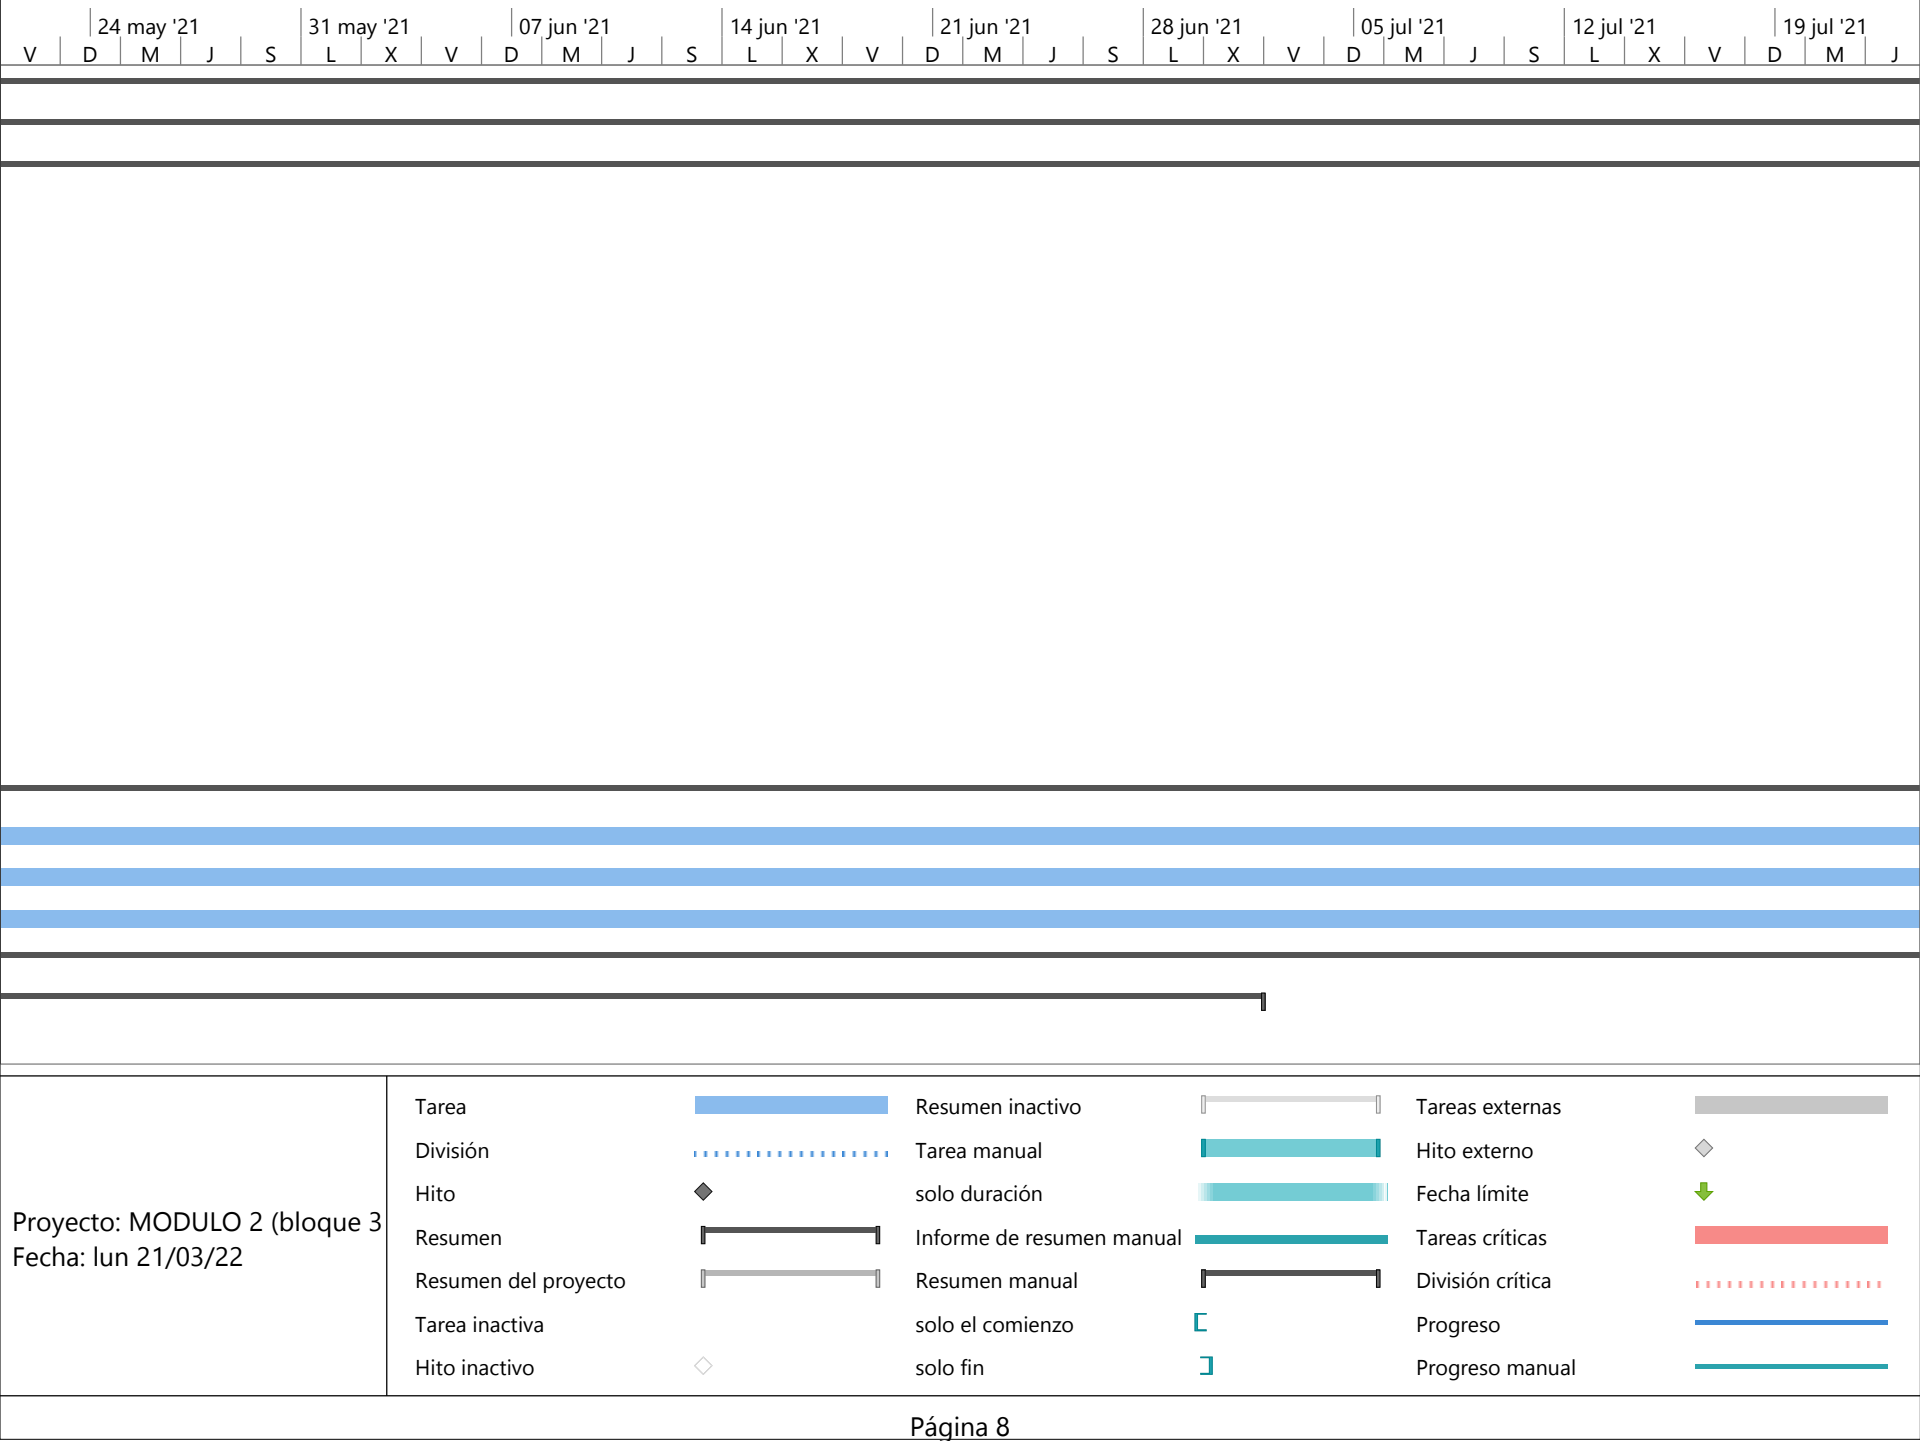
<

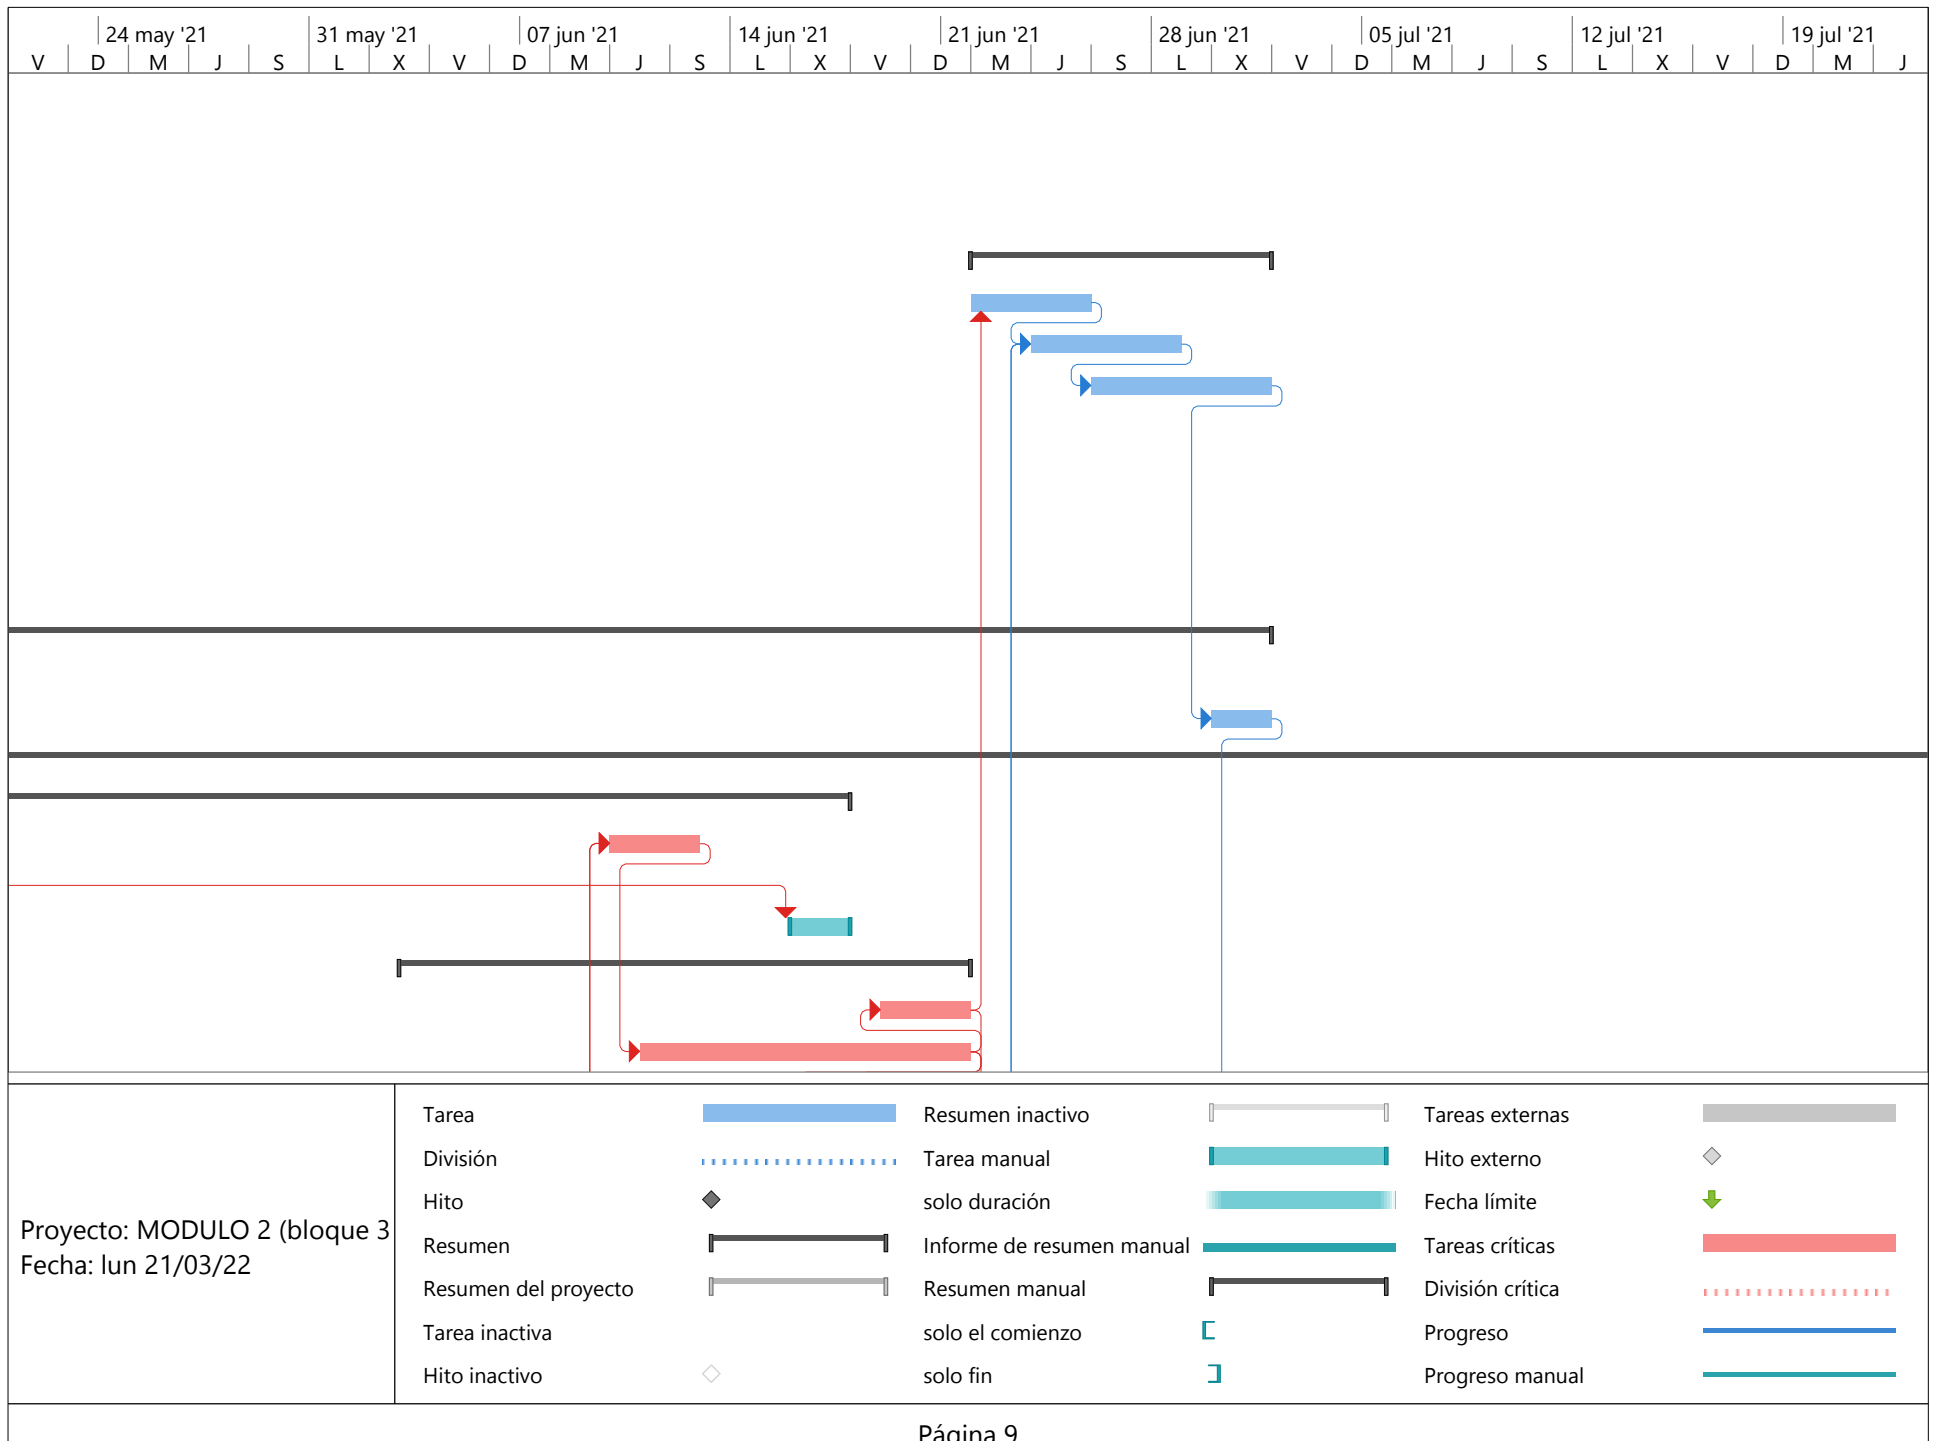

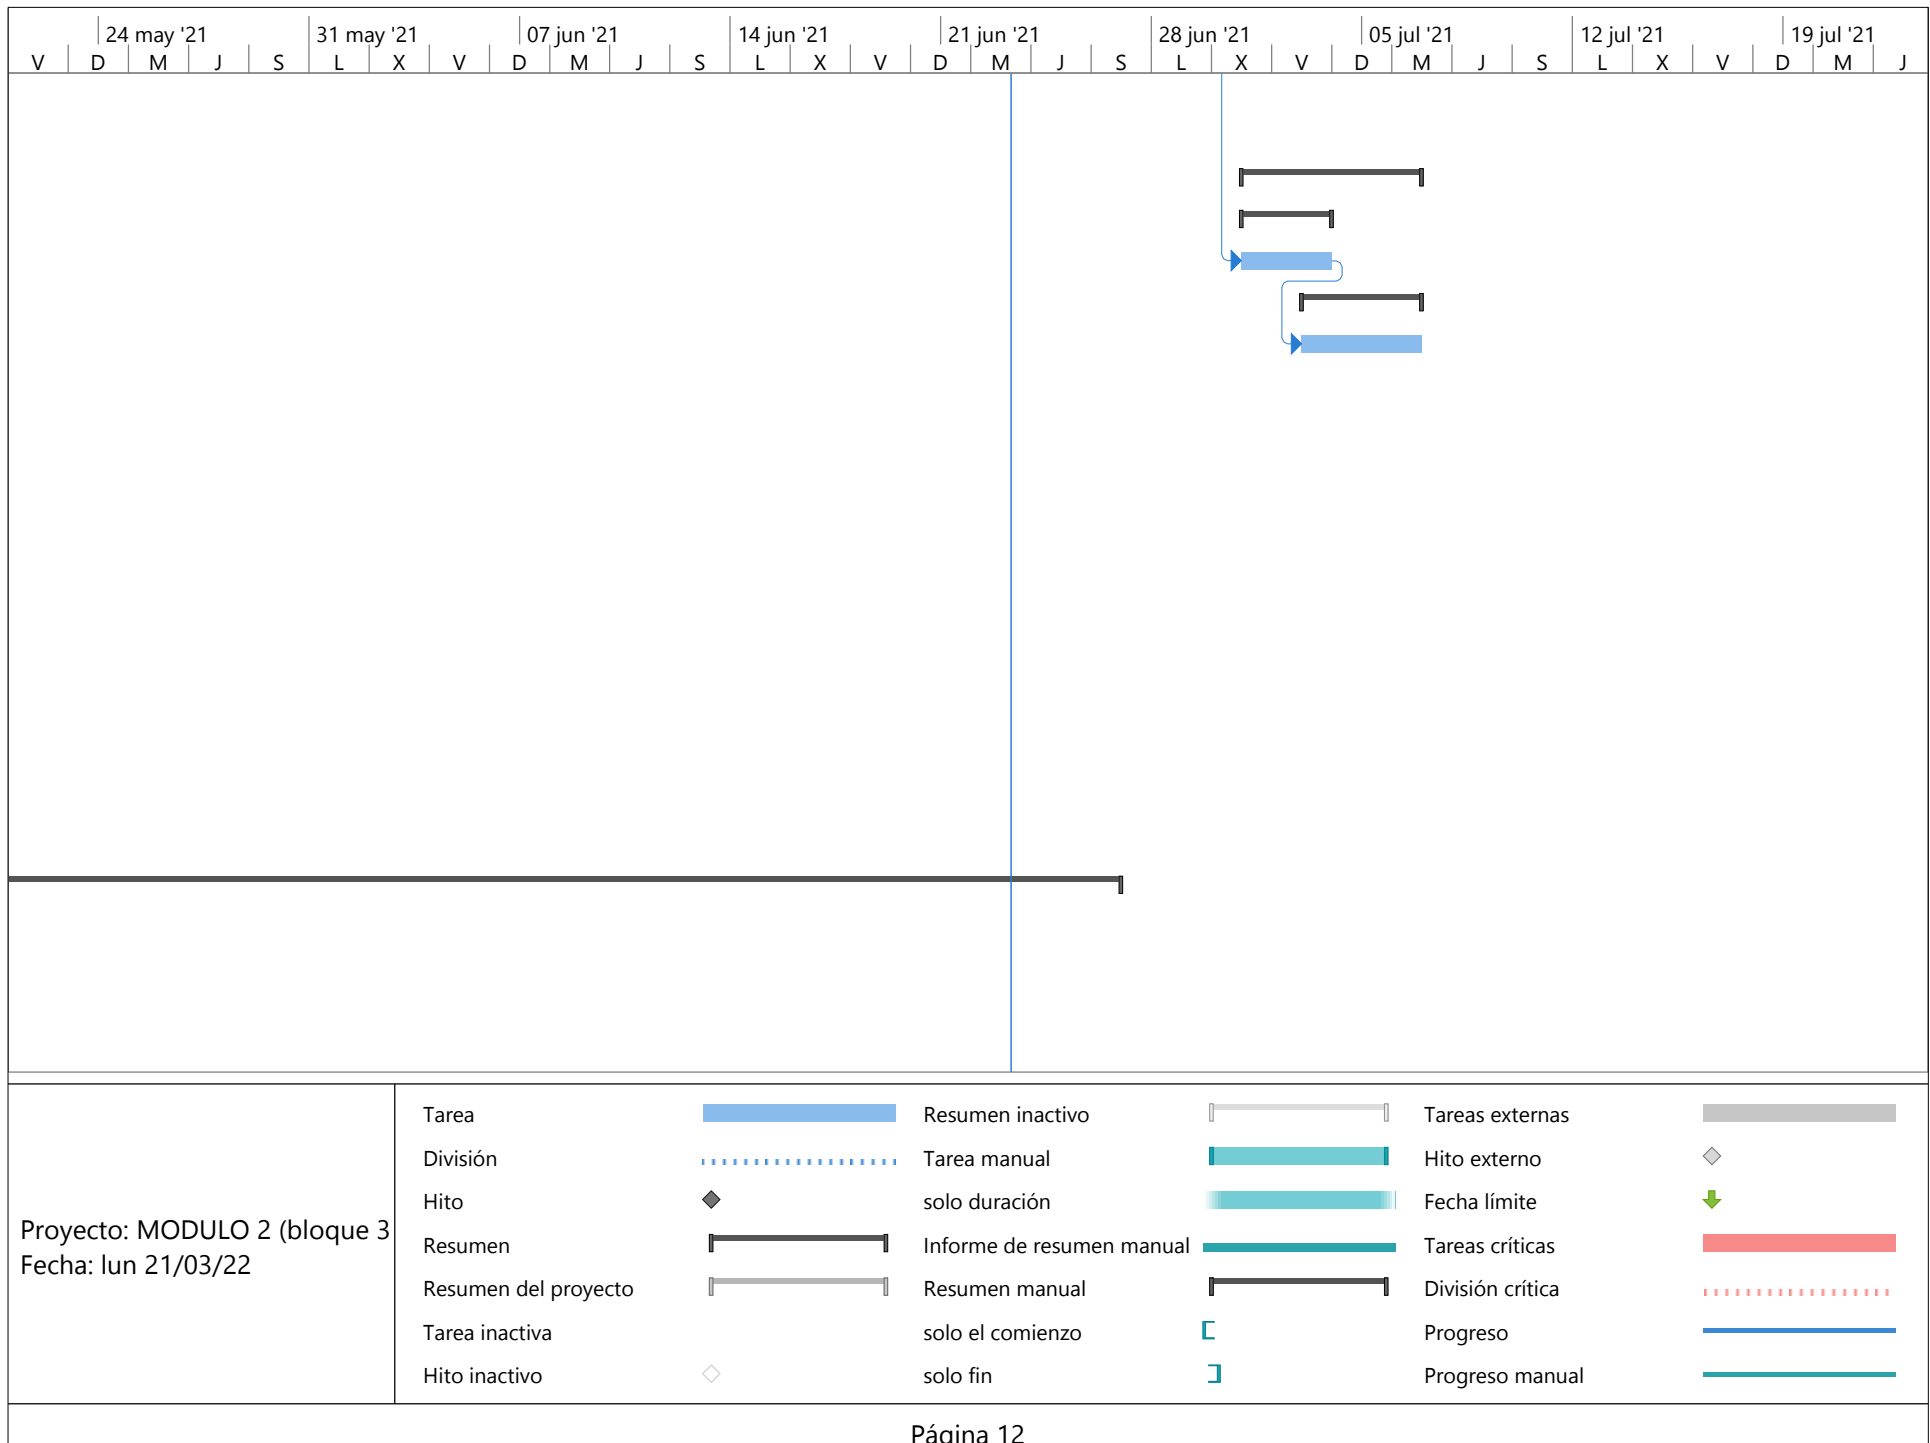


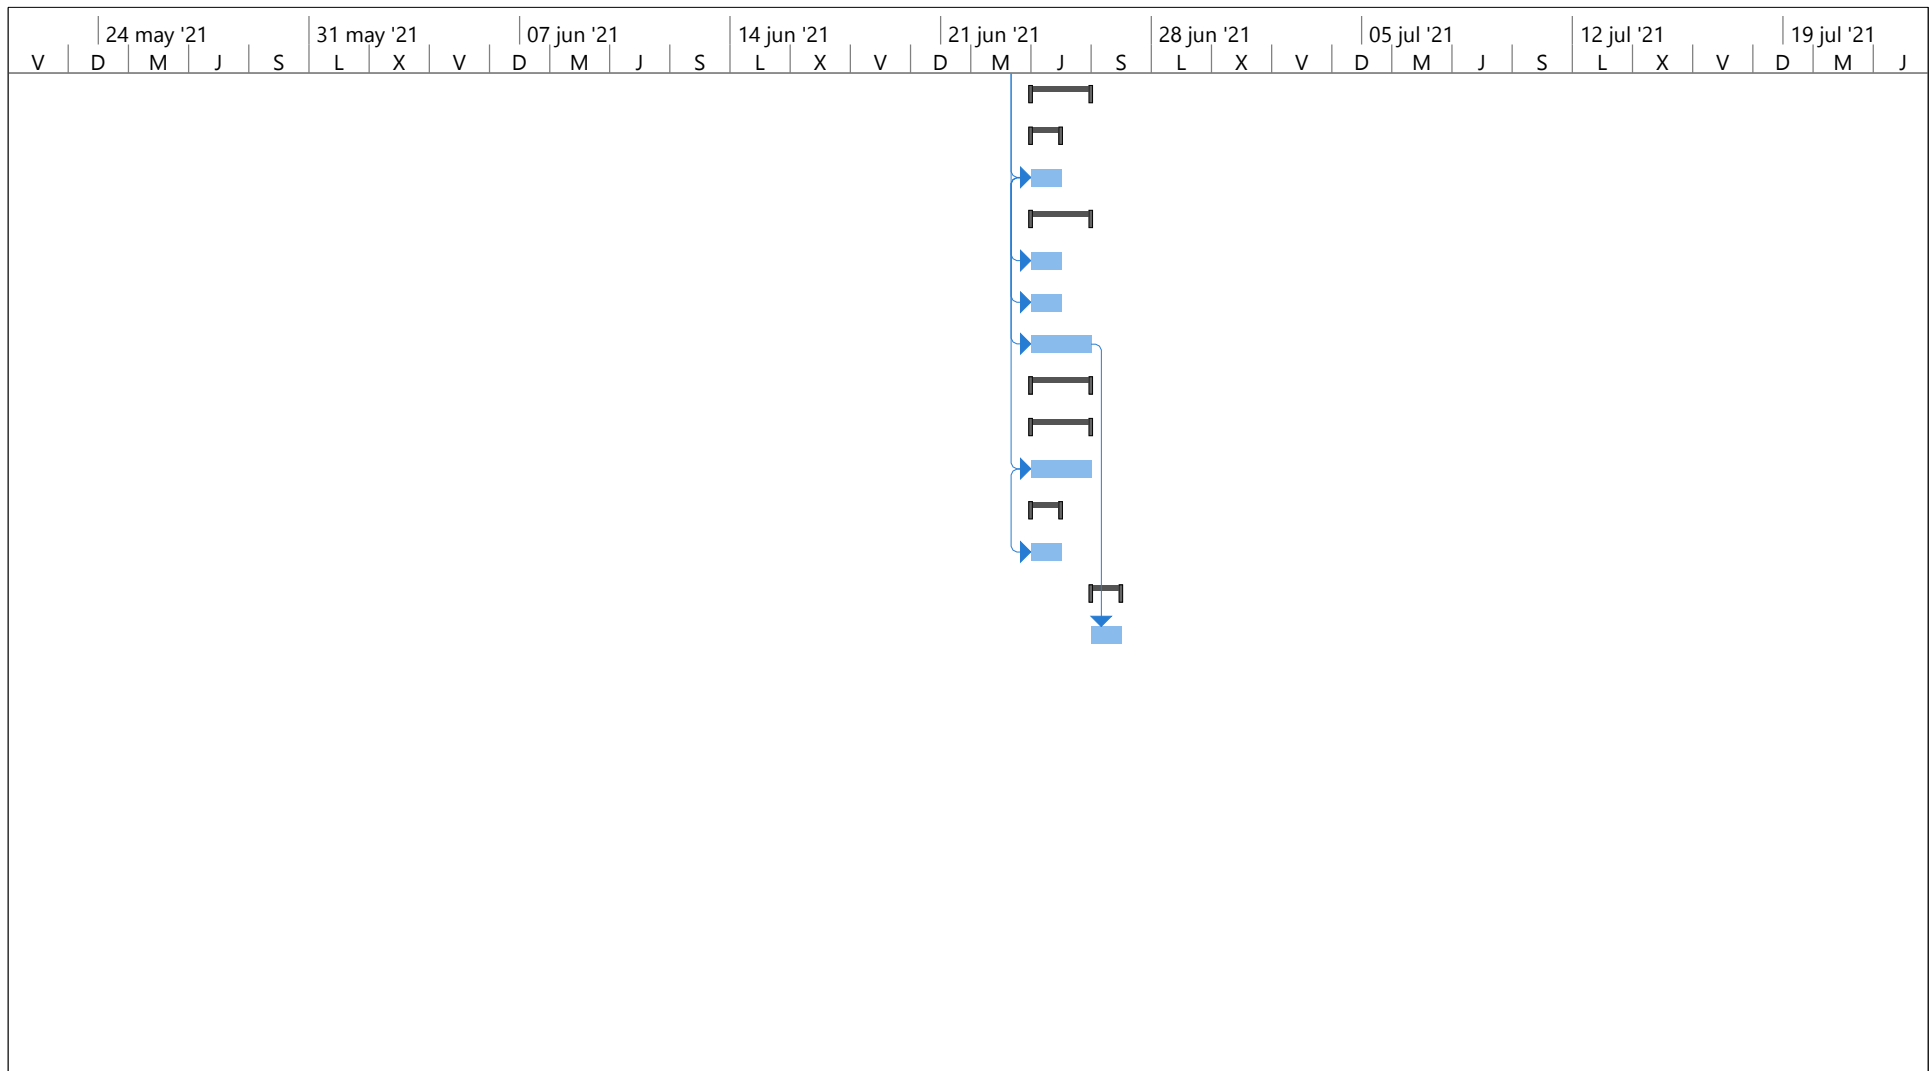


Proyecto: MODULO 2 (bloque 3) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J													
	24 may '21					31 may '21					07 jun '21					14 jun '21					21 jun '21					28 jun '21					05 jul '21					12 jul '21					19 jul '21				
Proyecto: MODULO 2 (bloque 3) Fecha: lun 21/03/22	Tarea							Resumen inactivo							Tareas externas																														
	División							Tarea manual							Hito externo																														
	Hito							solo duración							Fecha límite																														
	Resumen							Informe de resumen manual							Tareas críticas																														
	Resumen del proyecto							Resumen manual							División crítica																														
	Tarea inactiva							solo el comienzo							Progreso																														
	Hito inactivo							solo fin							Progreso manual																														


Página 14

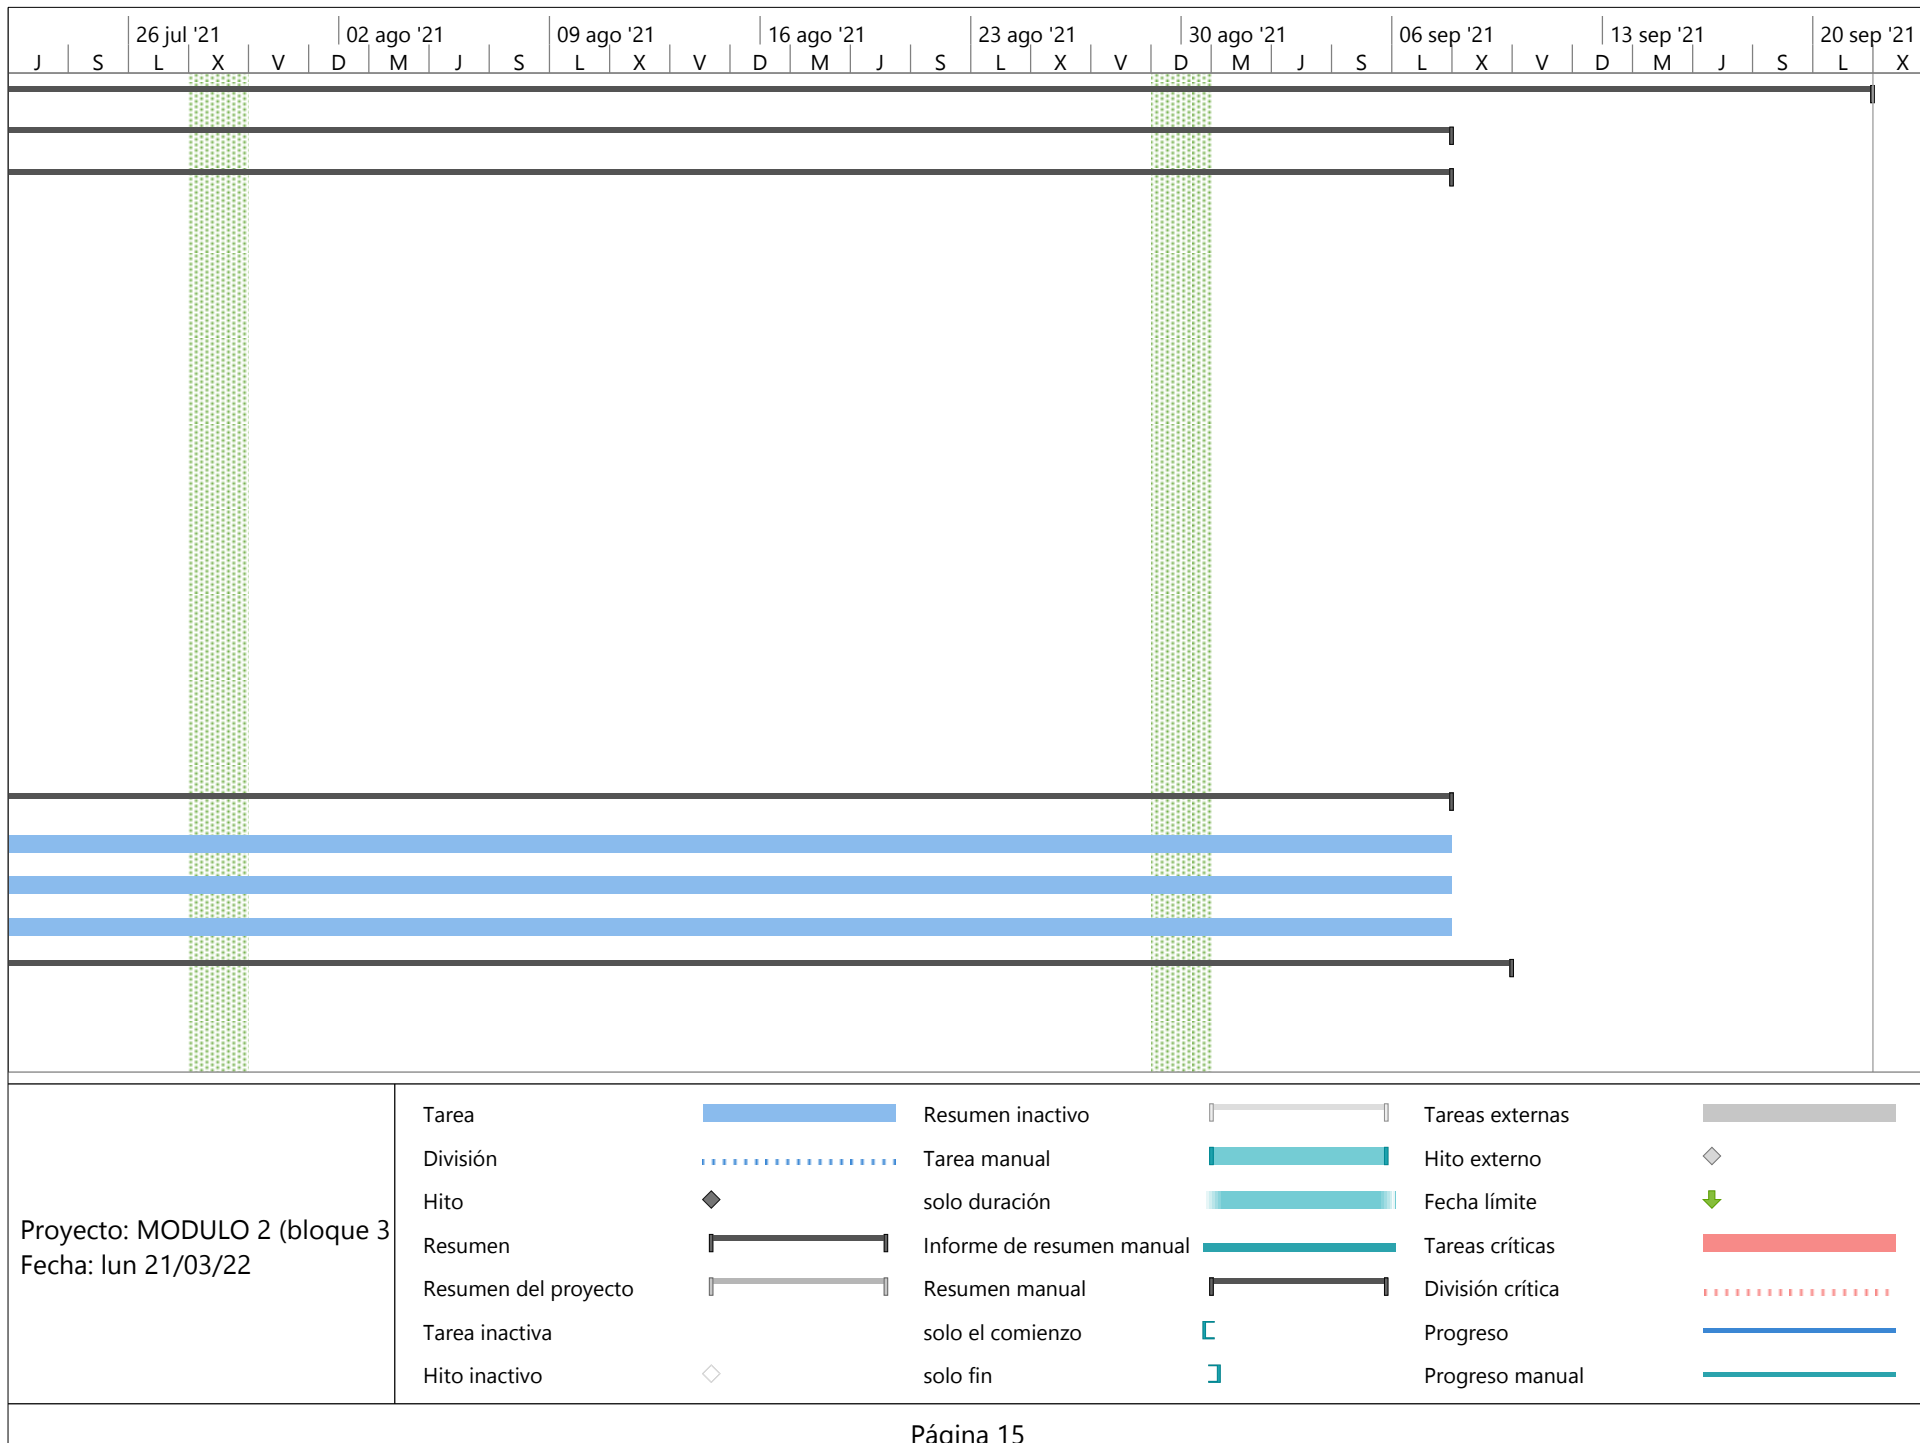

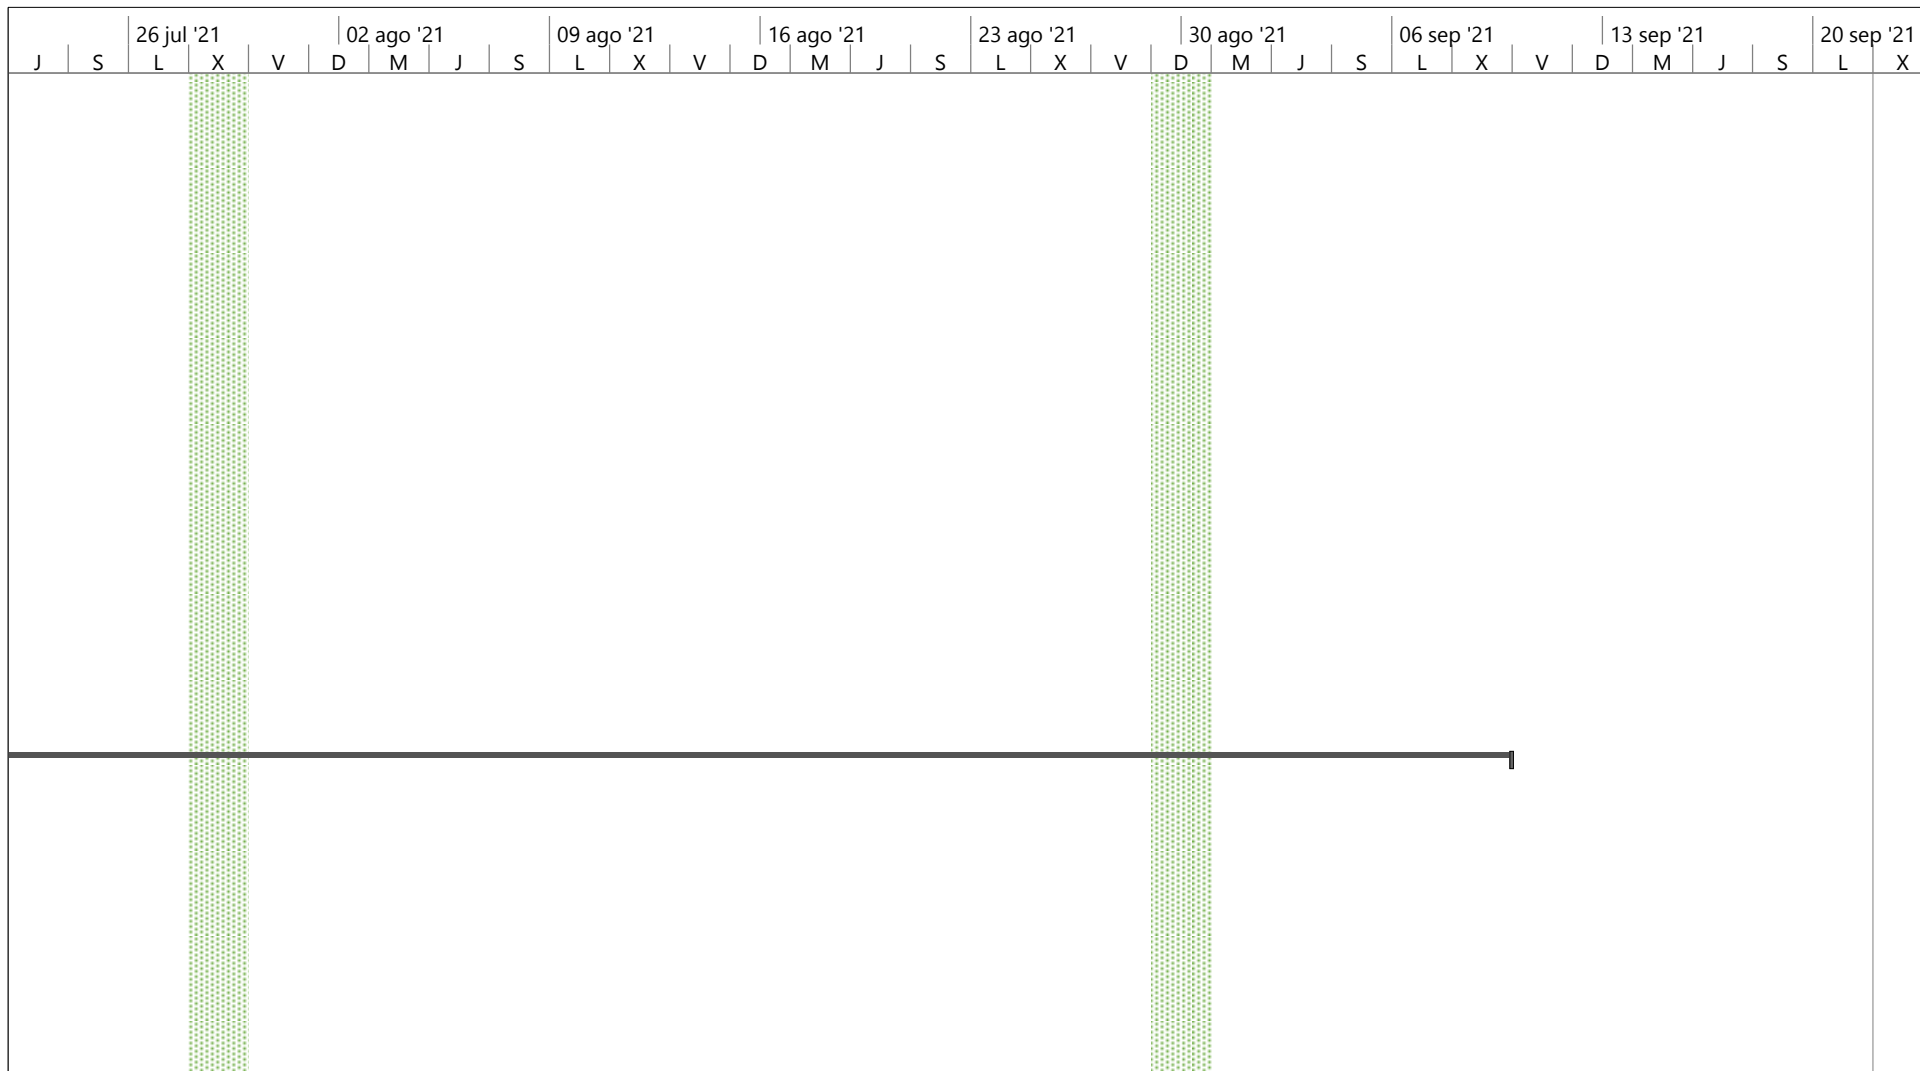


Proyecto: MODULO 2 (bloque 3) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

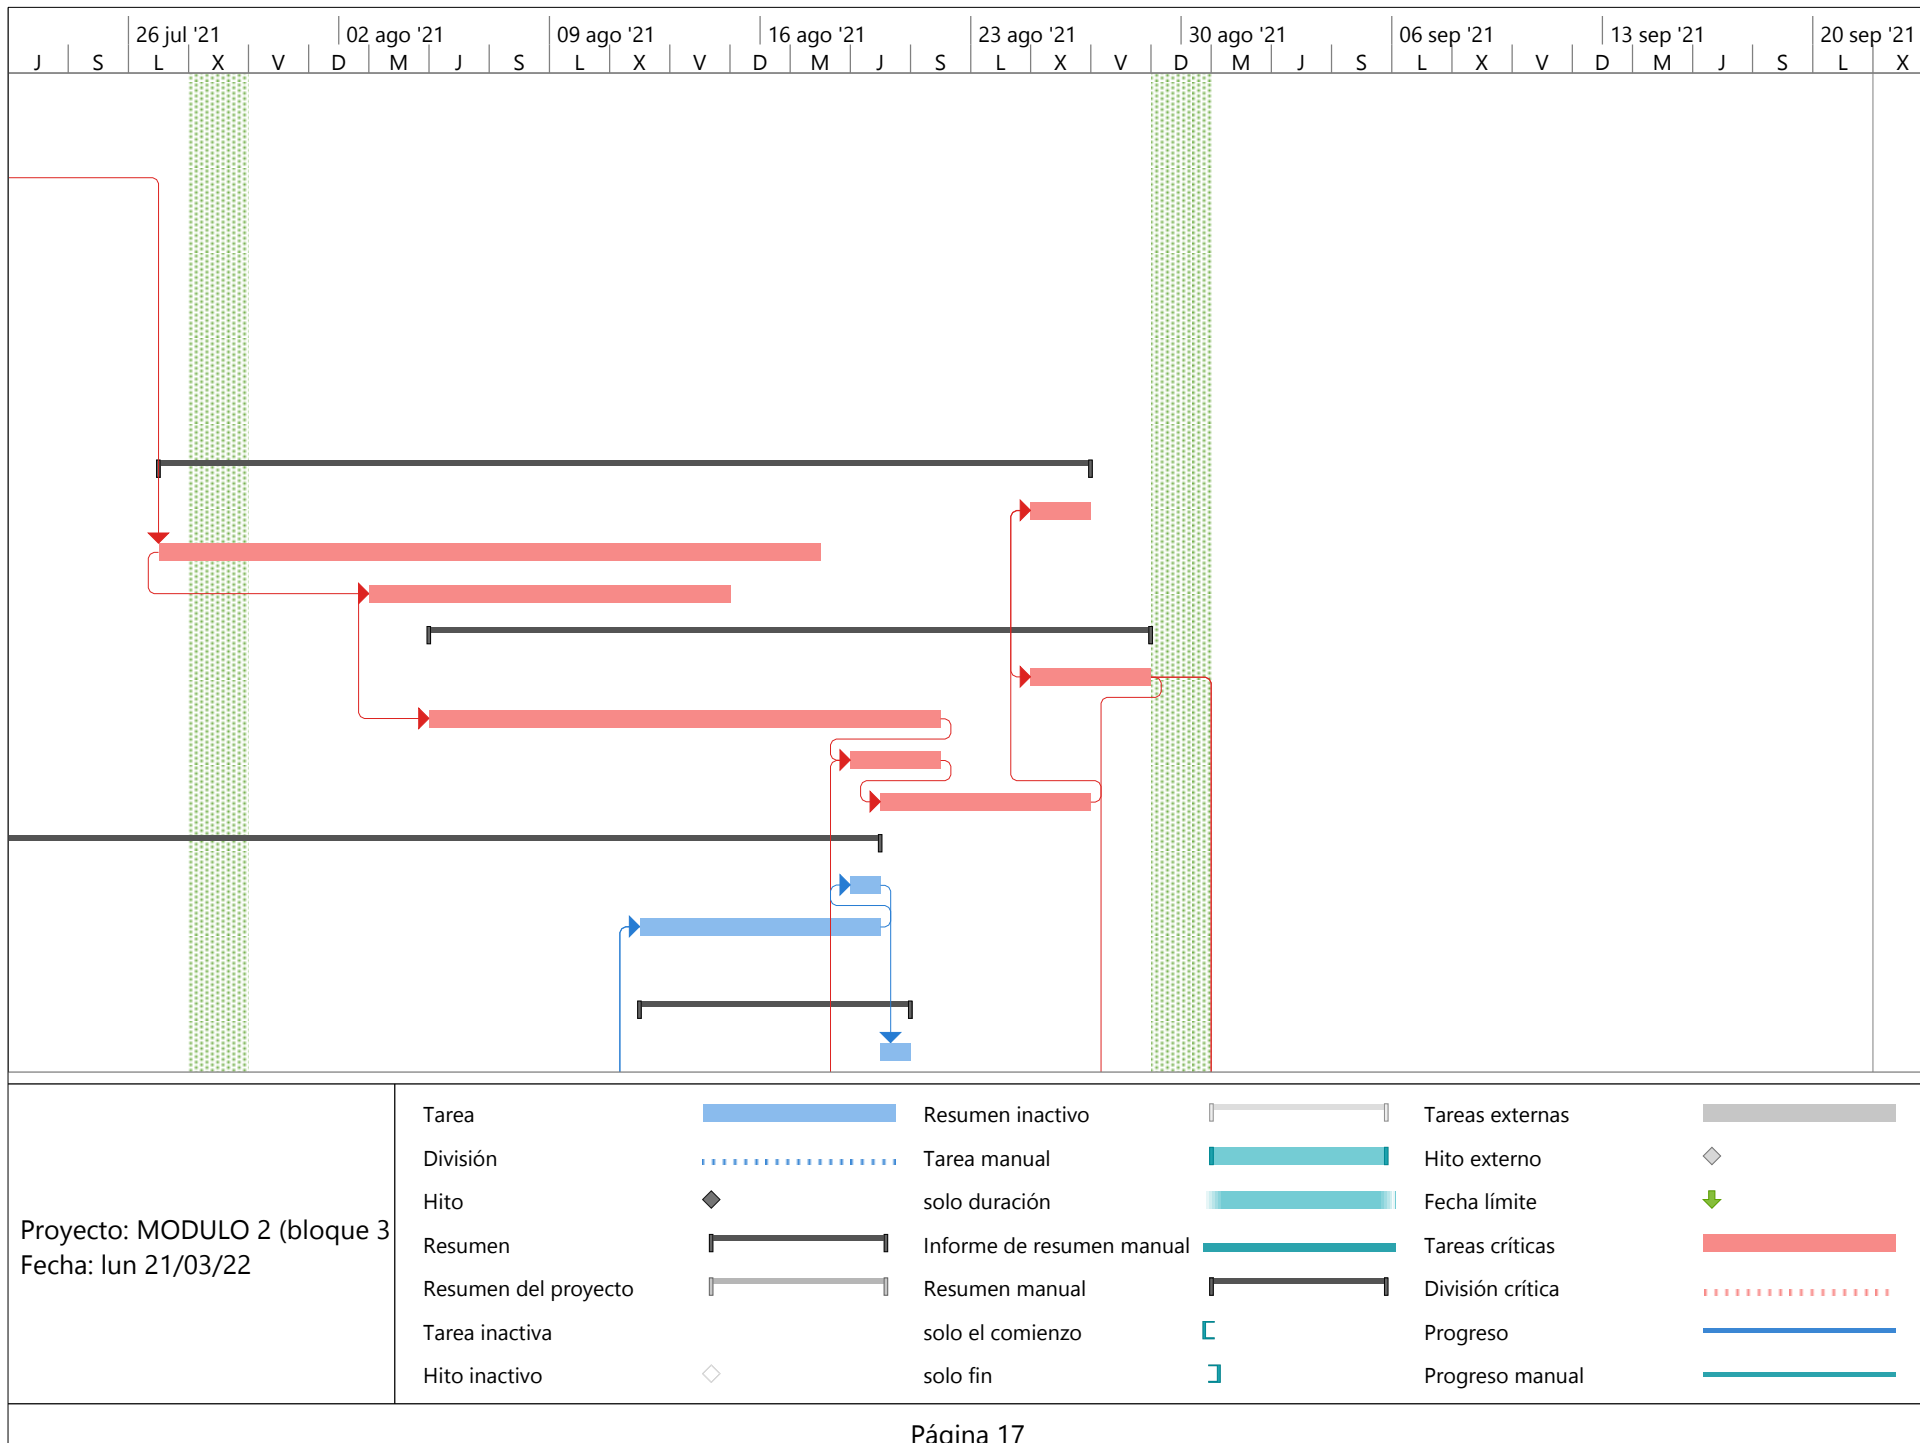


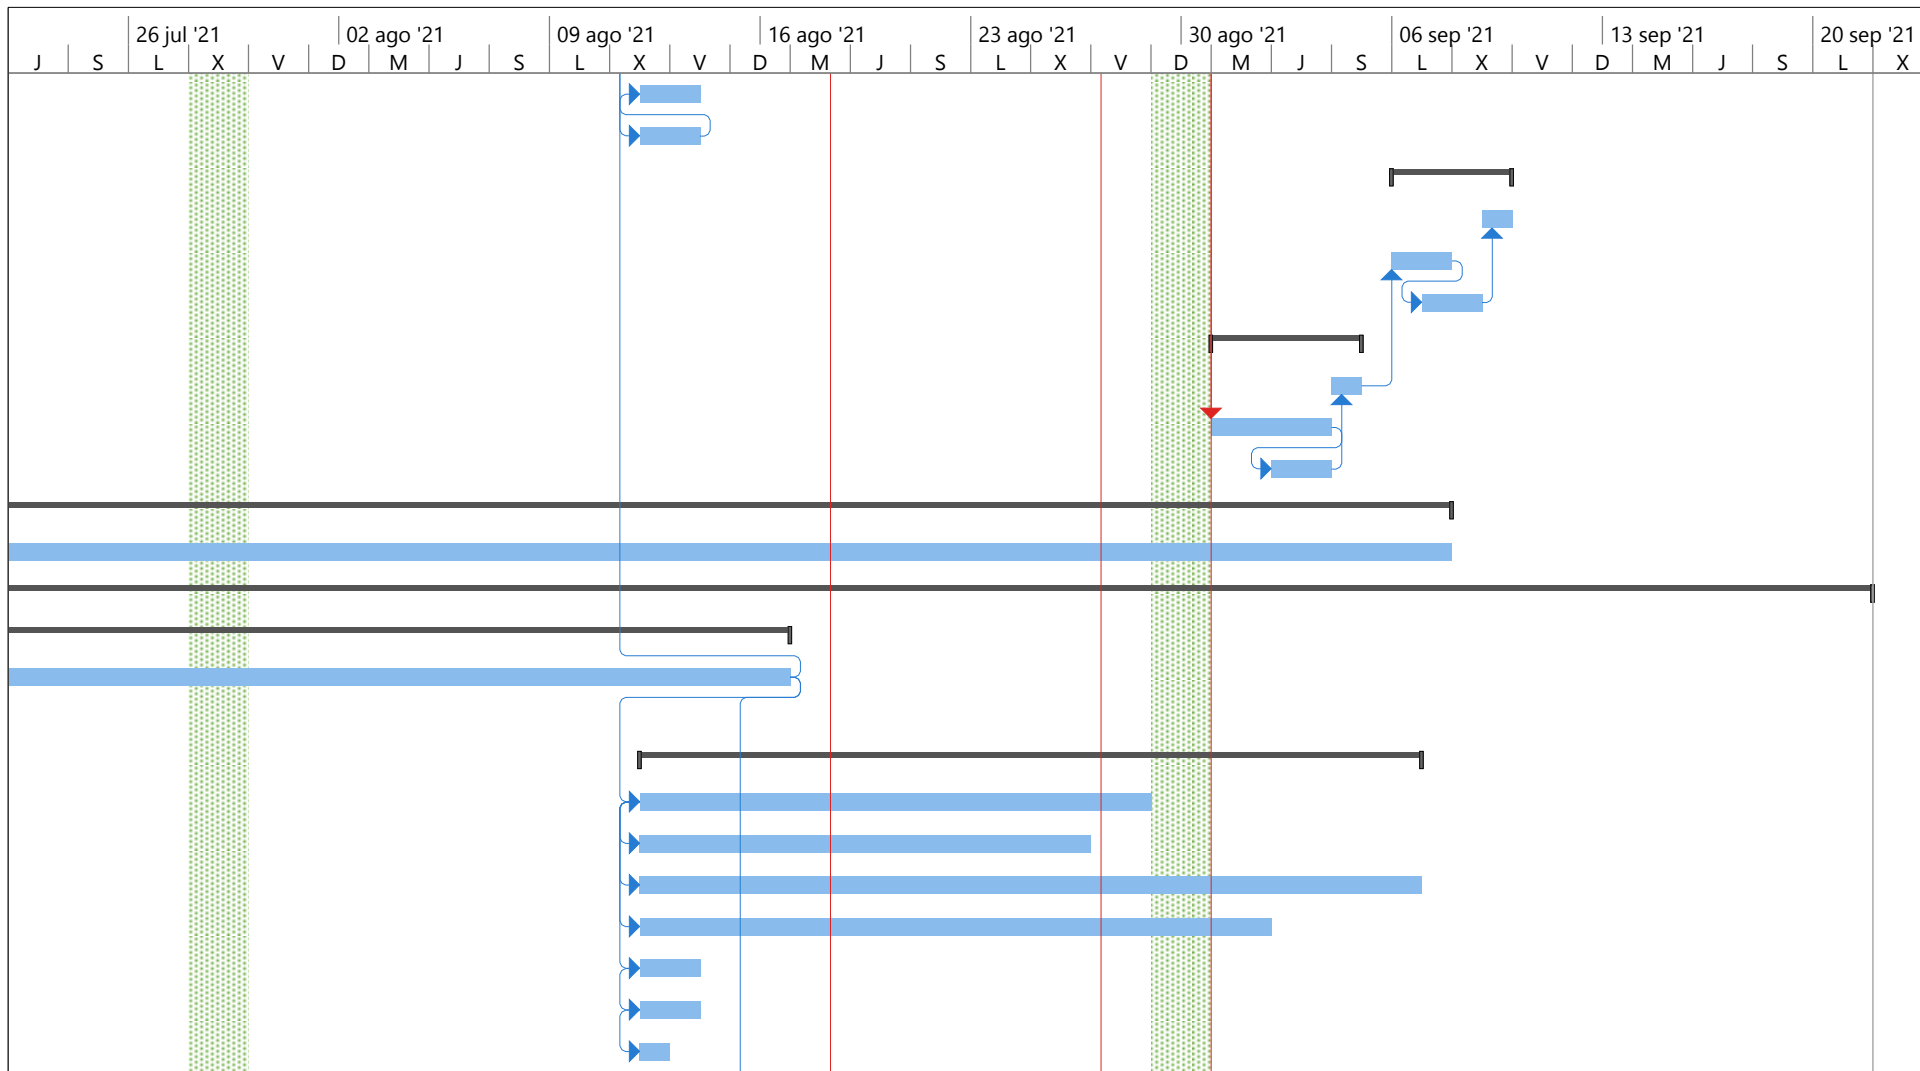


Proyecto: MODULO 2 (bloque 3) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

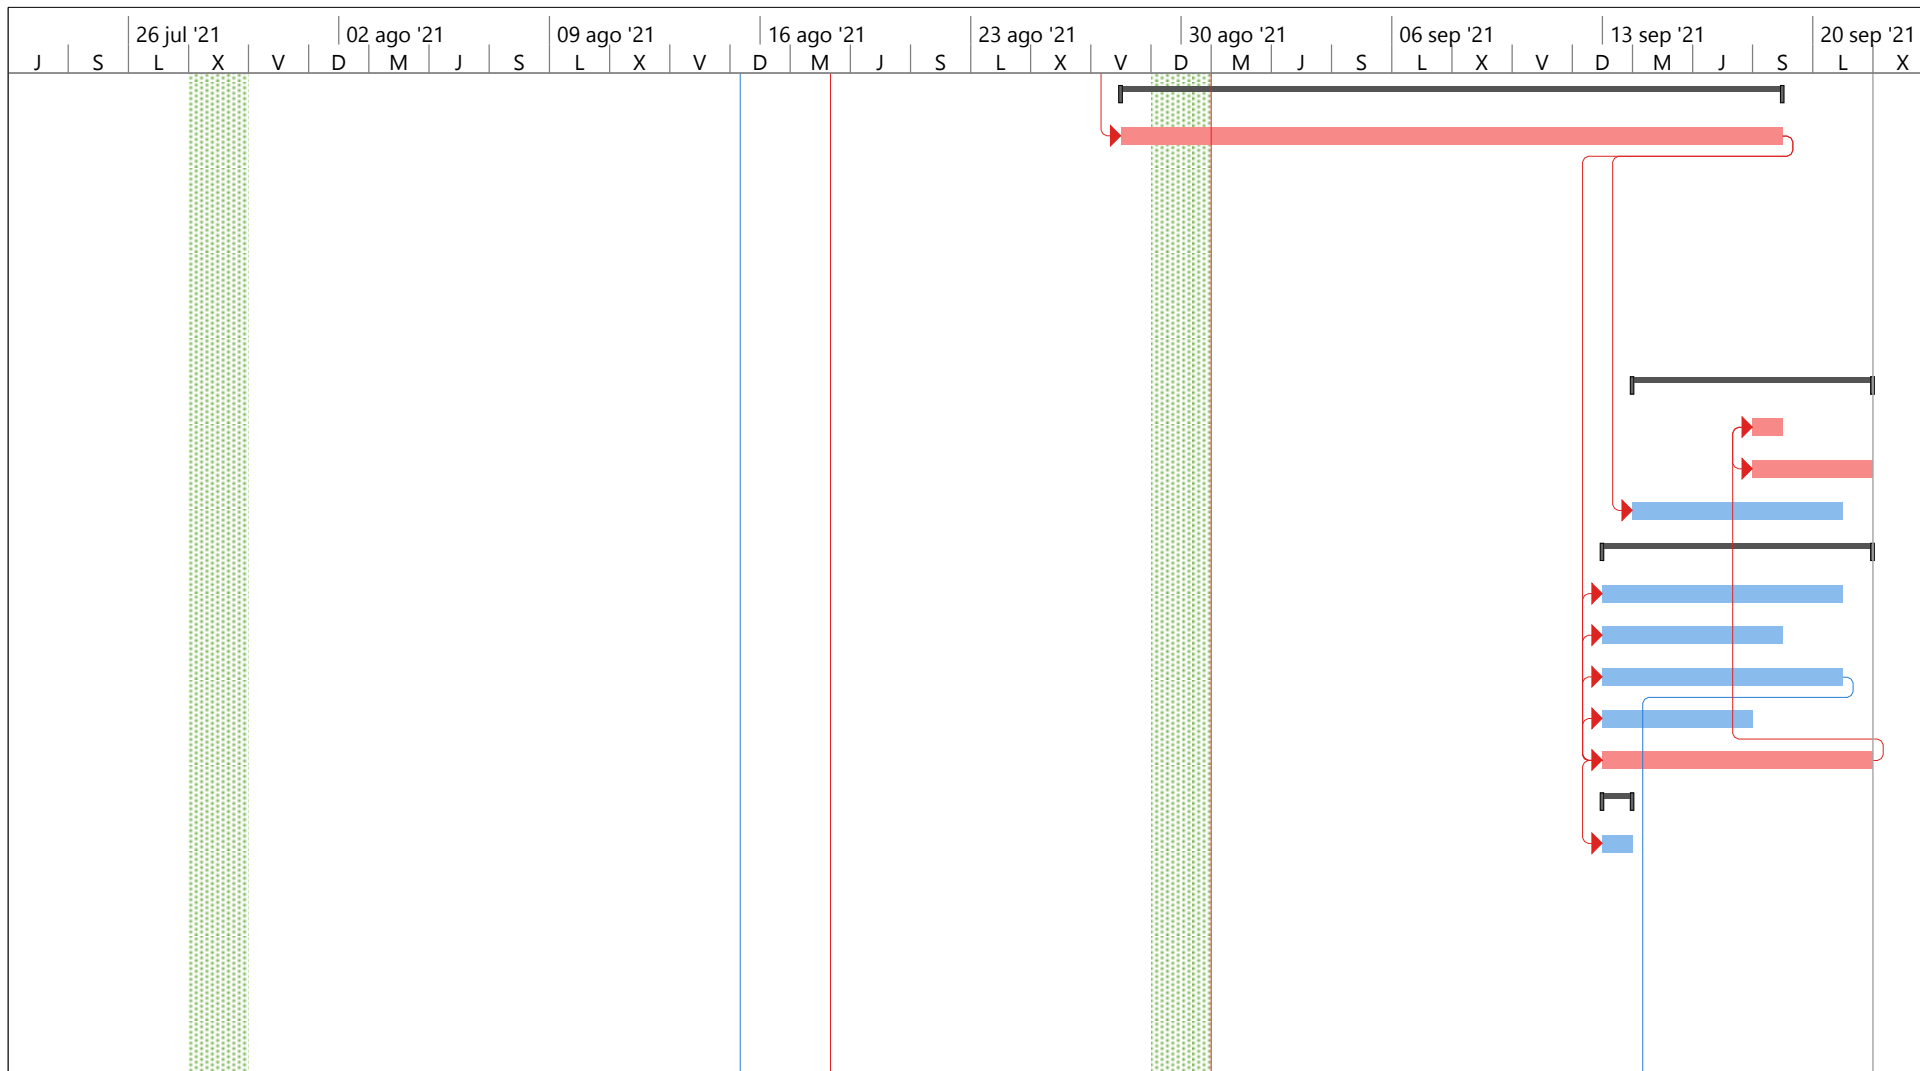


Proyecto: MODULO 2 (bloque 3) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

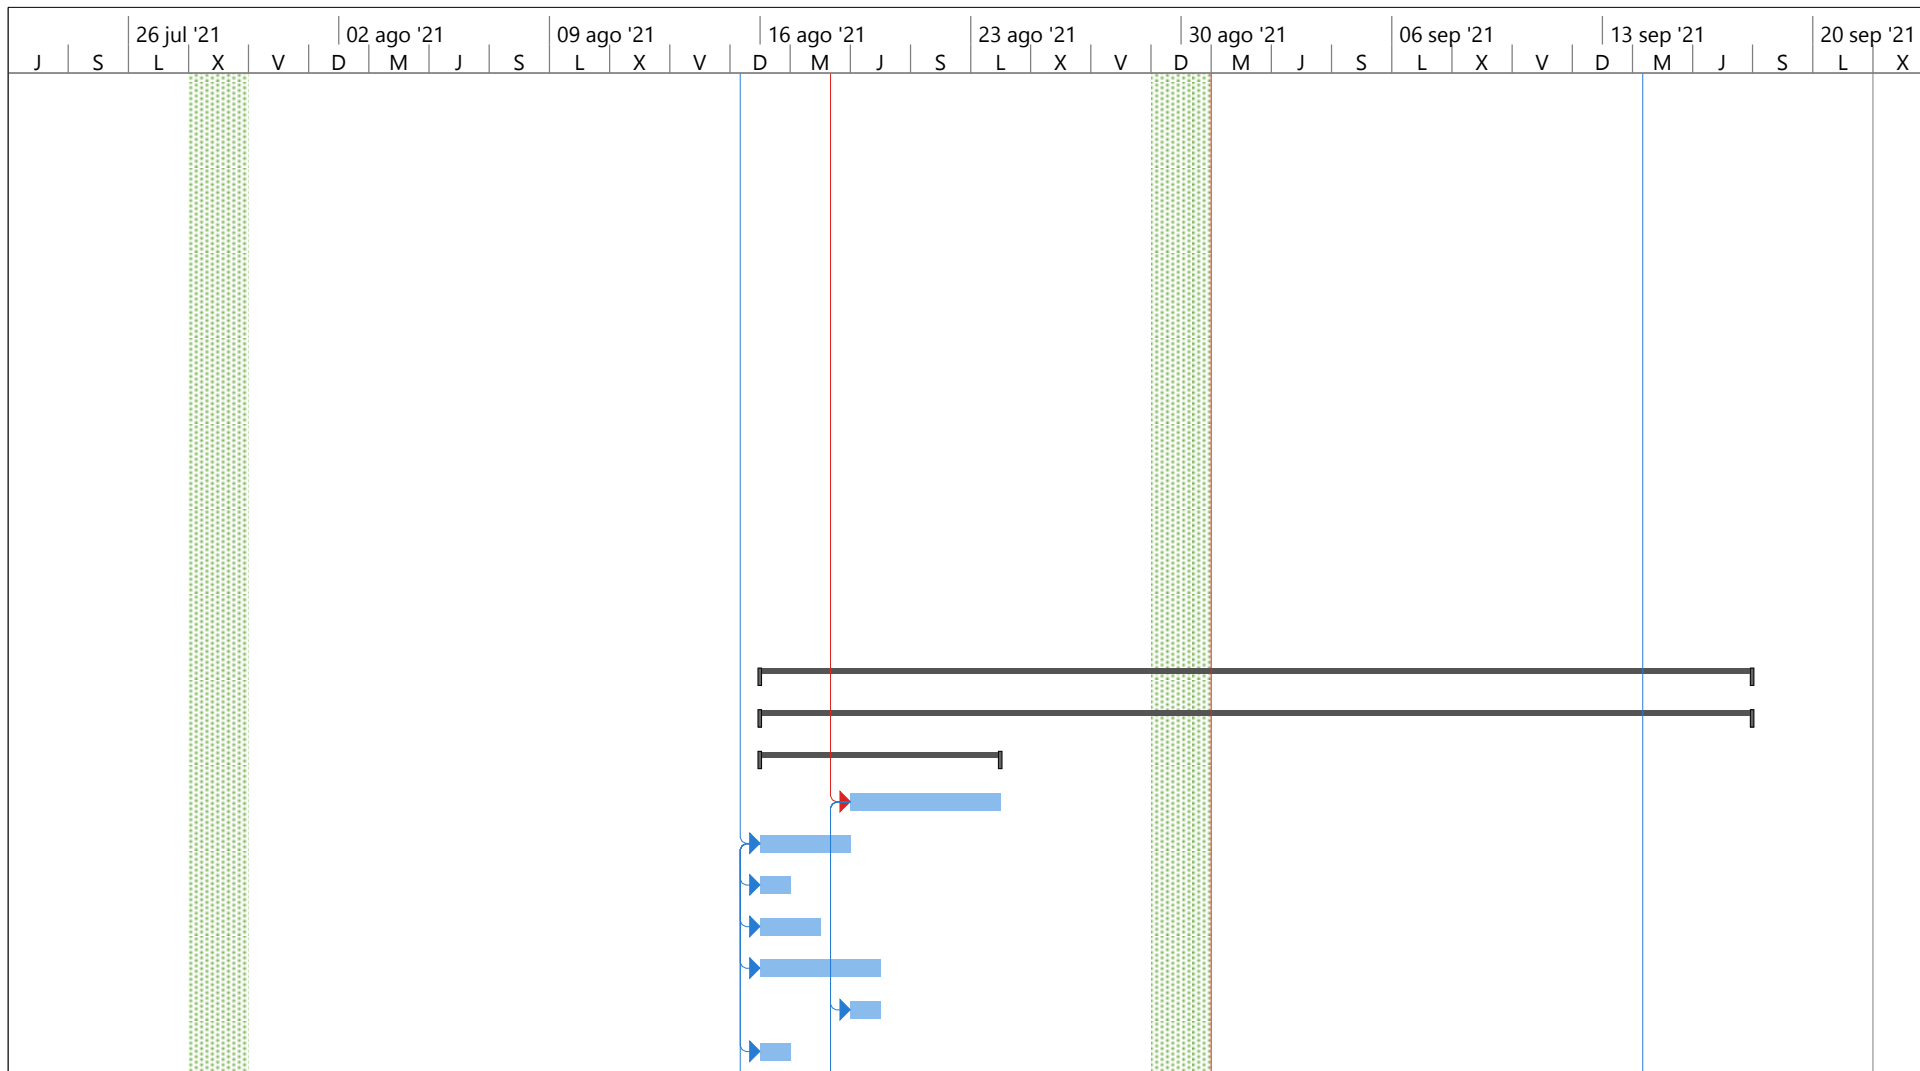



Proyecto: MODULO 2 (bloque 3) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





<div> <div>Proyecto: MODULO 2 (bloque 3)</div> <div>Fecha: lun 21/03/22</div> </div>	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	











		27 sep '21					04 oct '21					11 oct '21					18 oct '21					25 oct '21					01 nov '21					08 nov '21					15 nov '21					22 nov '21				
		X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M													
Proyecto: MODULO 2 (bloque 3) Fecha: lun 21/03/22		Tarea																																												
		División																																												
		Hito																																												
		Resumen																																												
		Resumen del proyecto																																												
		Tarea inactiva																																												
		Hito inactivo																																												
		<div> <div>Resumen inactivo</div> <div></div> </div> <div> <div>Tarea manual</div> <div></div> </div> <div> <div>solo duración</div> <div></div> </div> <div> <div>Informe de resumen manual</div> <div></div> </div> <div> <div>Resumen manual</div> <div></div> </div> <div> <div>solo el comienzo</div> <div></div> </div> <div> <div>solo fin</div> <div></div> </div> <div> <div>Tareas externas</div> <div></div> </div> <div> <div>Hito externo</div> <div></div> </div> <div> <div>Fecha límite</div> <div></div> </div> <div> <div>Tareas críticas</div> <div></div> </div> <div> <div>División crítica</div> <div></div> </div> <div> <div>Progreso</div> <div></div> </div> <div> <div>Progreso manual</div> <div></div> </div>																																												

Página 28
