





























Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21			23 ago '21			30 ago '21			06 se	
						J	S		L	X	V	D	M	J		S
1		MODULO 4 (B7)	67 días?	lun 23/08/21	jue 11/11/21											
2		OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	60 días?	lun 23/08/21	mié 03/11/21											
3		OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PRELIMINARES	60 días?	lun 23/08/21	mié 03/11/21											
4		CONSTRUCCIONES PROVINCIONALES	1 día?	mar 24/08/21	mar 24/08/21											
5		OFICINA DE OBRA	1 día?	mar 24/08/21	mar 24/08/21											
6		CASETA DE GUARDIANIA	1 día?	mar 24/08/21	mar 24/08/21											
7		TRABAJOS PRELIMINARES	2 días?	lun 23/08/21	mar 24/08/21											
8		LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	1 día?	lun 23/08/21	lun 23/08/21											
9		TRAZO Y REPLANTEO	1 día?	mar 24/08/21	mar 24/08/21											
10		SALUD Y SEGURIDAD	60 días	lun 23/08/21	mié 03/11/21											
11		IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD	60 días	lun 23/08/21	mié 03/11/21											
12		EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	60 días	lun 23/08/21	mié 03/11/21											
13		SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	60 días	lun 23/08/21	mié 03/11/21											
14		ESTRUCTURAS	60 días	lun 23/08/21	mié 03/11/21											
15		MOVIMIENTO DE TIERRAS	29 días	mié 25/08/21	mar 28/09/21											
16		EXCAVACIONES	13 días	mié 25/08/21	jue 09/09/21											
17		EXCAVACION MANUAL	12 días	mié 25/08/21	mié 08/09/21											
18		CORTE DE TERRENO NATURAL DE 15 cm	4 días	lun 06/09/21	jue 09/09/21											
19		REFINE DEL TERRENO EXCAVACION	1 día	mié 08/09/21	mié 08/09/21											
20		RELLENOS	10 días	vie 17/09/21	mar 28/09/21											
21		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	4 días	vie 17/09/21	mar 21/09/21											
22		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO-ARENA	4 días	lun 20/09/21	jue 23/09/21											
23		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO-AFIRMADO	6 días	mié 22/09/21	mar 28/09/21											
24		NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO	3 días	mar 07/09/21	jue 09/09/21											

Proyecto: MODULO 4 (bloque 7) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21 J	S	23 ago '21 L	X	V	30 ago '21 D	M	J	S	06 se L
25	NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO	3 días	mar 07/09/21	jue 09/09/21										
26	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	7 días	mar 07/09/21	mar 14/09/21										
27	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	7 días	mar 07/09/21	mar 14/09/21										
28	ELIMINACIÓN DE MATERIAL C/MAQUINA	2 días	lun 13/09/21	mar 14/09/21										
29	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	19 días	mié 08/09/21	mié 29/09/21										
30	CONCRETO PARA SOLADOS e=10 cm C:H 1:10	1 día	mié 08/09/21	mié 08/09/21										
31	CIMENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G.	2 días	mié 15/09/21	jue 16/09/21										
32	CONCRETO PARA FALSOPISO C:H 1:8 e=10 cm	3 días	lun 27/09/21	mié 29/09/21										
33	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	50 días	sáb 04/09/21	mié 03/11/21										
34	ZAPATAS	8 días	mar 07/09/21	mié 15/09/21										
35	CONCRETO EN ZAPATAS f'c=280 kg/cm2	4 días	sáb 11/09/21	mié 15/09/21										
36	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS	2 días	mar 07/09/21	mié 08/09/21										
37	VIGAS DE CONEXIÓN	5 días	vie 10/09/21	mié 15/09/21										
38	CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION	1 día	mié 15/09/21	mié 15/09/21										
39	ENCOFRADO PARA VIGAS DE CONEXIÓN	2 días	mar 14/09/21	mié 15/09/21										
40	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CONEXIÓN	3 días	vie 10/09/21	lun 13/09/21										
41	SOBRECIMENTOS REFORZADOS	16 días	mar 14/09/21	vie 01/10/21										
42	CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO f'c=175 kg/cm2	1 día	vie 01/10/21	vie 01/10/21										
43	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	5 días	sáb 25/09/21	jue 30/09/21										
44	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en SOBRECIMENTOS	3 días	mar 14/09/21	jue 16/09/21										
45	COLUMNAS	20 días	sáb 04/09/21	lun 27/09/21										
46	CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	2 días	sáb 25/09/21	lun 27/09/21										
47	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	10 días	jue 16/09/21	lun 27/09/21										
48	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS	8 días	sáb 04/09/21	lun 13/09/21										


Proyecto: MODULO 4 (bloque 7)
Fecha: lun 21/03/22





















Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21 J	S	23 ago '21 L	X	V	30 ago '21 D	M	J	S	06 sep L
49		VIGAS	14 días	sáb 09/10/21	lun 25/10/21										
50		CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	2 días	sáb 23/10/21	lun 25/10/21										
51		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	3 días	sáb 09/10/21	mar 12/10/21										
52		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS	2 días	lun 11/10/21	mar 12/10/21										
53		COLUMNETAS	40 días	sáb 11/09/21	jue 28/10/21										
54		CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2	2 días	mié 27/10/21	jue 28/10/21										
55		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS	8 días	mar 19/10/21	mié 27/10/21										
56		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNETAS.	8 días	sáb 11/09/21	lun 20/09/21										
57		VIGA DE CONFINAMIENTO	5 días	jue 28/10/21	mié 03/11/21										
58		CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO f'c=175 kg/cm2	1 día	mié 03/11/21	mié 03/11/21										
59		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	4 días	vie 29/10/21	mié 03/11/21										
60		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CONFINAMIENTO	2 días	jue 28/10/21	vie 29/10/21										
61		LOSAS MACIZAS	11 días	mié 13/10/21	lun 25/10/21										
62		CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2	2 días	sáb 23/10/21	lun 25/10/21										
63		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS	6 días	mié 13/10/21	mar 19/10/21										
64		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS MACIZAS	4 días	mar 19/10/21	vie 22/10/21										
65		VARIOS	60 días	lun 23/08/21	mié 03/11/21										
66		MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL	60 días	lun 23/08/21	mié 03/11/21										
67		ARQUITECTURA	36 días?	mié 29/09/21	jue 11/11/21										
68		ARCOS METALICOS	13 días	mié 29/09/21	jue 14/10/21										
69		ARCO N°1	6 días	mié 29/09/21	mar 05/10/21										
70		ARMADO DE ARCO N°1	6 días	mié 29/09/21	mar 05/10/21										
71		MONTAJE E IZAJE DE ARCO N°1	3 días	sáb 02/10/21	mar 05/10/21										
72		VIGAS METÁLICAS	10 días	mié 29/09/21	lun 11/10/21										





















Proyecto: MODULO 4 (bloque 7)
Fecha: lun 21/03/22


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21		23 ago '21			30 ago '21				06 se
						J	S	L	X	V	D	M	J	S	
73		ARMADO DE VIGA N°1	3 días	mié 29/09/21	vie 01/10/21										
74		MONTAJE E IZAJE DE VIGA N°1	5 días	mar 05/10/21	lun 11/10/21										
75		ARRIOSTRES	10 días	mié 29/09/21	lun 11/10/21										
76		ARMADO DE ARRIOSTRE SUPERIOR ACERO LISO 7/8"	1 día	mié 29/09/21	mié 29/09/21										
77		ARMADO DE COLGANTES ACERO LISO 1/2"	2 días	mié 29/09/21	jue 30/09/21										
78		MONTAJE E IZAJE DE ARRIOSTRE SUPERIOR ACERO LISO 7/8"	1 día	lun 11/10/21	lun 11/10/21										
79		CONEXIONES	3 días	mié 29/09/21	vie 01/10/21										
80		CONEXIÓN - APOYO FIJO	1 día	mié 29/09/21	mié 29/09/21										
81		CONEXIÓN - APOYO MOVIL	1 día	mié 29/09/21	mié 29/09/21										
82		MONTAJE E IZAJE DE CONEXIÓN - APOYO FIJO	2 días	jue 30/09/21	vie 01/10/21										
83		MONTAJE E IZAJE DE CONEXIÓN - APOYO MOVIL	2 días	jue 30/09/21	vie 01/10/21										
84		COBERTURAS	3 días	mar 12/10/21	jue 14/10/21										
85		HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE COBERTURA GRAN ONDA 1.10 x 1.83 m	3 días	mar 12/10/21	jue 14/10/21										
86		ALBANILERIA	12 días	sáb 09/10/21	vie 22/10/21										
87		MURO DE LADRILLO DE ARCILLA 18 H (09x13x24) AMARRE SOGA MORTERO 1:5	12 días	sáb 09/10/21	vie 22/10/21										
88		REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	13 días	mar 19/10/21	mié 03/11/21										
89		TARRAJEO DE MUROS INTERIORES	13 días	mar 19/10/21	mié 03/11/21										
90		TARRAJEO COLUMNAS	11 días	mar 19/10/21	sáb 30/10/21										
91		TARRAJEO DE VIGAS	4 días	mar 19/10/21	vie 22/10/21										
92		CIELORRASOS	9 días	lun 25/10/21	jue 04/11/21										
93		TARRAJEO CIELO RASO	9 días	lun 25/10/21	jue 04/11/21										
94		PISOS Y PAVIMENTOS	5 días	mié 29/09/21	lun 04/10/21										
95		CONTRAPISOS	3 días	mié 29/09/21	vie 01/10/21										
96		CONTRAPISO DE 5 cm	3 días	mié 29/09/21	vie 01/10/21										

Proyecto: MODULO 4 (bloque 7) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





















Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21 J	S	23 ago '21 L	X	V	30 ago '21 D	M	J	S	06 se L
97		PISOS	3 días	vie 01/10/21	lun 04/10/21										
98		PISO DE CEMENTO PULIDO	3 días	vie 01/10/21	lun 04/10/21										
99		CARPINTERIA METALICA	9 días	mar 02/11/21	jue 11/11/21										
100		PUERTAS ENROLLABLES DE FIERRO	9 días	mar 02/11/21	jue 11/11/21										
101		PINTURAS	5 días	mar 02/11/21	sáb 06/11/21										
102		PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	4 días	mar 02/11/21	vie 05/11/21										
103		PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	4 días	mar 02/11/21	vie 05/11/21										
104		PINTURA LATEX A 2 MANOS COLUMNAS	5 días	mar 02/11/21	sáb 06/11/21										
105		PINTURA LATEX A 2 MANOS VIGAS	2 días	mar 02/11/21	mié 03/11/21										
106		PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS	4 días	mar 02/11/21	vie 05/11/21										
107		OTROS	1 día?	sáb 06/11/21	sáb 06/11/21										
108		KIT PUNTO ECOLOGICO 3 CUERPOS	1 día?	sáb 06/11/21	sáb 06/11/21										
109		INSTALACIONES SANITARIAS	34 días?	vie 24/09/21	jue 04/11/21										
110		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	3 días	mar 02/11/21	jue 04/11/21										
111		LAVADERO ACERO INOXIDABLE INC/GRIFERIA	3 días	mar 02/11/21	jue 04/11/21										
112		SISTEMA DE AGUA FRIA	2 días?	vie 24/09/21	sáb 25/09/21										
113		SALIDA DE AGUA FRIA	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21										
114		SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC 1/2"	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21										
115		RED DE DISTRIBUCION	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21										
116		TUBERIA DE DISTRIBUCION PVC 3/4" - SAP	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21										
117		TUBERIA DE DISTRIBUCION PVC 1/2" - SAP	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21										
118		ACCESORIOS DE REDES	2 días?	vie 24/09/21	sáb 25/09/21										
119		CODO 90° PVC 3/4"	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21										
120		CODO 90° PVC 1/2"	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21										


Proyecto: MODULO 4 (bloque 7) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21		23 ago '21			30 ago '21			06 se
						J	S	L	X	V	D	M	J	
121		TEES PVC 3/4"	1 día?	vie 24/09/21	vie 24/09/21									
122		TEES PVC 1/2"	1 día?	vie 24/09/21	vie 24/09/21									
123		VALVULAS	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21									
124		VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21									
125		RED DE DESAGUE	5 días	vie 24/09/21	mié 29/09/21									
126		SALIDAS	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21									
127		SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21									
128		RED DE DERIVACION	5 días	vie 24/09/21	mié 29/09/21									
129		TUBERIA PARA DESAGUE PVC - SAL DE 2"	5 días	vie 24/09/21	mié 29/09/21									
130		TUBERIA PARA DESAGUE PVC - SAL DE 4"	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21									
131		ACCESORIOS DE REDES	4 días	vie 24/09/21	mar 28/09/21									
132		YEE PVC 2"	3 días	vie 24/09/21	lun 27/09/21									
133		YEE PVC 4" a 2"	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21									
134		CODOS 45° PVC 2"	4 días	vie 24/09/21	mar 28/09/21									
135		SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21									
136		CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" con registro de 8"	2 días	vie 24/09/21	sáb 25/09/21									
137		PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS	1 día?	lun 27/09/21	lun 27/09/21									
138		PRUEBA HIDRAULICA	1 día?	lun 27/09/21	lun 27/09/21									
139		INSTALACIONES ELECTRICAS	15 días?	jue 21/10/21	lun 08/11/21									
140		SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZAS Y SEÑALES	15 días?	jue 21/10/21	lun 08/11/21									
141		SALIDAS	6 días	jue 21/10/21	mié 27/10/21									
142		SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	3 días	jue 21/10/21	sáb 23/10/21									
143		SALIDA INTERRUPTOR COMNUTACION	1 día	jue 21/10/21	jue 21/10/21									
144		SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA	1 día	jue 21/10/21	jue 21/10/21									


Proyecto: MODULO 4 (bloque 7) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21 J	S	23 ago '21 L	X	V	30 ago '21 D	M	J	S	06 se L
145		SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA	2 días	jue 21/10/21	vie 22/10/21										
146		SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA	3 días	jue 21/10/21	sáb 23/10/21										
147		SALIDA PARA BRAQUETE	6 días	jue 21/10/21	mié 27/10/21										
148		CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS	4 días	sáb 23/10/21	mié 27/10/21										
149		TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm	4 días	sáb 23/10/21	mié 27/10/21										
150		CABLES	2 días	mar 26/10/21	mié 27/10/21										
151		CABLE TW 2.5 mm2	2 días	mar 26/10/21	mié 27/10/21										
152		CABLE TW 4 mm2	1 día	mar 26/10/21	mar 26/10/21										
153		CAJAS	1 día?	sáb 23/10/21	sáb 23/10/21										
154		CAJA DE PASE CUADRADA 100 x 100 x 100 mm	1 día?	sáb 23/10/21	sáb 23/10/21										
155		TABLEROS ELECTRICOS	2 días	jue 04/11/21	vie 05/11/21										
156		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	2 días	jue 04/11/21	vie 05/11/21										
157		TABLERO DE DISTRIBUCION EMPOTRADO	2 días	jue 04/11/21	vie 05/11/21										
158		ARTEFACTOS DE ALUMBRADO	2 días	sáb 06/11/21	lun 08/11/21										
159		ARTEFACTO TIPO PHILIPS FOCO LED BULBO A60 7.5W 1117 RI ANCA	2 días	sáb 06/11/21	lun 08/11/21										
160		LUZ DE EMERGENCIA	1 día	sáb 06/11/21	sáb 06/11/21										


Proyecto: MODULO 4 (bloque 7) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

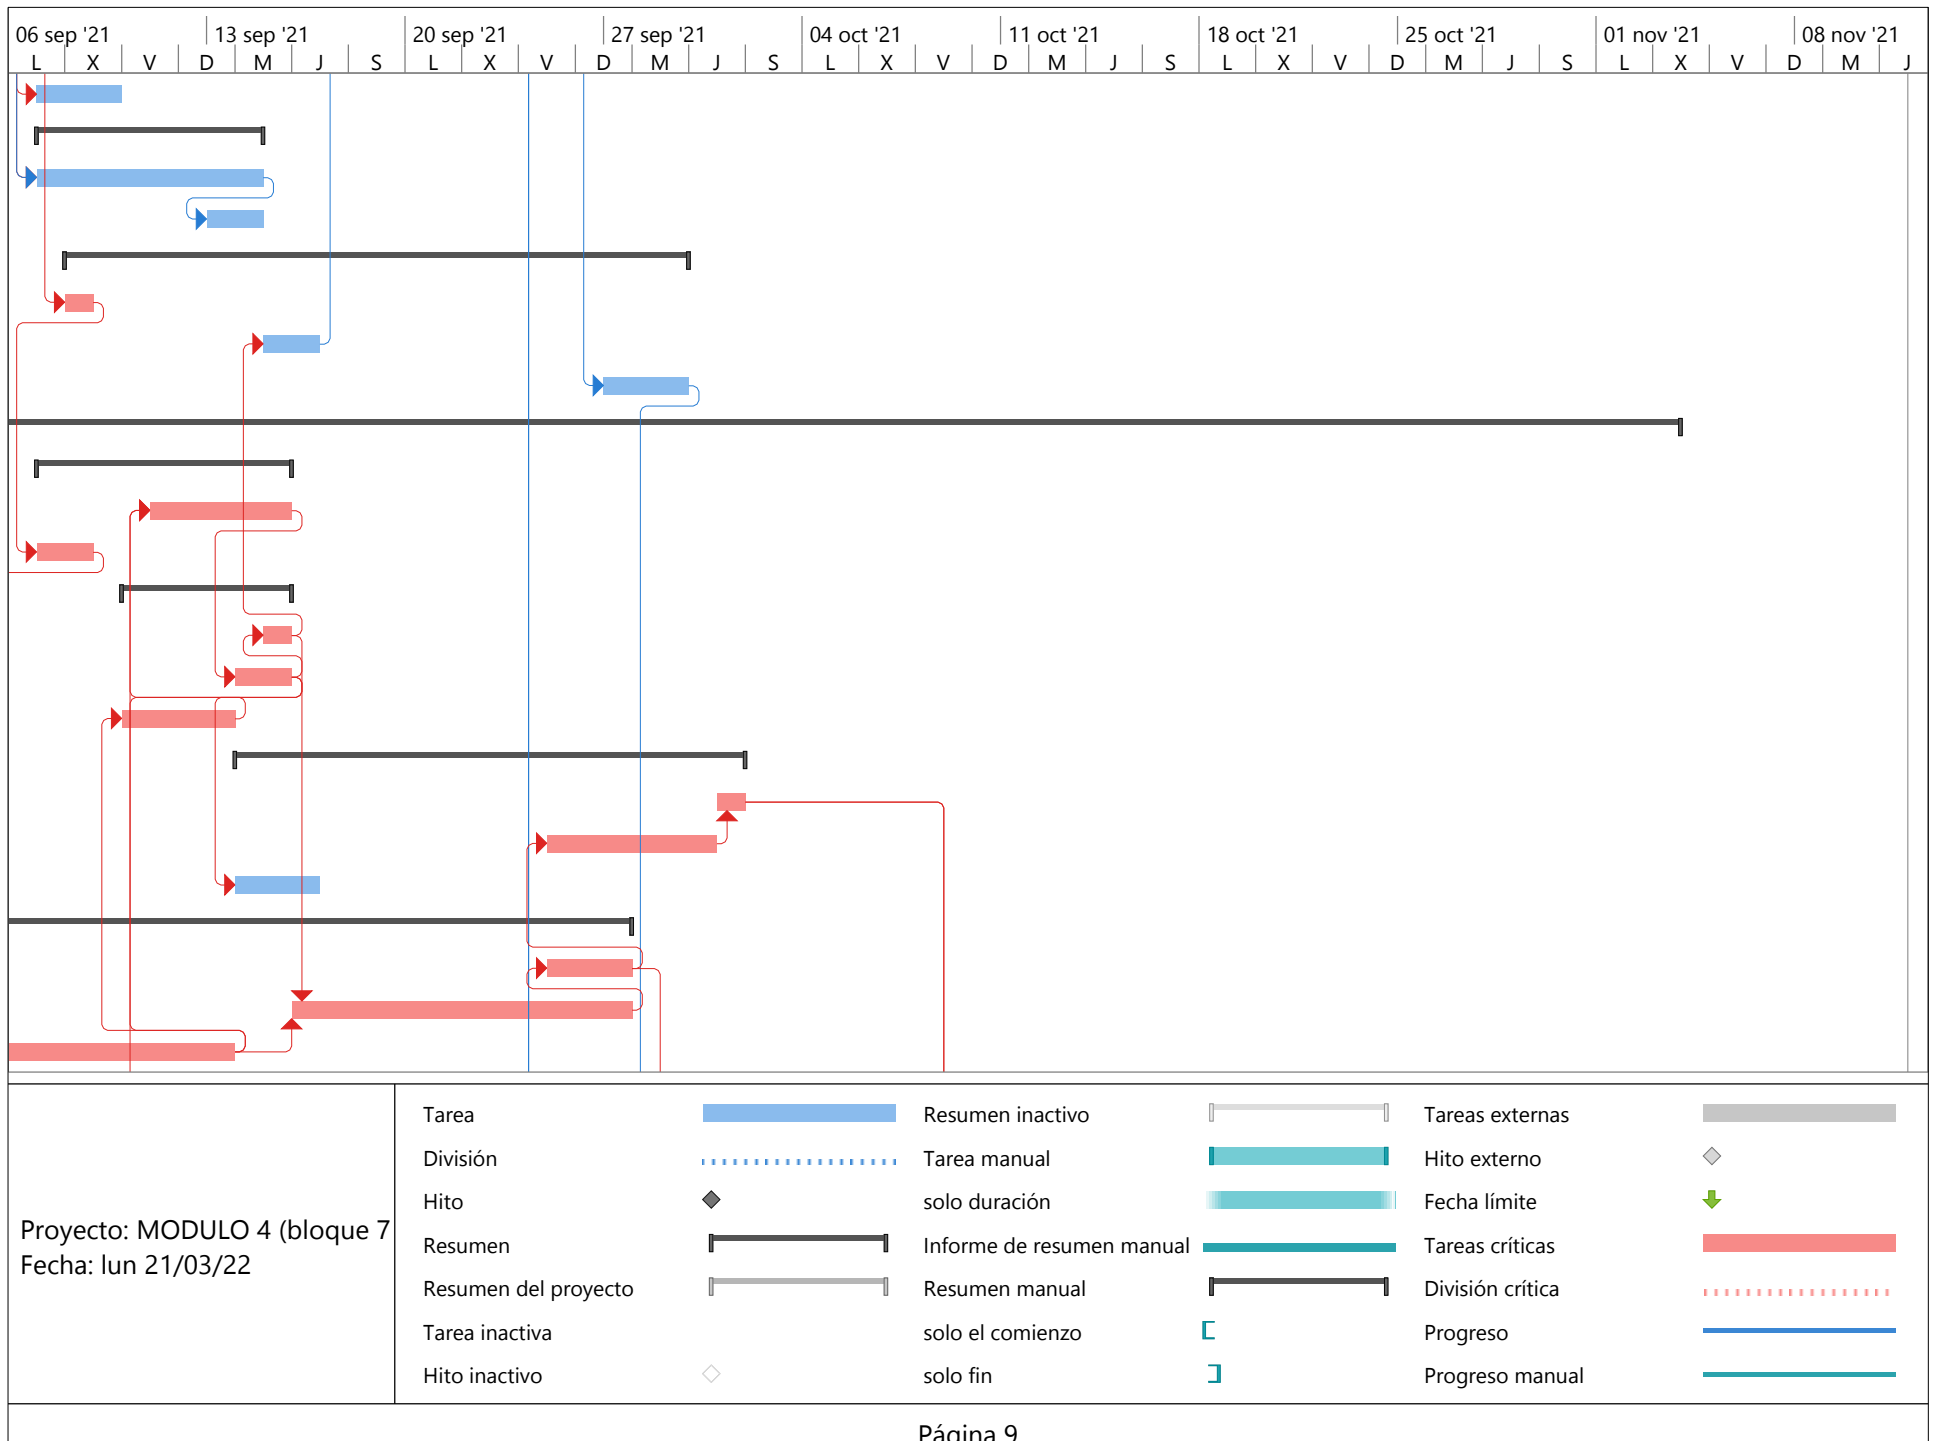


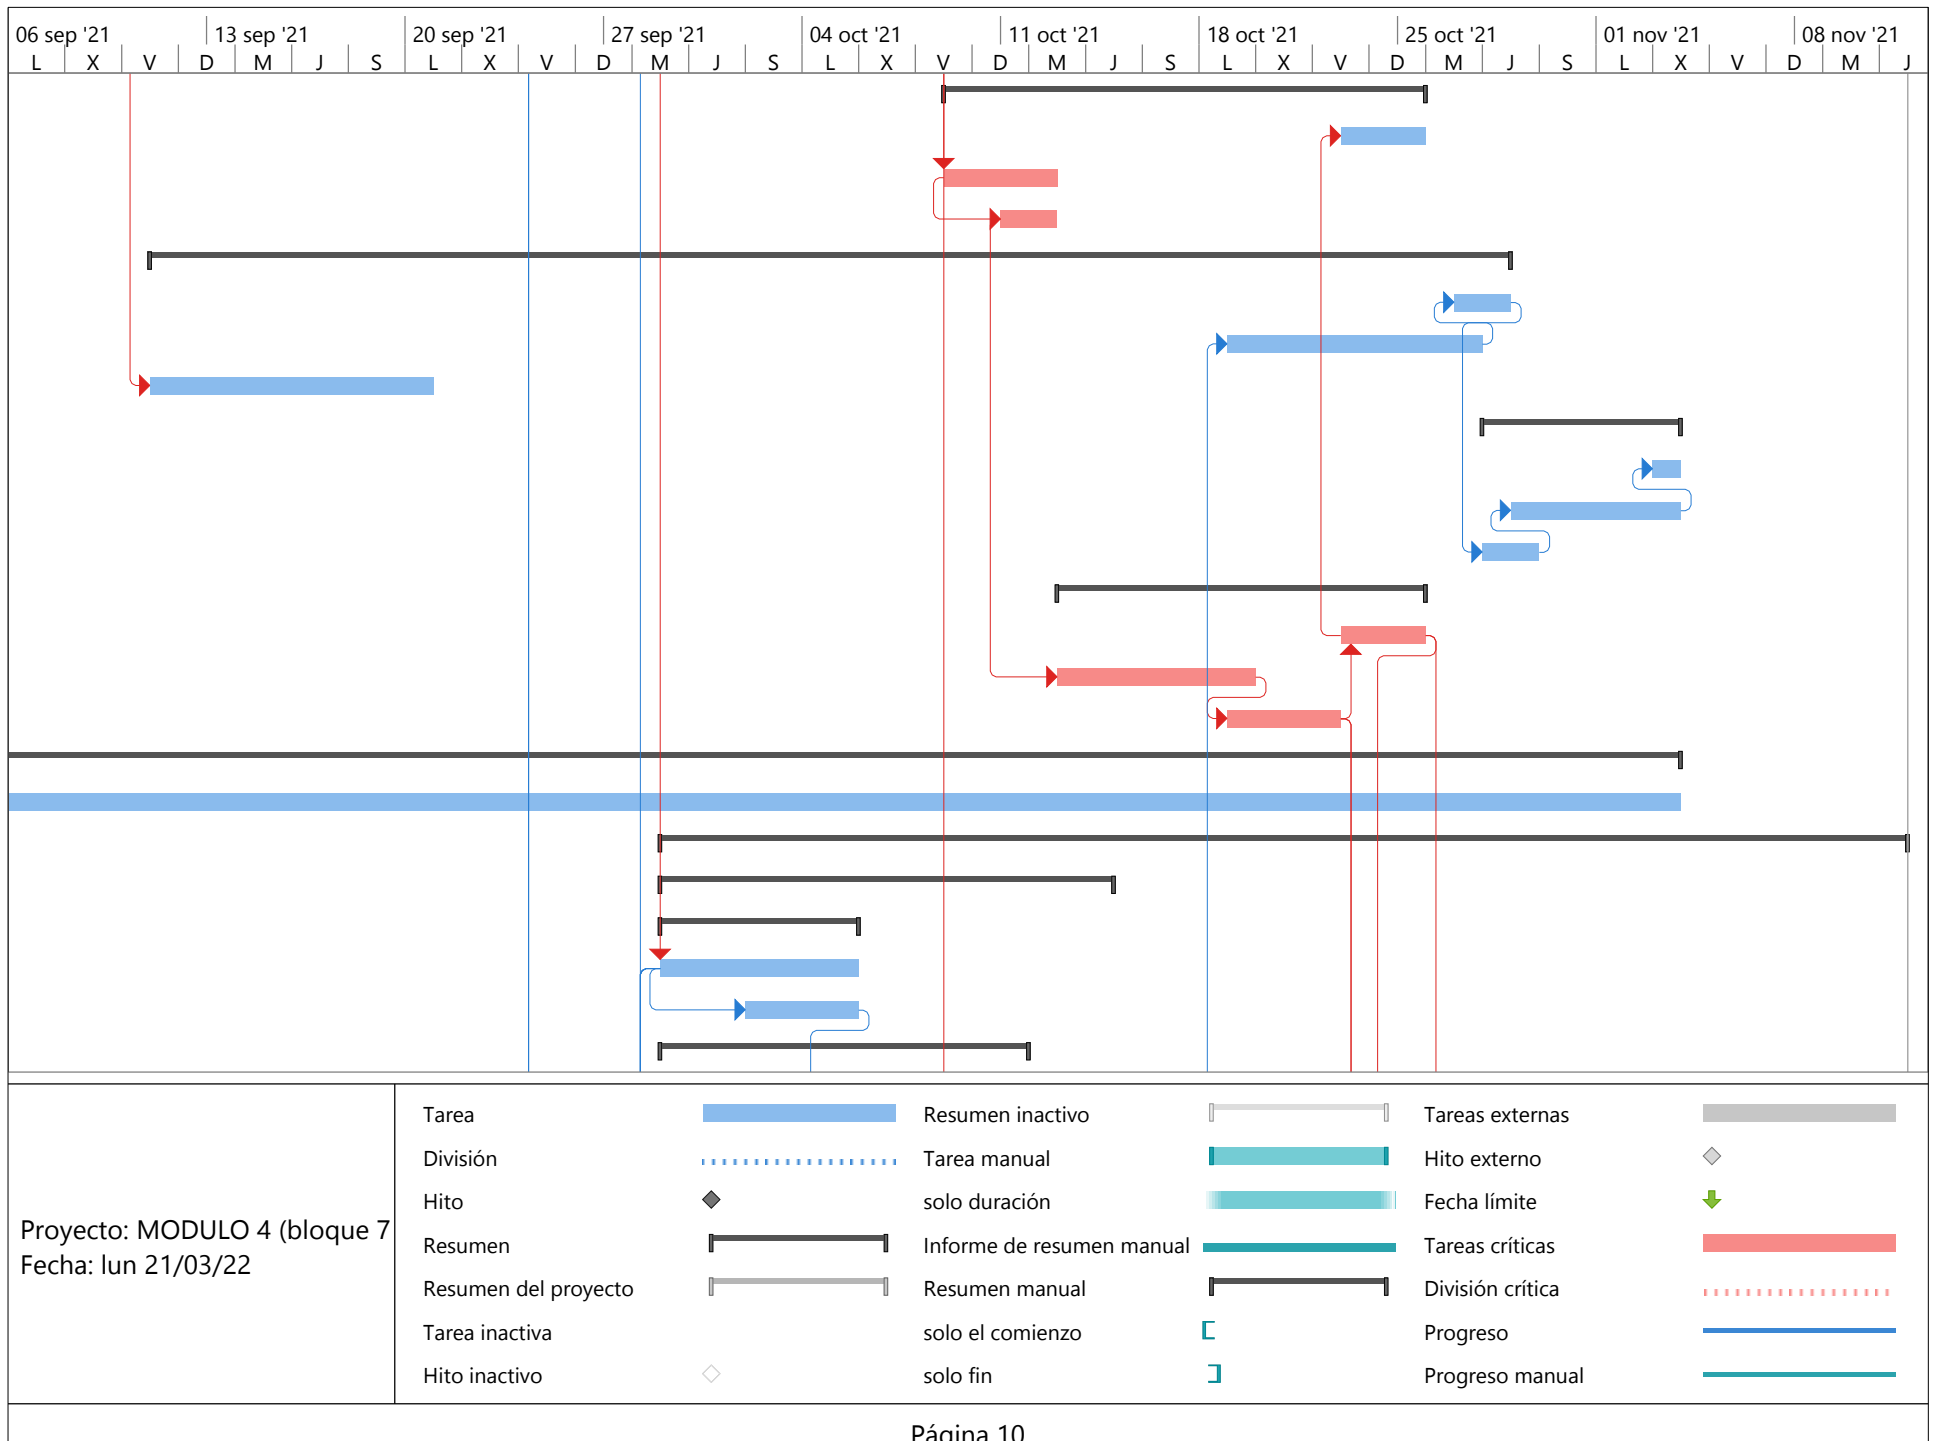


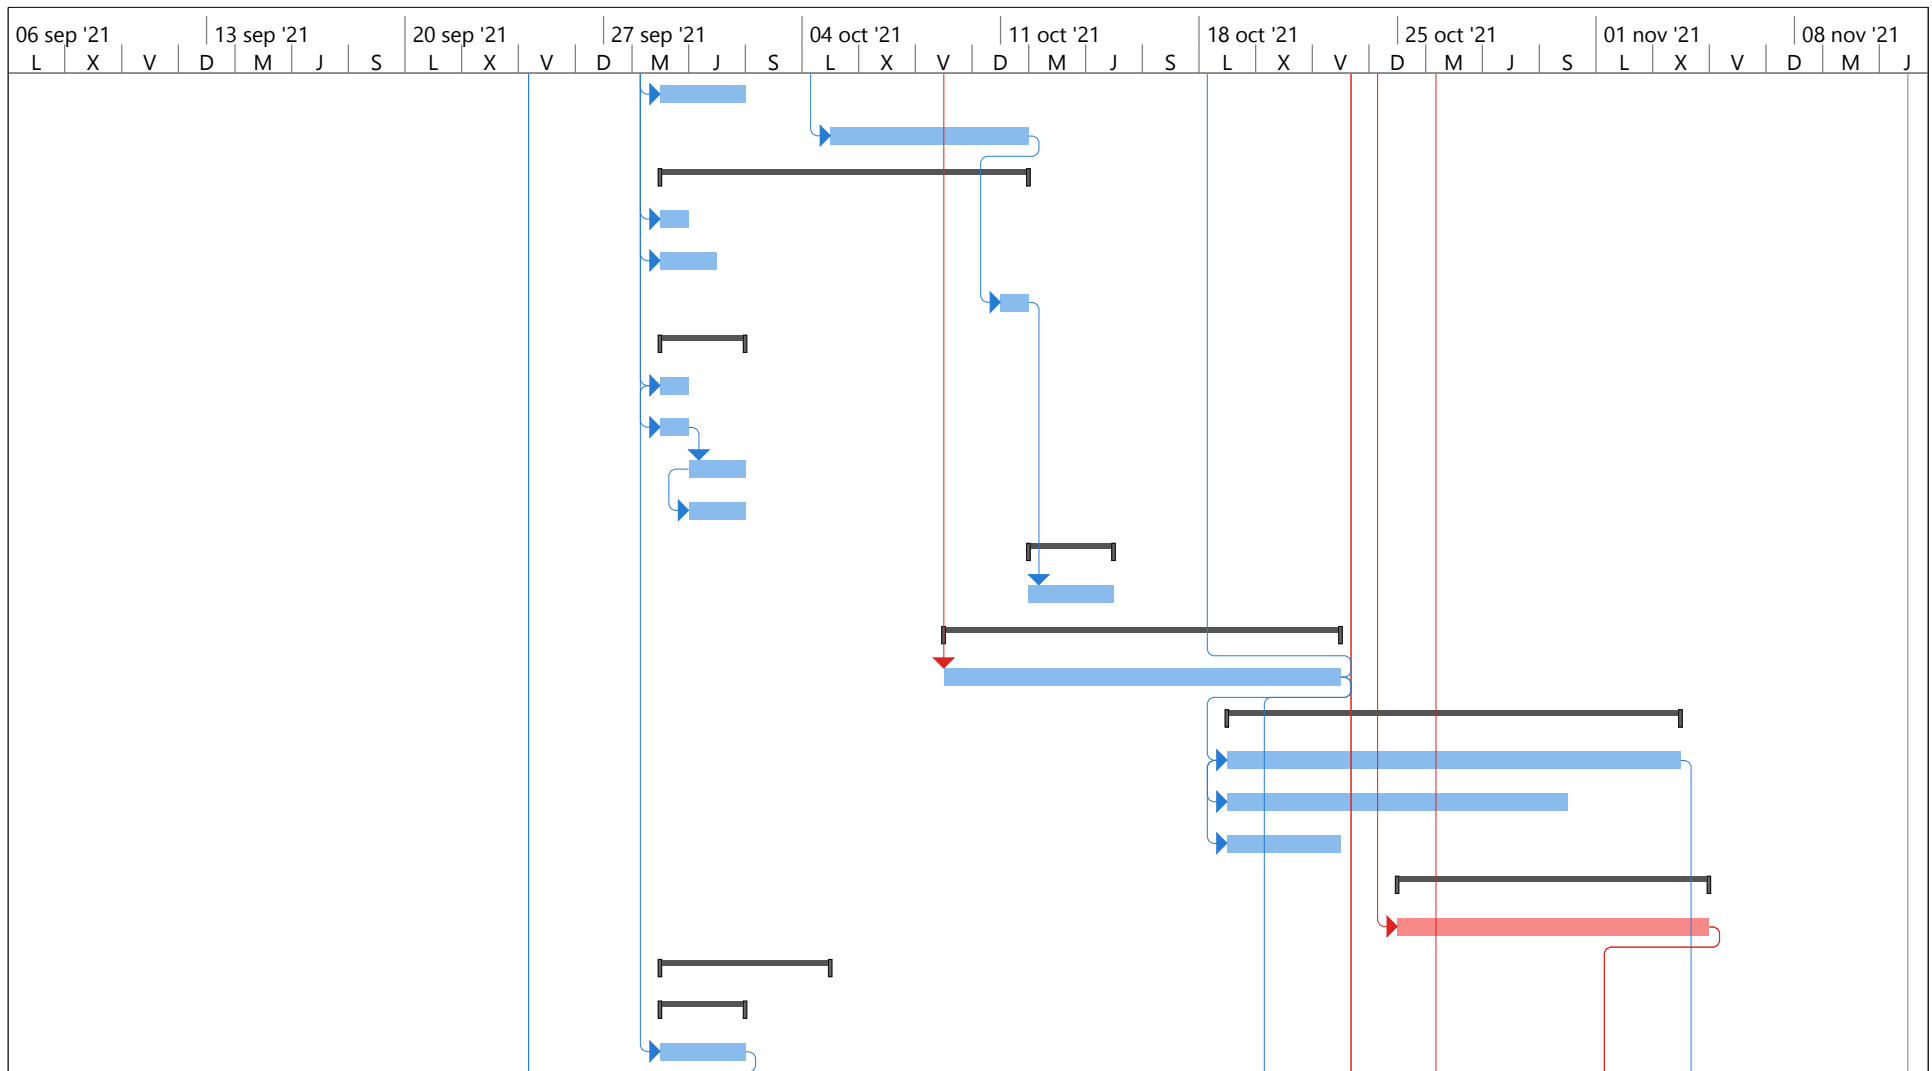


Proyecto: MODULO 4 (bloque 7) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

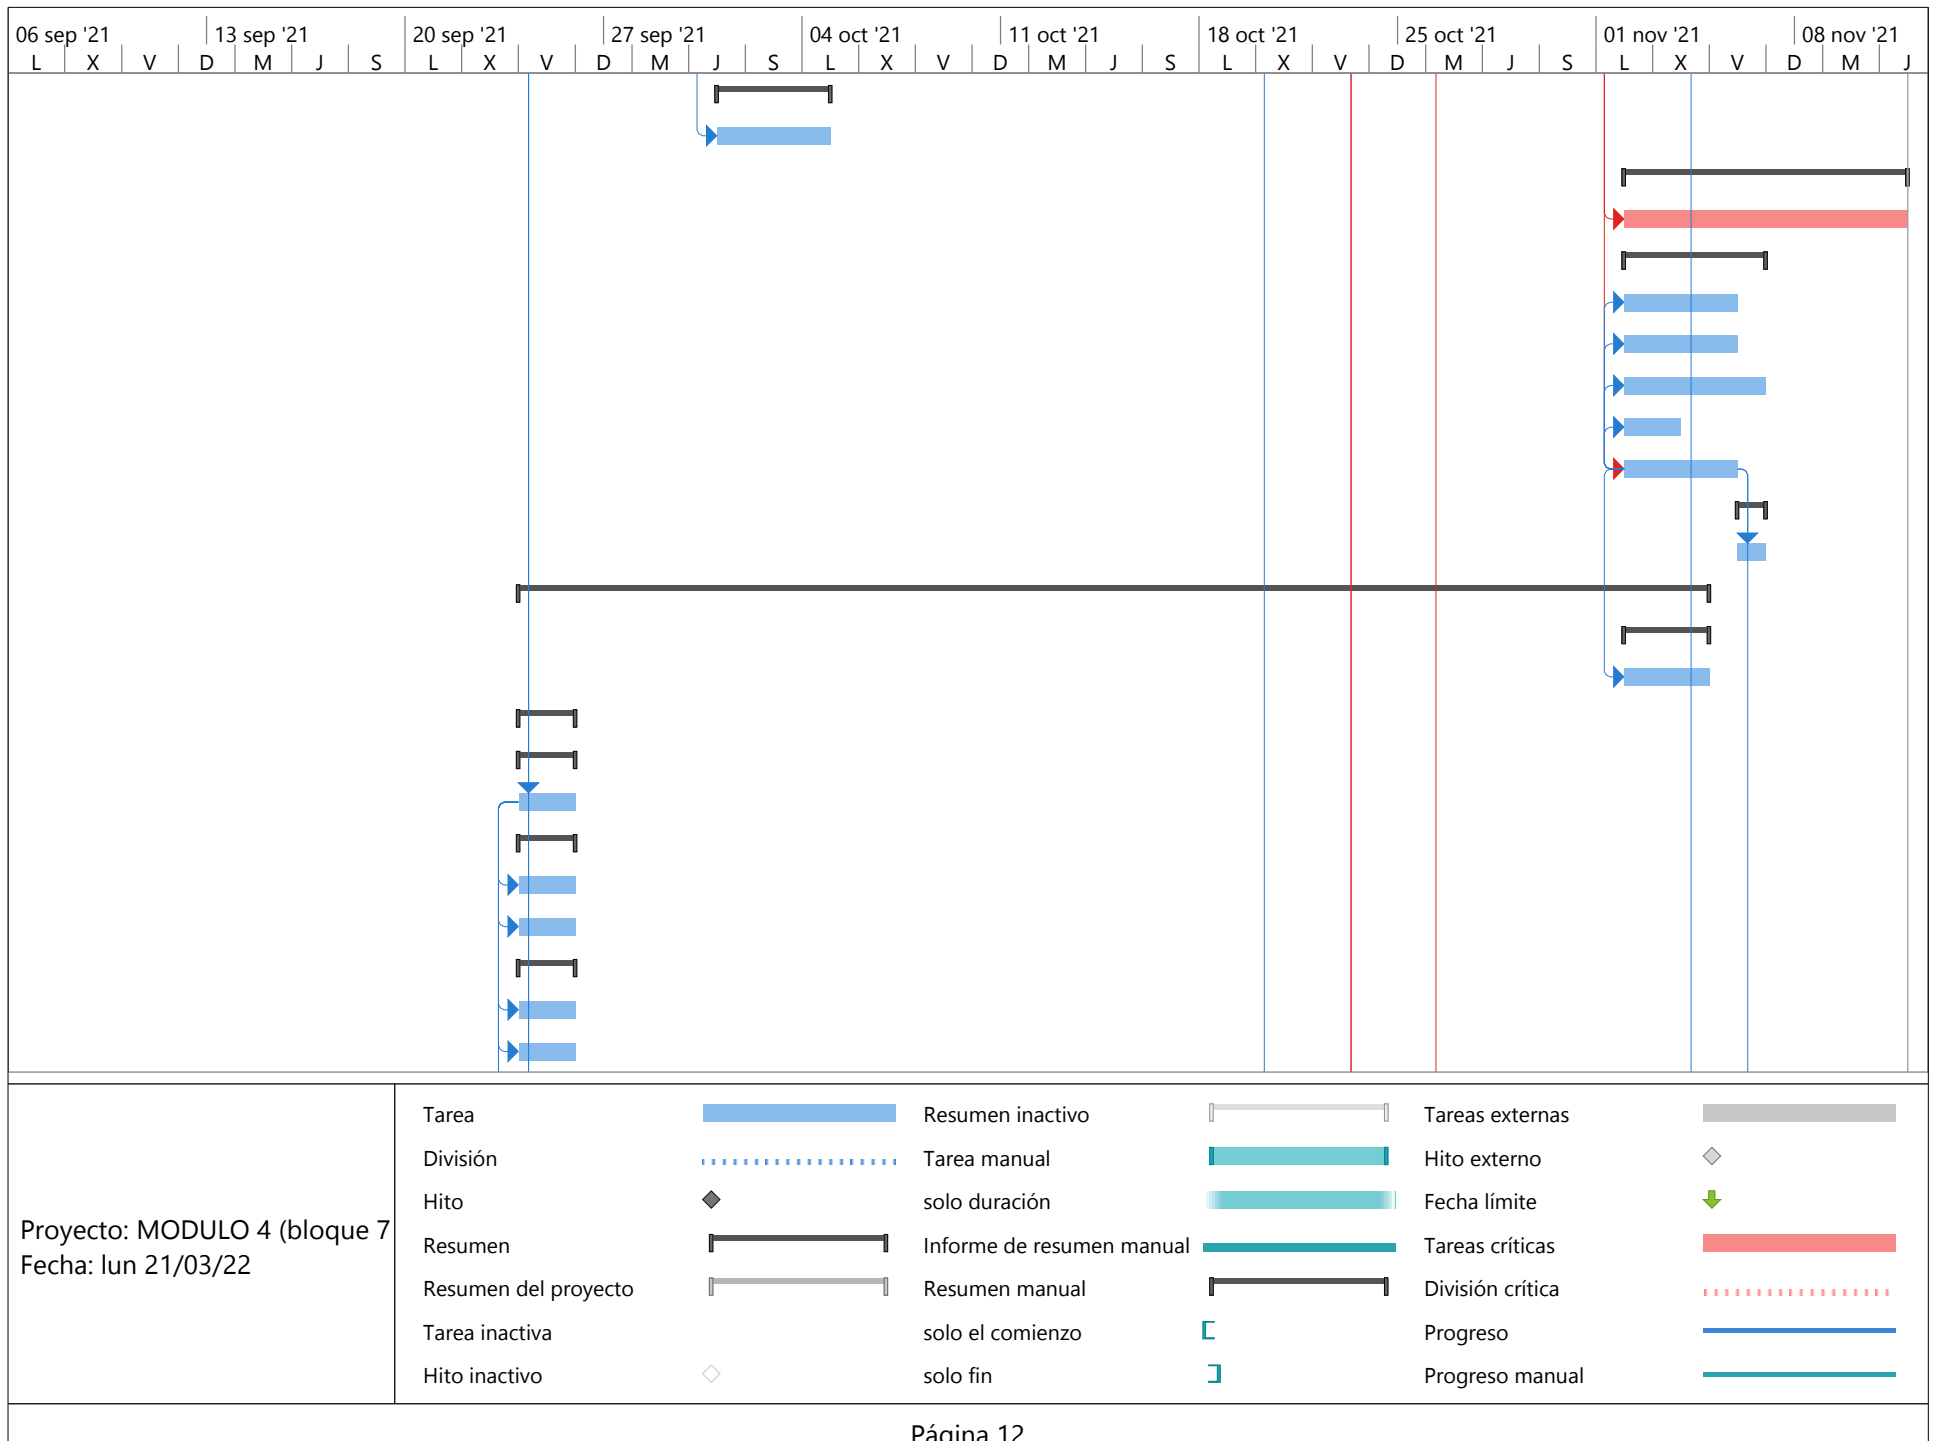


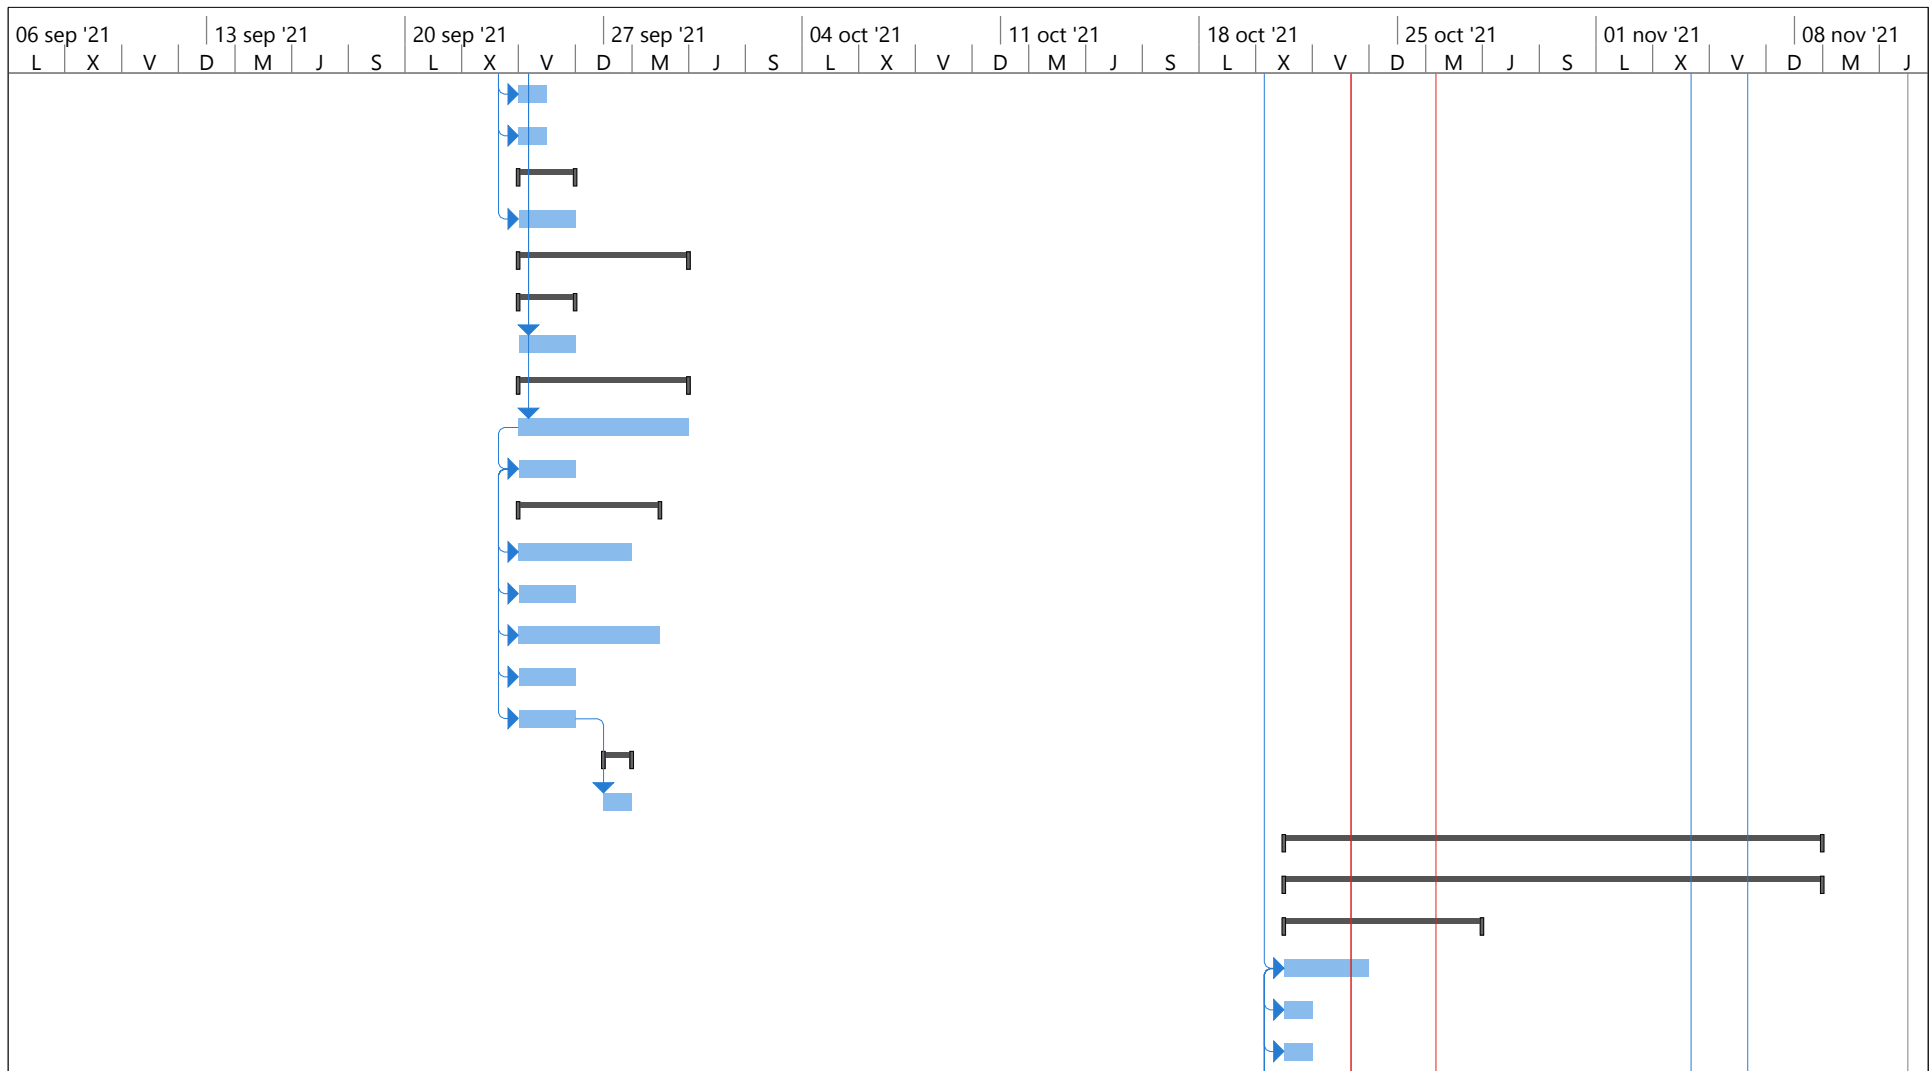


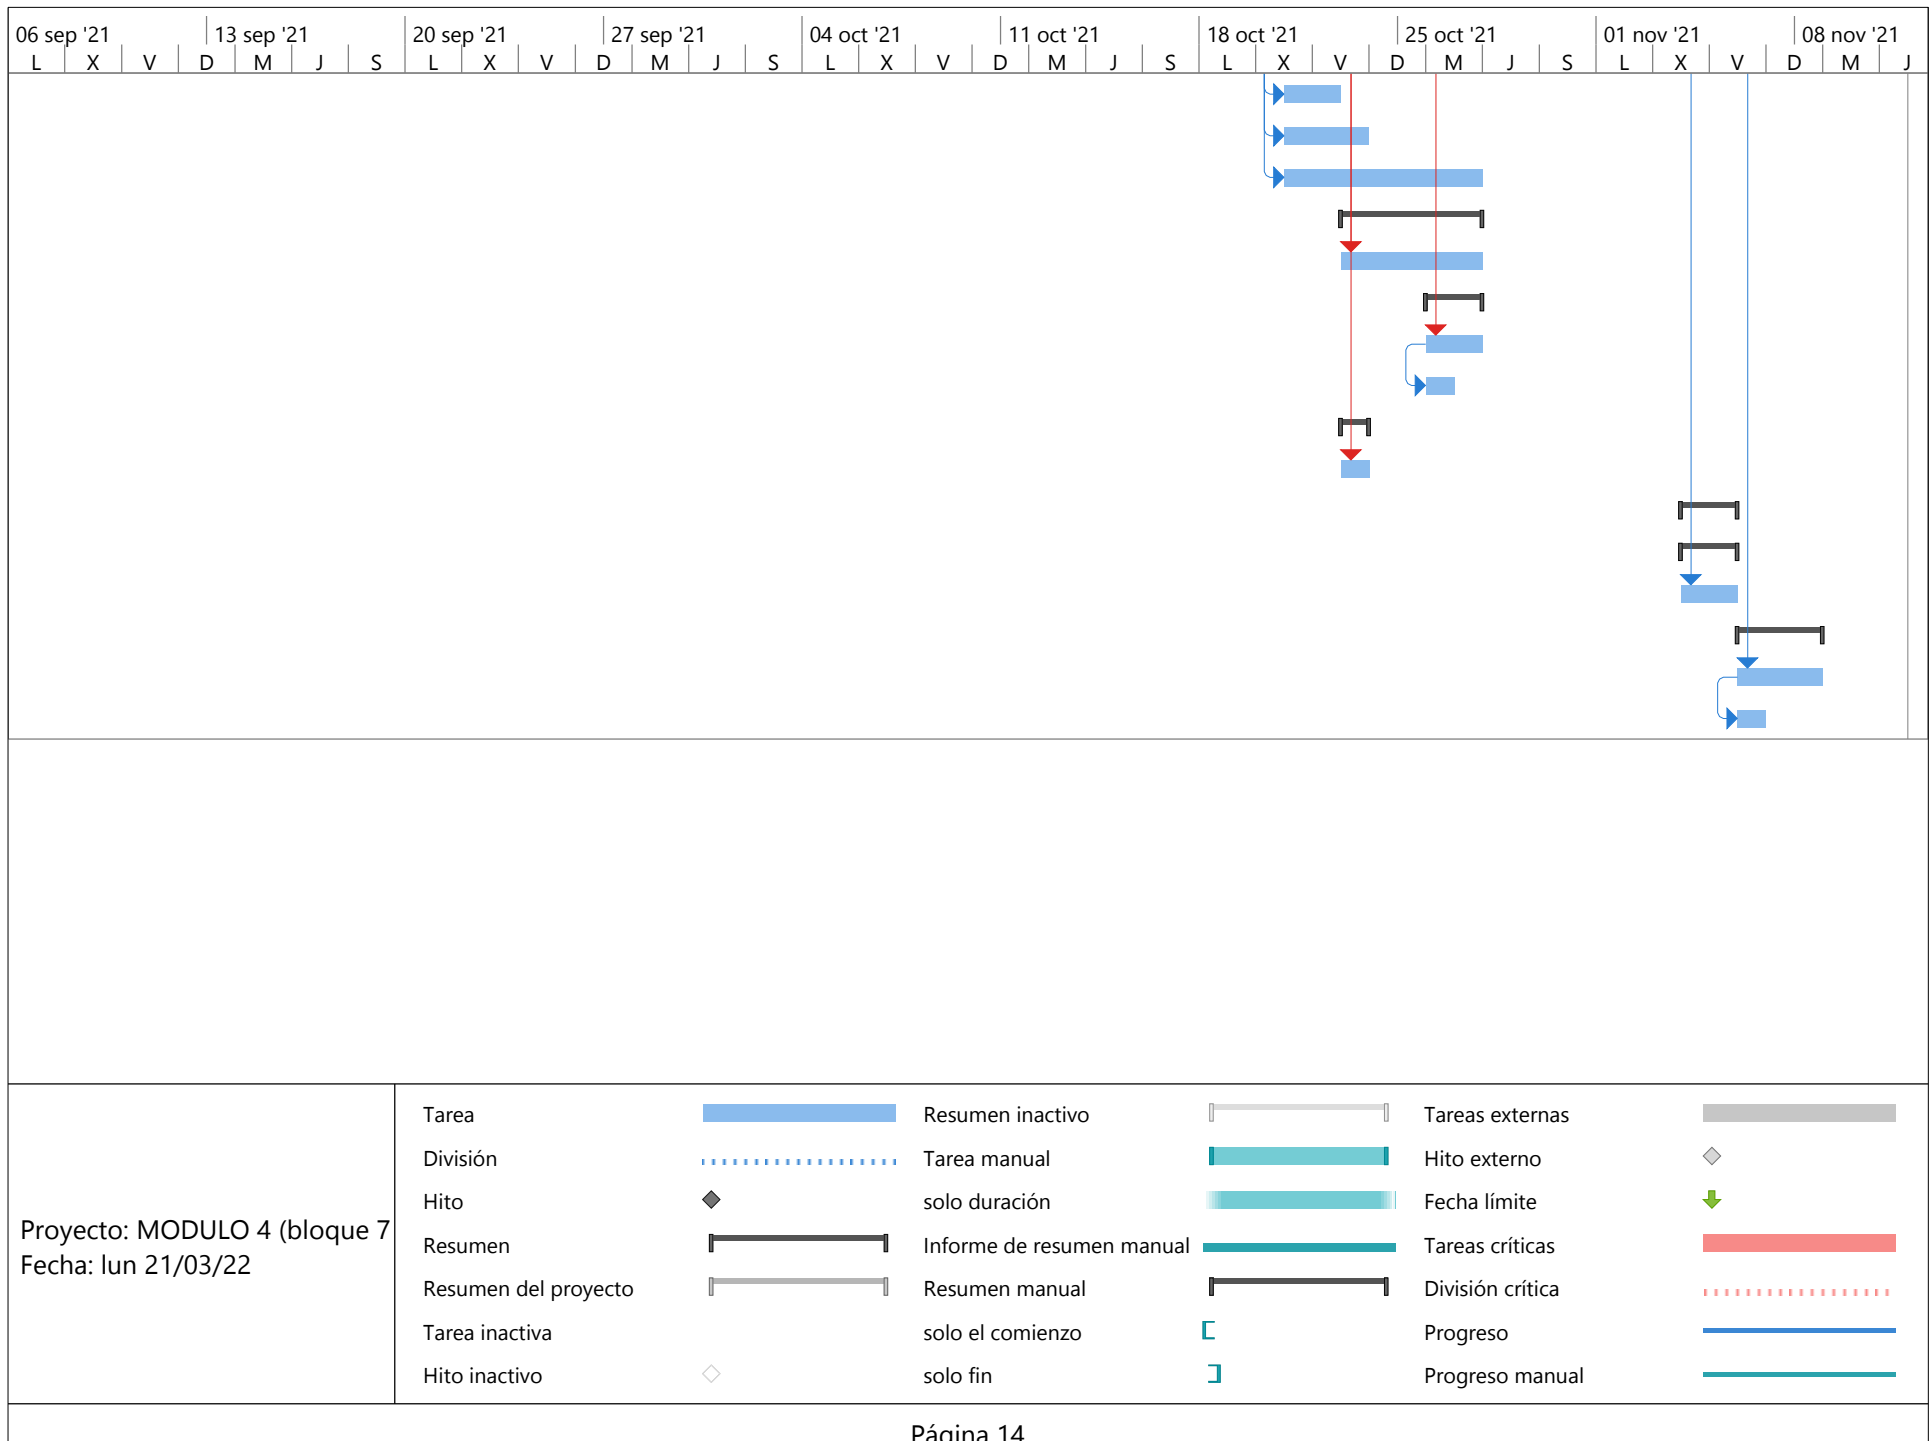





Proyecto: MODULO 4 (bloque 7) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	










Proyecto: MODULO 4 (bloque 7) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





Proyecto: MODULO 4 (bloque 7) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
