Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA (cuadrilla1)**	**73 días**	**vie 01/06/18**	**dom**
2		**TRABAJOS PRELIMINARES**	**7 días**	**vie 01/06/18**	**jue 07/06/18**
3		ALMACEN,OFICINAS, CARTEL	2 días	vie 01/06/18	sáb 02/06/18
4		TRASLADO DE MAQUINARIA	1 día	vie 01/06/18	vie 01/06/18
5		DESVIO CAUCE DE RIO	5 días	sáb 02/06/18	mié 06/06/18
6		TRAZO Y REPLANTEO	1 día	jue 07/06/18	jue 07/06/18
7		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**23 días**	**vie 08/06/18**	**sáb 30/06/18**
8		EXCAVACIÓN DE MATERIAL	7 días	vie 08/06/18	jue 14/06/18
9		REFINE DE EXCAVACIÓN	3 días	jue 14/06/18	sáb 16/06/18
10		RELLENO CON MATERIAL PROPIO	3 días	jue 28/06/18	sáb 30/06/18
11		ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	3 días	dom	mar 19/06/18
12		**OBRAS DE CONCRETO SIMPLE**	**30 días**	**dom**	**lun 16/07/18**
13		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	6 días	mar 19/06/18	dom 24/06/18
14		CONCRETO F´C = 100 KG/CM2 PARA	2 días	dom	lun 18/06/18
15		CONCRETO F´C = 210 KG/CM2 PARA	6 días	vie 22/06/18	mié 27/06/18
16		ENROCADO PARA BOCATOMA	3 días	sáb 14/07/18	lun 16/07/18
17		**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**	**16 días**	**jue 28/06/18**	**vie 13/07/18**
18		**MURO DE ENCAUZAMIENTO**	**8 días**	**jue 28/06/18**	**jue 05/07/18**
19		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días	sáb 30/06/18	lun 02/07/18
20		ACERO FY= 4200 KG/CM2	2 días	jue 28/06/18	vie 29/06/18
21		CONCRETO F´C= 210 KG/CM2	3 días	mar 03/07/18	jue 05/07/18
22		**PILARES**	**8 días**	**vie 06/07/18**	**vie 13/07/18**
23		ACERO FY= 4200 KG/CM2	2 días	vie 06/07/18	sáb 07/07/18
24		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días	dom	mar 10/07/18
25		CONCRETO F´C= 210 KG/CM2	3 días	mié 11/07/18	vie 13/07/18
26		**COMPUERTAS DE BOCATOMA**	**4 días**	**mar 24/07/18**	**vie 27/07/18**
27		COMPUERTA DE LIMPIA INCLUIDO	1 día	mar 24/07/18	mar 24/07/18
28		ATAGUÍA INCLUIDO INSTALACIÓN	1 día	mié 25/07/18	mié 25/07/18
29		COMPUERTA DE CAPTACIÓN	1 día	jue 26/07/18	jue 26/07/18
30		REJILLA DE CAPTACIÓN	1 día	vie 27/07/18	vie 27/07/18
31		**CONSTRUCCIÓN DE DESRIPIADOR**	**37 días**	**mié 20/06/18**	**jue 26/07/18**
32		**OBRAS PRELIMINARES**	**2 días**	**mié 20/06/18**	**jue 21/06/18**
33		LIMPIEZA DEL TERRENO	1 día	mié 20/06/18	mié 20/06/18
34		TRAZO Y REPLANTEO	1 día	jue 21/06/18	jue 21/06/18
35		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**3 días**	**vie 22/06/18**	**dom 24/06/18**
36		EXCAVACIÓN DE MATERIAL	1 día	vie 22/06/18	vie 22/06/18
37		REFINE DE EXCAVACIÓN	1 día	sáb 23/06/18	sáb 23/06/18
38		ELIMINACIÓN DE MATERIAL	1 día	dom	dom
39		**OBRAS DE CONCRETO**	**11 días**	**sáb 14/07/18**	**mar**
40		CONCRETO F´C = 100 KG/CM2 PARA	1 día	sáb 14/07/18	sáb 14/07/18
41		ACERO FY= 4200 KG/CM2	2 días	dom	lun 16/07/18
42		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	2 días	mar 17/07/18	mié 18/07/18
43		CONCRETO F´C= 210 KG/CM2	2 días	jue 19/07/18	vie 20/07/18
44		JUNTAS	1 día	mar 24/07/18	mar 24/07/18
45		**COMPUERTAS DE LIMPIA**	**2 días**	**mié 25/07/18**	**jue 26/07/18**
46		COMPUERTA DE LIMPIA INCLUIDO	1 día	mié 25/07/18	mié 25/07/18
47		TUBERÍA DE LIMPIA PVC CLASE 10, ø 10"	1 día	jue 26/07/18	jue 26/07/18
48		**CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR**	**37 días**	**mié 27/06/18**	**jue 02/08/18**
49		**OBRAS PRELIMINARES**	**2 días**	**mié 27/06/18**	**jue 28/06/18**
50		LIMPIEZA DEL TERRENO	1 día	mié 27/06/18	mié 27/06/18
51		TRAZO Y REPLANTEO	1 día	jue 28/06/18	jue 28/06/18
52		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**3 días**	**vie 29/06/18**	**dom 01/07/18**
53		EXCAVACIÓN DE MATERIAL	1 día	vie 29/06/18	vie 29/06/18
54		REFINE DE EXCAVACIÓN	1 día	sáb 30/06/18	sáb 30/06/18
55		ELIMINACIÓN DE MATERIAL	1 día	dom	dom
56		**OBRAS DE CONCRETO**	**11 días**	**sáb 21/07/18**	**mar**
57		CONCRETO F´C = 100 KG/CM2 PARA	1 día	sáb 21/07/18	sáb 21/07/18
58		ACERO FY= 4200 KG/CM2	2 días	dom 22/07/18	lun 23/07/18
59		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	3 días	mar 24/07/18	jue 26/07/18
60		CONCRETO F´C= 210 KG/CM2	2 días	vie 27/07/18	sáb 28/07/18
61		JUNTAS ASFÁLTICAS	1 día	mar 31/07/18	mar 31/07/18
62		**COMPUERTAS DE LIMPIA**	**2 días**	**mié 01/08/18**	**jue 02/08/18**
63		COMPUERTA DE LIMPIA INCLUIDO	1 día	mié 01/08/18	mié 01/08/18
64		TUBERÍA DE LIMPIA PVC CLASE 10, ø 10"	1 día	jue 02/08/18	jue 02/08/18
65		**CANAL DE CONDUCCIÓN SECCIÓN**	**62 días**	**mar**	**dom**
66		**OBRAS PRELIMINARES**	**9 días**	**mar 12/06/18**	**mié 20/06/18**
67		LIMPIEZA DEL TERRENO	8 días	mar 12/06/18	mar 19/06/18
68		TRAZO Y REPLANTEO	5 días	sáb 16/06/18	mié 20/06/18
69		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**50 días**	**mar 19/06/18**	**mar 07/08/18**
70		EXCAVACIÓN DE MATERIAL	50 días	mar 19/06/18	mar 07/08/18
71		REFINE DE EXCAVACIONES	40 días	vie 29/06/18	mar 07/08/18
72		ELIMINACIÓN DE MATERIAL	35 días	mié 04/07/18	mar 07/08/18
73		**OBRAS DE CONCRETO**	**35 días**	**lun 09/07/18**	**dom 12/08/18**
74		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	32 días	lun 09/07/18	jue 09/08/18
75		CONCRETO F´C= 210 KG/CM2	28 días	vie 13/07/18	jue 09/08/18
76		JUNTAS ASFÁLTICAS	15 días	vie 27/07/18	vie 10/08/18
77		INSTALACION DE COMPUERTAS	2 días	sáb 11/08/18	dom 12/08/18
78		FIN	0 días	dom 12/08/18	dom 12/08/18

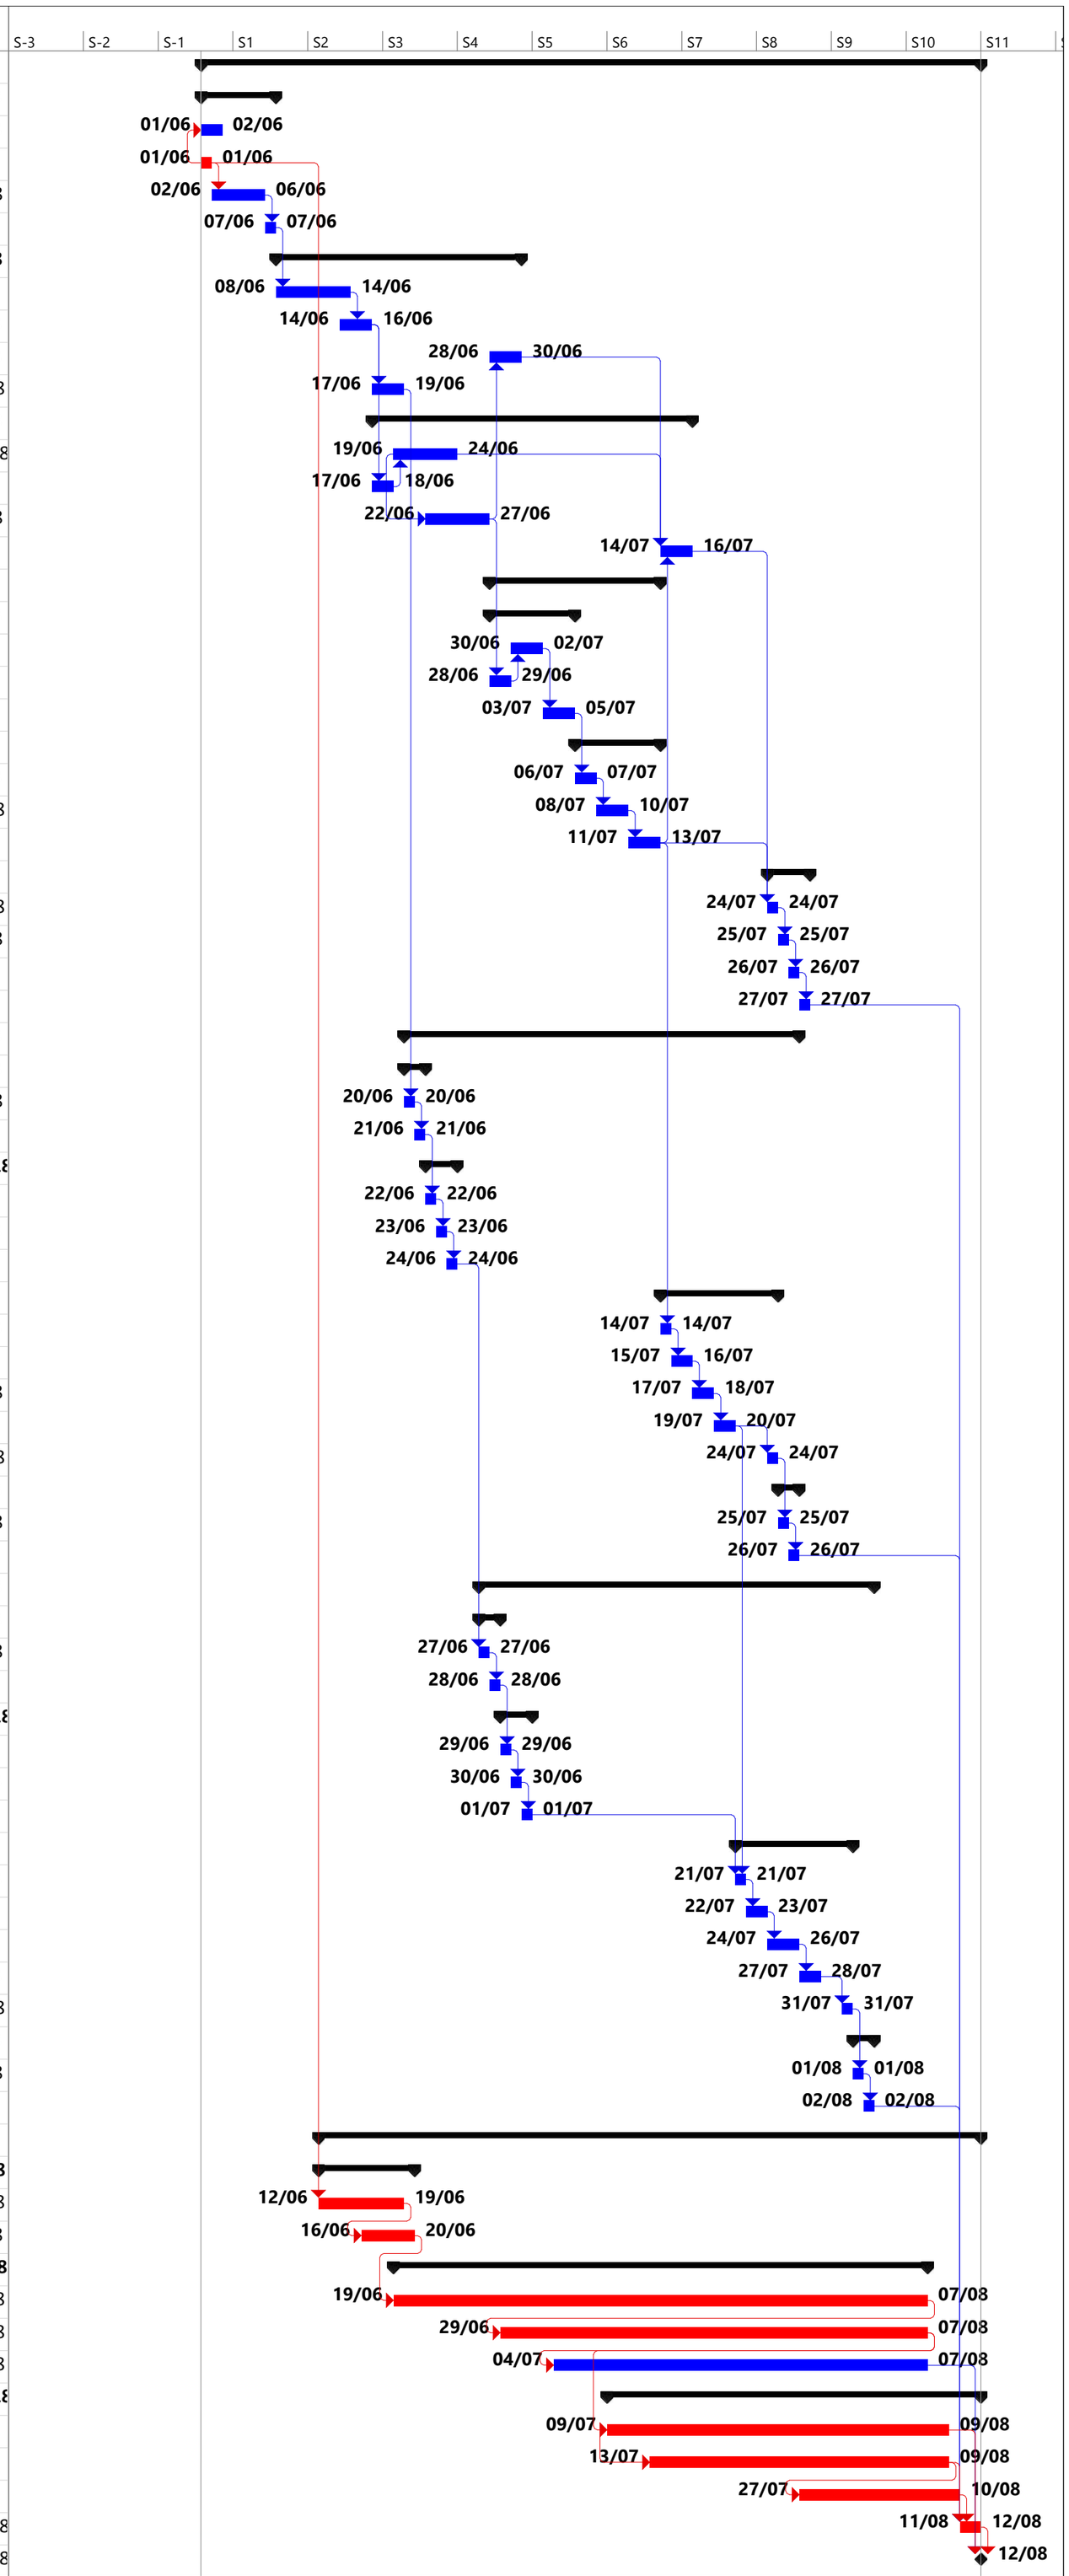

Proyecto: Proyecto1
Fecha: vie 21/06/19

Tarea · Agrupar por síntesis · Tareas externas · Tarea manual · solo fin
División · Tarea resumida · Hito externo · solo duración · Fecha límite
Hito · Tarea crítica resumida · Tarea inactiva · Informe de resumen manual · Tarea crítica
Resumen · Hito resumido · Hito inactivo · Resumen manual · Progreso
Resumen del proyecto · Progreso resumido · Resumen inactivo · solo el comienzo
