CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN VOLADIZO, ANCLADOS CON TENSIONES DE 565 KN PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL TALUD DE LA I.E. VIRGEN DE LAS MERCEDES N° 10084, CON FINES DE POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece
1		**ESTRUCTURAS**	**300 días**	**mar 5/11/19**	**lun 31/8/20**	
2		INICIO	0 días	mar 5/11/19	mar 5/11/19	
3		**OBRAS PROVISIONALES**	**4 días**	**mar 5/11/19**	**sáb 9/11/19**	
4		CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA	2 días	mar 5/11/19	jue 7/11/19	2
5		CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40x 5.00 m	1 día	mar 5/11/19	mié 6/11/19	2
6		BARANDA DE SEGURIDAD C/MADERA EUCALIPTO e=3"	4 días	mar 5/11/19	sáb 9/11/19	2
7		CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL CON CINTA	3 días	mar 5/11/19	vie 8/11/19	2
8		**OBRAS PRELIMINARES**	**40 días**	**jue 7/11/19**	**mar 17/12/19**	
9		LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	31 días	jue 7/11/19	dom 8/12/19	4
10		MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1 día	jue 7/11/19	vie 8/11/19	9CC
11		TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO ACCIDENTADO CON PENDIENTE	25 días	vie 22/11/19	mar 17/12/19	9FC-16 días
12		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**88 días**	**mar 17/12/19**	**sáb 14/3/20**	
13		EXCAVACIONES MASIVAS CON RETROEXCAVADORA	46 días	mar 17/12/19	sáb 1/2/20	11
14		REFINE DEL TERRENO EXCAVADO	7 días	sáb 1/2/20	sáb 8/2/20	13
15		ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	81 días	mar 24/12/19	sáb 14/3/20	13FC-39 días
16		**CONCRETO SIMPLE**	**1 día**	**sáb 14/3/20**	**dom 15/3/20**	
17		CONCRETO SOLADO e=0.10 cm, F'C=100kg/cm2	1 día	sáb 14/3/20	dom 15/3/20	15
18		**CONCRETO ARMADO**	**169 días**	**dom 15/3/20**	**lun 31/8/20**	
19		**MUROS DE CONTENCION**	**169 días**	**dom 15/3/20**	**lun 31/8/20**	
20		**CIMENTACIÓN-BASE DE MUROS DE CONTENCIÓN**	**98 días**	**dom 15/3/20**	**dom 21/6/20**	
21		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BASE DE MUROS DE CONTENCIÓN	22 días	dom 17/5/20	lun 8/6/20	22FC-22 días
22		HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2 PARA CIMENTACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	85 días	dom 15/3/20	lun 8/6/20	17
23		CONCRETO F'C= 280 Kg/cm2. PARA BASE DE MURO DE CONTENCION	21 días	dom 24/5/20	dom 14/6/20	21FC-15 días
24		CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	7 días	dom 14/6/20	dom 21/6/20	23
25		**PANTALLA DE MURO DE CONTENCION**	**169 días**	**dom 15/3/20**	**lun 31/8/20**	
26		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CONTENCIÓN h=7.25-10.05 m	61 días	jue 4/6/20	mar 4/8/20	27FC-61 días
27		HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL FY=4200kg/cm2	142 días	dom 15/3/20	mar 4/8/20	22CC
28		CONCRETO F'C= 280 Kg/cm2. PARA MURO DE CONTENCION	34 días	mié 15/7/20	mar 18/8/20	26FC-20 días
29		CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO	13 días	mar 18/8/20	lun 31/8/20	30FC-13 días
30		ACABADO PULIDO DE MURO, e = 5 cm, MEZCLA 1:3	26 días	mié 5/8/20	lun 31/8/20	28FC-13 días
31		DRENAJE CON GRAVA ½" – ¾" + TUB.PVC ?2"	28 días	mar 7/7/20	mar 4/8/20	27FC-28 días
32		JUNTA DE DILATACION DE TECNOPOR e=1"	2 días	mar 18/8/20	jue 20/8/20	28
33		ANCLAJES POSTENSADOS	32 días	jue 30/7/20	lun 31/8/20	28FC-19 días

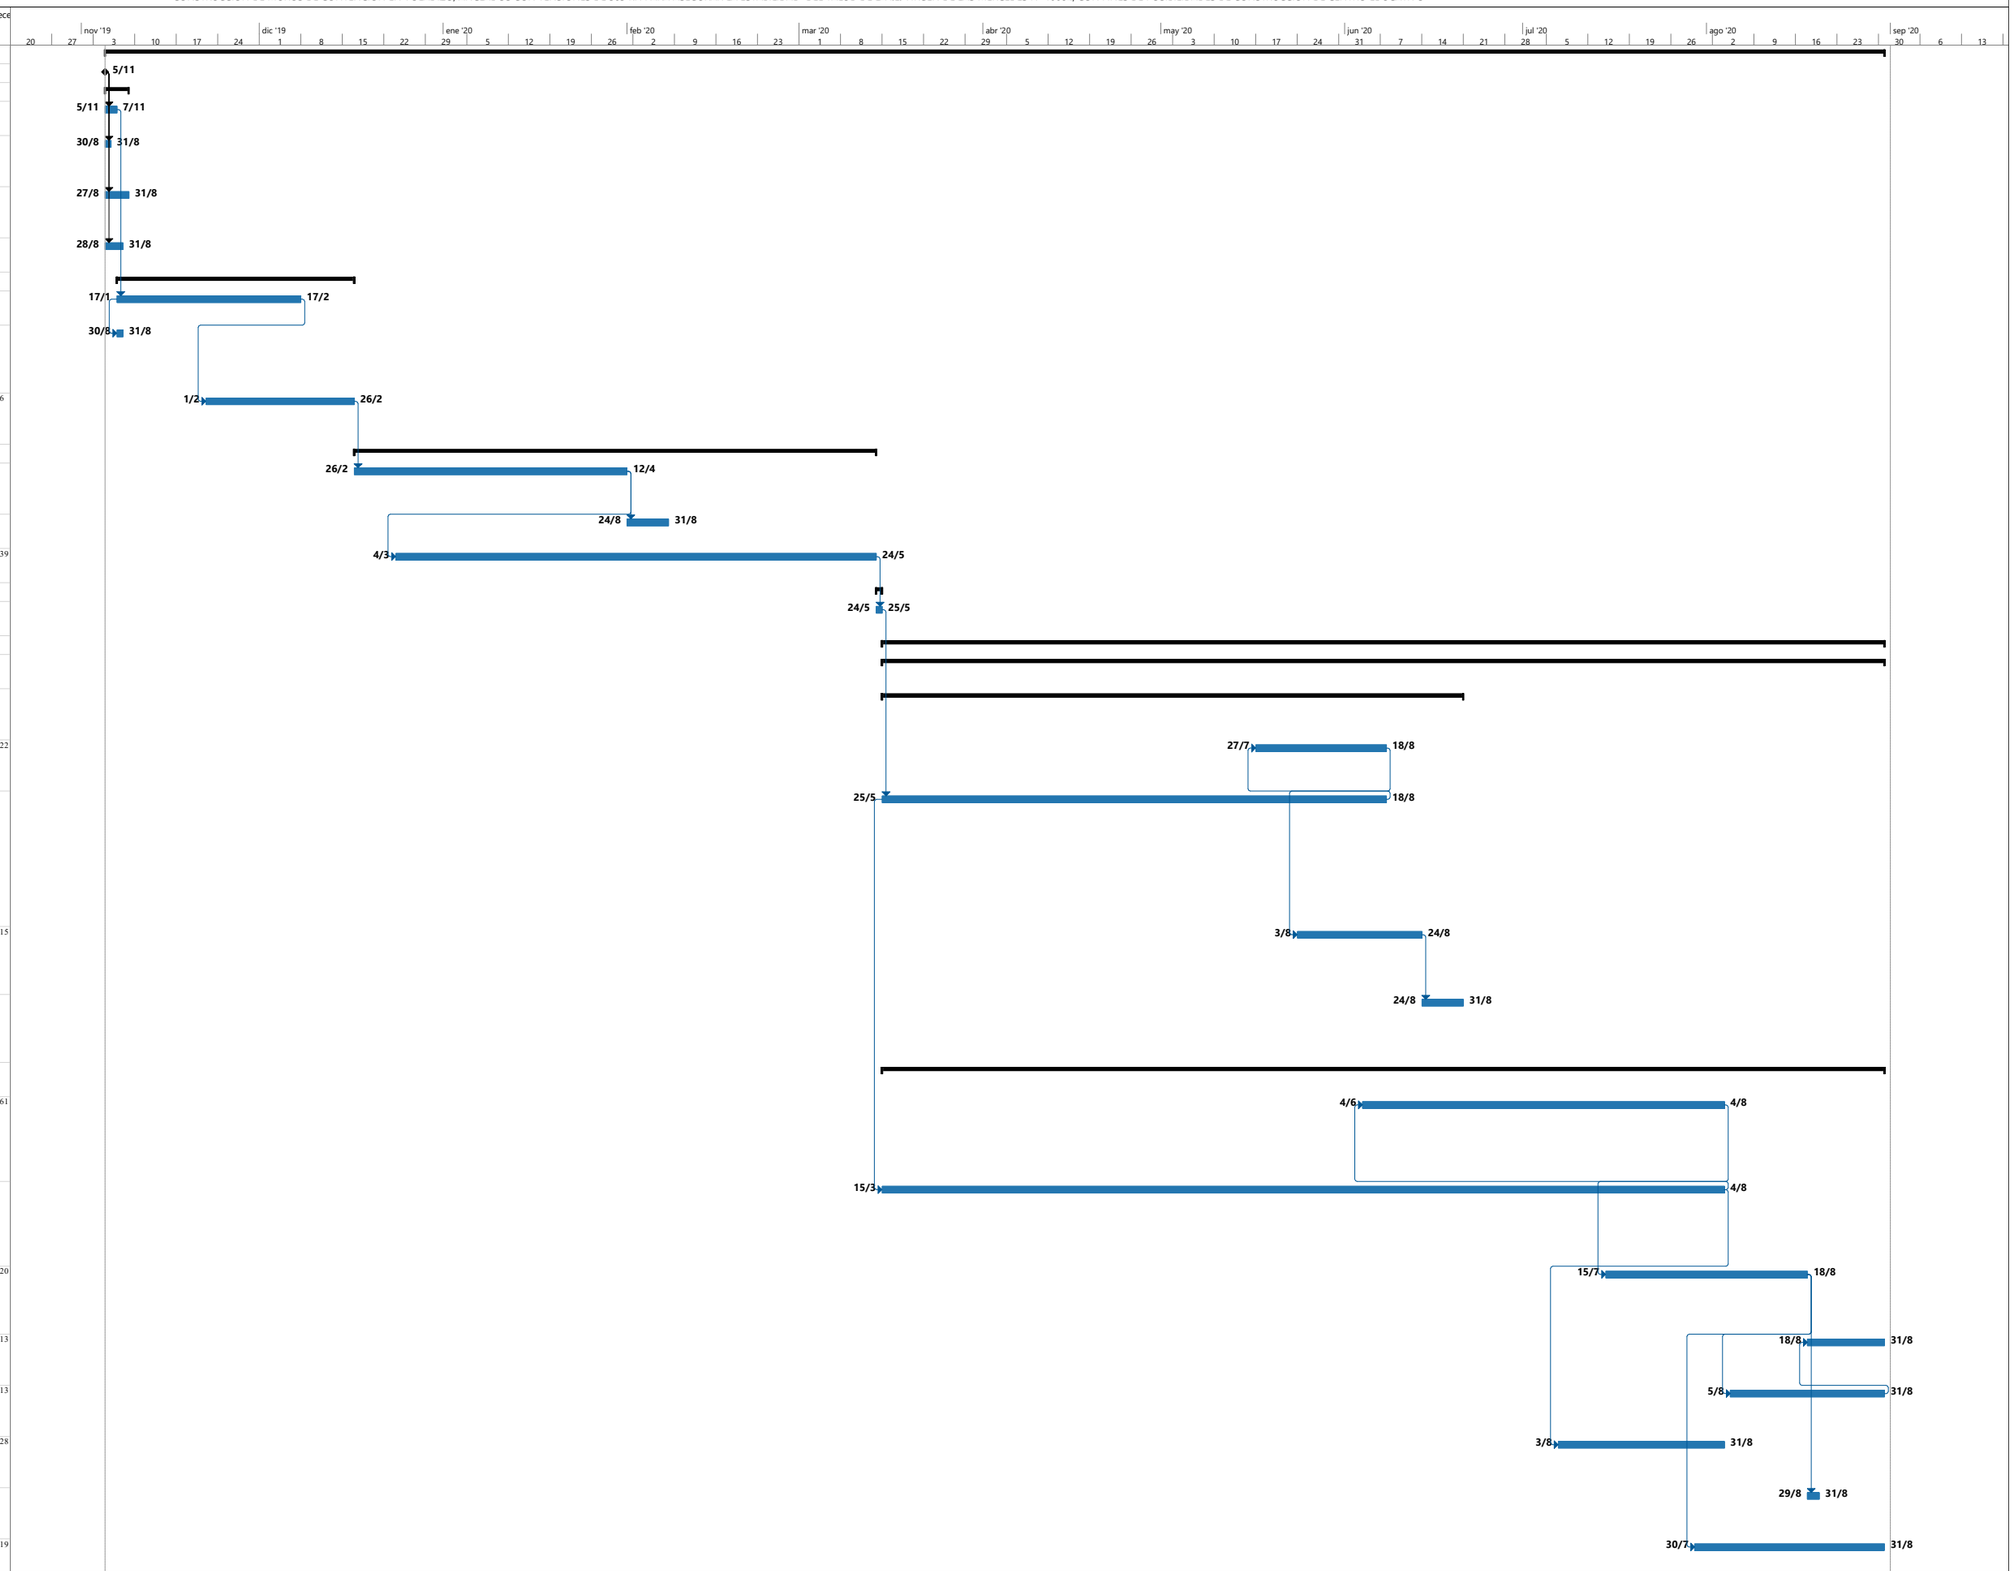

Proyecto: ALTERNATIVA 01
Fecha: mié 30/12/20

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Tarea resumida · Progreso resumido · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Fecha límite
División · Resumen · Agrupar por síntesis · Hito resumido · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Progreso
