














































Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21 J	S	11 ene '21 L	X	V	18 ene '21 D	M	J	S	25 ene '2 L	X
1		MODULO 1 (B1-B2)	128 días?	lun 11/01/21	vie 11/06/21											
2		OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	120 días?	lun 11/01/21	mié 02/06/21											
3		OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PRELIMINARES	120 días?	lun 11/01/21	mié 02/06/21											
4		CONSTRUCCIONES PROVINCIONALES	1 día?	mar 12/01/21	mar 12/01/21											
5		OFICINA DE OBRA	1 día?	mar 12/01/21	mar 12/01/21											
6		CASETA DE GUARDIANIA	1 día?	mar 12/01/21	mar 12/01/21											
7		CARTEL DE OBRA 7.2 x 3.6 m	1 día?	mar 12/01/21	mar 12/01/21											
8		CERCO PROVINCIONAL	1 día?	mar 12/01/21	mar 12/01/21											
9		SERVICIOS HIGIENICOS PROVINCIONALES	1 día?	mar 12/01/21	mar 12/01/21											
10		INSTALACIONES PROVINCIONALES	1 día?	mar 12/01/21	mar 12/01/21											
11		AGUA PARA LA CONSTRUCCION	1 día?	mar 12/01/21	mar 12/01/21											
12		ENERGIA ELECTRICA	1 día?	mar 12/01/21	mar 12/01/21											
13		CONEXIÓN A INTERNET	1 día?	mar 12/01/21	mar 12/01/21											
14		DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION	1 día?	mar 12/01/21	mar 12/01/21											
15		TRABAJOS PRELIMINARES	2 días?	lun 11/01/21	mar 12/01/21											
16		LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	1 día?	lun 11/01/21	lun 11/01/21											
17		TRAZO Y REPLANTEO	1 día?	mar 12/01/21	mar 12/01/21											
18		SALUD Y SEGURIDAD	120 días	lun 11/01/21	mié 02/06/21											
19		IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN D	120 días	lun 11/01/21	mié 02/06/21											
20		EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	120 días	lun 11/01/21	mié 02/06/21											
21		SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	120 días	lun 11/01/21	mié 02/06/21											
22		ESTRUCTURAS	120 días	lun 11/01/21	mié 02/06/21											
23		MOVIMIENTO DE TIERRAS	46 días	mié 13/01/21	sáb 06/03/21											
24		EXCAVACIONES	10 días	mié 13/01/21	sáb 23/01/21											




Proyecto: MODULO 1(bloque 1) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21 J	S	11 ene '21 L	X	V	D	18 ene '21 M	J	S	25 ene '2 L	X
25		EXCAVACIONES CON MAQUINARIA	5 días	mié 13/01/21	lun 18/01/21											
26		EXCAVACION MANUAL	7 días	sáb 16/01/21	sáb 23/01/21											
27		CORTE DE TERRENO NATURAL DE 15 cm	3 días	sáb 16/01/21	mar 19/01/21											
28		REFINE DEL TERRENO EXCAVACION	1 día	lun 18/01/21	lun 18/01/21											
29		RELLENOS	8 días	vie 26/02/21	sáb 06/03/21											
30		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	4 días	vie 26/02/21	mar 02/03/21											
31		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PREST	4 días	lun 01/03/21	jue 04/03/21											
32		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PREST	4 días	mié 03/03/21	sáb 06/03/21											
33		NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO	3 días	vie 22/01/21	lun 25/01/21											
34		NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO	3 días	vie 22/01/21	lun 25/01/21											
35		ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	4 días	sáb 23/01/21	mié 27/01/21											
36		ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	4 días	sáb 23/01/21	mié 27/01/21											
37		ELIMINACIÓN DE MATERIAL C/MAQUINA	4 días	sáb 23/01/21	mié 27/01/21											
38		OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	43 días	lun 18/01/21	lun 08/03/21											
39		CONCRETO PARA SOLADOS e=10 cm C:H 1:10	3 días	lun 18/01/21	mié 20/01/21											
40		CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G.	1 día	jue 25/02/21	jue 25/02/21											
41		CONCRETO PARA FALSOPISO C:H 1:8 e=10 cm	3 días	vie 05/03/21	lun 08/03/21											
42		OBRAS DE CONCRETO ARMADO	109 días	lun 18/01/21	jue 27/05/21											
43		ZAPATAS	26 días	mar 19/01/21	mié 17/02/21											
44		CONCRETO EN ZAPATAS f'c=280 kg/cm2	4 días	sáb 13/02/21	mié 17/02/21											
45		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS	5 días	mar 19/01/21	sáb 23/01/21											
46		VIGAS DE CONEXIÓN	18 días	vie 05/02/21	jue 25/02/21											
47		CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTAC	2 días	mié 24/02/21	jue 25/02/21											
48		ENCOFRADO PARA VIGAS DE CONEXIÓN	9 días	mar 16/02/21	jue 25/02/21											

Proyecto: MODULO 1(bloque 1) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	






















Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21 J	S	11 ene '21 L X V	18 ene '21 D M	25 ene '21 J S L X
49		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CON	10 días	vie 05/02/21	mar 16/02/21					
50		SOBRECIMENTOS REFORZADOS	34 días	mié 24/02/21	mar 06/04/21					
51		CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO f'c=175 kg/cm2	2 días	lun 05/04/21	mar 06/04/21					
52		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIEN	7 días	sáb 27/03/21	mar 06/04/21					
53		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en SOBRECIMIEN	2 días	mié 24/02/21	jue 25/02/21					
54		COLUMNAS	59 días	jue 21/01/21	mar 30/03/21					
55		CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	7 días	mar 23/03/21	mar 30/03/21					
56		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLL	26 días	vie 26/02/21	sáb 27/03/21					
57		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS	20 días	jue 21/01/21	vie 12/02/21					
58		VIGAS	28 días	lun 12/04/21	vie 14/05/21					
59		CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	2 días	jue 13/05/21	vie 14/05/21					
60		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA	16 días	lun 12/04/21	jue 29/04/21					
61		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS	12 días	vie 16/04/21	jue 29/04/21					
62		LOSAS ALIGERADAS	22 días	lun 19/04/21	vie 14/05/21					
63		CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2	2 días	jue 13/05/21	vie 14/05/21					
64		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA	17 días	lun 19/04/21	sáb 08/05/21					
65		LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECH	3 días	jue 06/05/21	sáb 08/05/21					
66		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGER	7 días	vie 07/05/21	vie 14/05/21					
67		COLUMNETAS	65 días	lun 22/02/21	mar 11/05/21					
68		CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2	1 día	mar 11/05/21	mar 11/05/21					
69		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLL	8 días	lun 03/05/21	mar 11/05/21					
70		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNETAS	3 días	lun 22/02/21	mié 24/02/21					
71		VIGA DE CONFINAMIENTO	3 días	lun 03/05/21	mié 05/05/21					
72		CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO f'c=175	1 día	mié 05/05/21	mié 05/05/21					



Proyecto: MODULO 1(bloque 1) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





















Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21		11 ene '21			18 ene '21				25 ene '21		
						J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	
73		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA	3 días	lun 03/05/21	mié 05/05/21												
74		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CON	2 días	lun 03/05/21	mar 04/05/21												
75		ESCALERAS	5 días	sáb 22/05/21	jue 27/05/21												
76		CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2	1 día	jue 27/05/21	jue 27/05/21												
77		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCA	3 días	sáb 22/05/21	mar 25/05/21												
78		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS	2 días	mar 25/05/21	mié 26/05/21												
79		LOSAS MACIZAS	6 días	sáb 15/05/21	vie 21/05/21												
80		CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2	1 día	vie 21/05/21	vie 21/05/21												
81		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA	5 días	sáb 15/05/21	jue 20/05/21												
82		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS MACIZ	2 días	mié 19/05/21	jue 20/05/21												
83		CISTERNA	5 días	lun 18/01/21	vie 22/01/21												
84		CONCRETO EN CISTERNA f'c=280 kg/cm2	2 días	jue 21/01/21	vie 22/01/21												
85		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTI	2 días	mar 19/01/21	mié 20/01/21												
86		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en CISTERNA	3 días	lun 18/01/21	mié 20/01/21												
87		ASCENSOR Y MONTACARGA	4 días	lun 18/01/21	jue 21/01/21												
88		CONCRETO PARA MUROS ASCENSOR Y MONTACAI	1 día	jue 21/01/21	jue 21/01/21												
89		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE	3 días	mar 19/01/21	jue 21/01/21												
90		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ASCENSOR Y I	3 días	lun 18/01/21	mié 20/01/21												
91		VARIOS	120 días	lun 11/01/21	mié 02/06/21												
92		MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL	120 días	lun 11/01/21	mié 02/06/21												
93		ARQUITECTURA	80 días?	lun 08/03/21	vie 11/06/21												
94		ALBAÑILERIA	26 días?	mar 06/04/21	jue 06/05/21												
95		MURO DE LADRILLO DE ARCILLA 18 H (09x13x24) AMAF	26 días	mar 06/04/21	jue 06/05/21												
96		MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H (09x013x0.24) AM	1 día?	mar 06/04/21	mar 06/04/21												

Proyecto: MODULO 1(bloque 1 Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	






















Id	i	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21		11 ene '21			18 ene '21			25 ene '2		
						J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X
97		REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	26 días	lun 03/05/21	mar 01/06/21											
98		TARRAJEO DE MUROS INTERIORES	14 días	lun 03/05/21	mar 18/05/21											
99		TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES	13 días	lun 03/05/21	lun 17/05/21											
100		TARRAJEO COLUMNAS	26 días	lun 03/05/21	mar 01/06/21											
101		TARRAJEO DE VIGAS	14 días	lun 03/05/21	mar 18/05/21											
102		TARRAJEO FONDO DE ESCALERAS	2 días	lun 03/05/21	mar 04/05/21											
103		PREPARACION DE GRADAS DE ESCALERA DE CONCR	2 días	lun 03/05/21	mar 04/05/21											
104		PREPARACION DE DESCANZO DE ESCALERA C:A 1:8 e	1 día	lun 03/05/21	lun 03/05/21											
105		CIELORRASOS	20 días	sáb 15/05/21	lun 07/06/21											
106		TARRAJEO CIELO RASO	20 días	sáb 15/05/21	lun 07/06/21											
107		PISOS Y PAVIMENTOS	5 días	lun 08/03/21	vie 12/03/21											
108		CONTRAPISOS	3 días	lun 08/03/21	mié 10/03/21											
109		CONTRAPISO DE 5 cm	3 días	lun 08/03/21	mié 10/03/21											
110		PISOS	3 días	mié 10/03/21	vie 12/03/21											
111		PISO DE CEMENTO PULIDO	3 días	mié 10/03/21	vie 12/03/21											
112		CARPINTERIA DE MADERA	2 días	mar 08/06/21	mié 09/06/21											
113		Puertas	2 días	mar 08/06/21	mié 09/06/21											
114		PUERTA P1 1.00 x 2.1 m.	2 días	mar 08/06/21	mié 09/06/21											
115		PUERTA P2 0.75 x 2.1 m	2 días	mar 08/06/21	mié 09/06/21											
116		PUERTA P4 1.25 x 2.1 m	2 días	mar 08/06/21	mié 09/06/21											
117		CARPINTERIA METALICA	9 días	mié 02/06/21	vie 11/06/21											
118		PUERTA METALICA DOS HOJAS PIVOTANTE CON PLAN	1 día	mié 09/06/21	mié 09/06/21											
119		BARANDAS METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 "	2 días	mié 09/06/21	jue 10/06/21											
120		PUERTAS ENROLLABLES DE FIERRO	9 días	mié 02/06/21	vie 11/06/21											














Proyecto: MODULO 1(bloque 1 Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





















Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21		11 ene '21			18 ene '21			25 ene '2		
						J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X
121		CERRAJERIA	1 día?	mar 08/06/21	mar 08/06/21											
122		BISAGRA 3.5" X 3.5"	1 día?	mar 08/06/21	mar 08/06/21											
123		CERRADURA 3 GOLPES	1 día?	mar 08/06/21	mar 08/06/21											
124		MANIJA PARA PUERTA DE BRONCE	1 día?	mar 08/06/21	mar 08/06/21											
125		PINTURAS	9 días	mar 01/06/21	jue 10/06/21											
126		PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	8 días	mar 01/06/21	mié 09/06/21											
127		PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	8 días	mar 01/06/21	mié 09/06/21											
128		PINTURA LATEX A 2 MANOS COLUMNAS	9 días	mar 01/06/21	jue 10/06/21											
129		PINTURA LATEX A 2 MANOS VIGAS	5 días	mar 01/06/21	sáb 05/06/21											
130		PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS	9 días	mar 01/06/21	jue 10/06/21											
131		OTROS	1 día?	mié 09/06/21	mié 09/06/21											
132		CONTENEDORES DE BASURA 120 L	1 día?	mié 09/06/21	mié 09/06/21											
133		KIT PUNTO ECOLOGICO 3 CUERPOS	1 día?	mié 09/06/21	mié 09/06/21											
134		INSTALACIONES SANITARIAS	49 días?	lun 11/01/21	lun 08/03/21											
135		SISTEMA DE AGUA FRIA	41 días?	lun 18/01/21	vie 05/03/21											
136		RED DE DISTRIBUCION	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
137		TUBERIA DE SUCCION 2"	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
138		TUBERIA DE IMPULSION 1 1/2"	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
139		ACCESORIOS DE REDES	41 días?	lun 18/01/21	vie 05/03/21											
140		CODO 90° PVC 3/4"	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
141		CODO 90° PVC 1 1/2"	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
142		CODO 90° PVC 2"	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
143		ELECTROBOMBA 1 HP	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
144		ELECTROBOMBA 20 HP CONTRA INCENDIO	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											


Proyecto: MODULO 1(bloque 1 Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





















Id	i	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21		11 ene '21			18 ene '21			25 ene '2		
						J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X
145		ELECTROBOMBA JOCKEY Q=1LPS ADT=102MCA 2H	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
146		BRIDA ROMPE AGUA	1 día?	lun 18/01/21	lun 18/01/21											
147		VALVULAS	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
148		VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
149		VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2"	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
150		SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	2 días?	lun 11/01/21	mar 12/01/21											
151		SALIDA DE DRENAJE PLUVIAL PVC-SAL 2"	2 días	lun 11/01/21	mar 12/01/21											
152		TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL PVC - SAL DE 2"	2 días	lun 11/01/21	mar 12/01/21											
153		SUMIDERO DE BRONCE 3"	1 día?	lun 11/01/21	lun 11/01/21											
154		RED DE DESAGUE	2 días?	vie 05/03/21	sáb 06/03/21											
155		RED DE DERIVACION	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
156		TUBERIA PARA DESAGUE PVC - SAL DE 4"	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
157		ACCESORIOS DE REDES	2 días?	vie 05/03/21	sáb 06/03/21											
158		YEE PVC 4" a 2"	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
159		CODOS 45° PVC 4"	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
160		CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" con reg	2 días	vie 05/03/21	sáb 06/03/21											
161		SISTEMA CONTRA INCENDIO	40 días?	jue 21/01/21	lun 08/03/21											
162		TUBERIAS	3 días?	vie 05/03/21	lun 08/03/21											
163		TUBERIA 6" POLIETILENO	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
164		TUBERIA 2 1/2" ACERO SCH 40	3 días	vie 05/03/21	lun 08/03/21											
165		TUBERIA 4" POLIETILENO	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
166		VARIOS	2 días?	vie 05/03/21	sáb 06/03/21											
167		VALVULA 6" LISTADA	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											
168		UNION SIAMESA TIPO POSTE DOS BOCAS 4"X2 1/2"	1 día?	vie 05/03/21	vie 05/03/21											


Proyecto: MODULO 1(bloque 1 Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





















Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21		11 ene '21			18 ene '21			25 ene '2		
						J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X
169		GABINETE CONTRA INCENDIO	2 días	vie 05/03/21	sáb 06/03/21											
170		CISTERNA ACI	1 día?	jue 21/01/21	jue 21/01/21											
171		TUBERIA 6" F°G°	1 día?	jue 21/01/21	jue 21/01/21											
172		TUBERIA 6" ACERO SCH	1 día?	jue 21/01/21	jue 21/01/21											
173		TUBERIA 4" F°G°	1 día?	jue 21/01/21	jue 21/01/21											
174		TUBERIA 2 1/2" ACERO SCH	1 día?	jue 21/01/21	jue 21/01/21											
175		TUBERIA 2" ACERO SCH	1 día?	jue 21/01/21	jue 21/01/21											
176		TUBERIA 2" F°G°	1 día?	jue 21/01/21	jue 21/01/21											
177		VALVULA 6" LISTADA	1 día?	jue 21/01/21	jue 21/01/21											
178		VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"	1 día?	jue 21/01/21	jue 21/01/21											
179		VALVULA MARIPOSA 6" LISTADA	1 día?	jue 21/01/21	jue 21/01/21											
180		VALVULA DE ALIVIO 2 1/2"	1 día?	jue 21/01/21	jue 21/01/21											
181		VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 2"	1 día?	jue 21/01/21	jue 21/01/21											
182		PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS	1 día?	lun 08/03/21	lun 08/03/21											
183		PRUEBA HIDRAULICA	1 día?	lun 08/03/21	lun 08/03/21											
184		INSTALACIONES ELECTRICAS	32 días?	lun 03/05/21	mar 08/06/21											
185		SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA	32 días?	lun 03/05/21	mar 08/06/21											
186		SALIDAS	4 días	jue 06/05/21	lun 10/05/21											
187		SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	4 días	jue 06/05/21	lun 10/05/21											
188		SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	3 días	jue 06/05/21	sáb 08/05/21											
189		SALIDA INTERRUPTOR COMNUTACION	1 día	jue 06/05/21	jue 06/05/21											
190		SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA	2 días	jue 06/05/21	vie 07/05/21											
191		SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIE	4 días	jue 06/05/21	lun 10/05/21											
192		SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO Y TEMPERA	2 días	jue 06/05/21	vie 07/05/21											


Proyecto: MODULO 1(bloque 1) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21		11 ene '21			18 ene '21			25 ene '21		
						J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X
193		SALIDA PARA ESTACION MANUAL	1 día	jue 06/05/21	jue 06/05/21											
194		CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS	5 días	jue 06/05/21	mar 11/05/21											
195		TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm	5 días	jue 06/05/21	mar 11/05/21											
196		TUBERIA TIPO CONDUIT 20 mm (SENSORES DE HUM)	2 días	jue 06/05/21	vie 07/05/21											
197		TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm	1 día	jue 06/05/21	jue 06/05/21											
198		CABLES	2 días	sáb 15/05/21	lun 17/05/21											
199		CABLE TW 2.5 mm2	2 días	sáb 15/05/21	lun 17/05/21											
200		CABLE TW 4 mm2	1 día	sáb 15/05/21	sáb 15/05/21											
201		CABLE TW 10 mm2	1 día	sáb 15/05/21	sáb 15/05/21											
202		CAJAS	1 día?	jue 06/05/21	jue 06/05/21											
203		CAJA DE PASE CUADRADA 100 x 100 x 100 mm	1 día?	jue 06/05/21	jue 06/05/21											
204		TABLEROS ELECTRICOS	3 días	lun 03/05/21	mié 05/05/21											
205		TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN	1 día	lun 03/05/21	lun 03/05/21											
206		TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIOÓN	1 día	lun 03/05/21	lun 03/05/21											
207		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	3 días	lun 03/05/21	mié 05/05/21											
208		TABLERO DE DISTRIBUCION EMPOTRADO	3 días	lun 03/05/21	mié 05/05/21											
209		SISTEMA DE TIERRA	2 días	lun 03/05/21	mar 04/05/21											
210		POZO A TIERRA	2 días	lun 03/05/21	mar 04/05/21											
211		ARTEFACTOS DE ALUMBRADO	3 días	sáb 05/06/21	mar 08/06/21											
212		ARTEFACTO TIPO PHILIPS FOCO LED BULBO A60 7.	3 días	sáb 05/06/21	mar 08/06/21											
213		EQUIPO DOWNLIGHT REDONDO 24w	2 días	sáb 05/06/21	lun 07/06/21											
214		LUZ DE EMERGENCIA	1 día	sáb 05/06/21	sáb 05/06/21											
215		INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS Y ESPECIALES	1 día	jue 06/05/21	jue 06/05/21											
216		ELECTROBOMBA 1 HP	1 día	jue 06/05/21	jue 06/05/21											

Proyecto: MODULO 1(bloque 1 Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	21		11 ene '21			18 ene '21			25 ene '21		
						J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X
217		SISTEMA CONTRA INCENDIO	2 días	sáb 05/06/21	lun 07/06/21											
218		CENTRAL DE ALARMA CONGRA INCENDIO	1 día	sáb 05/06/21	sáb 05/06/21											
219		DETECTORES DE HUMO	2 días	sáb 05/06/21	lun 07/06/21											
220		ESTACION MANUAL CONTRA INCENDIO	1 día	sáb 05/06/21	sáb 05/06/21											
221		SIRENA DE ALARMA CONTRA INCENDIO	1 día	sáb 05/06/21	sáb 05/06/21											
222		ASCENSOR Y MONTACARGA	10 días	jue 06/05/21	lun 17/05/21											
223		ASCENSORES (suministro - colocación)	10 días	jue 06/05/21	lun 17/05/21											
224		MONTACARGA (suministro-instalación)	10 días	jue 06/05/21	lun 17/05/21											



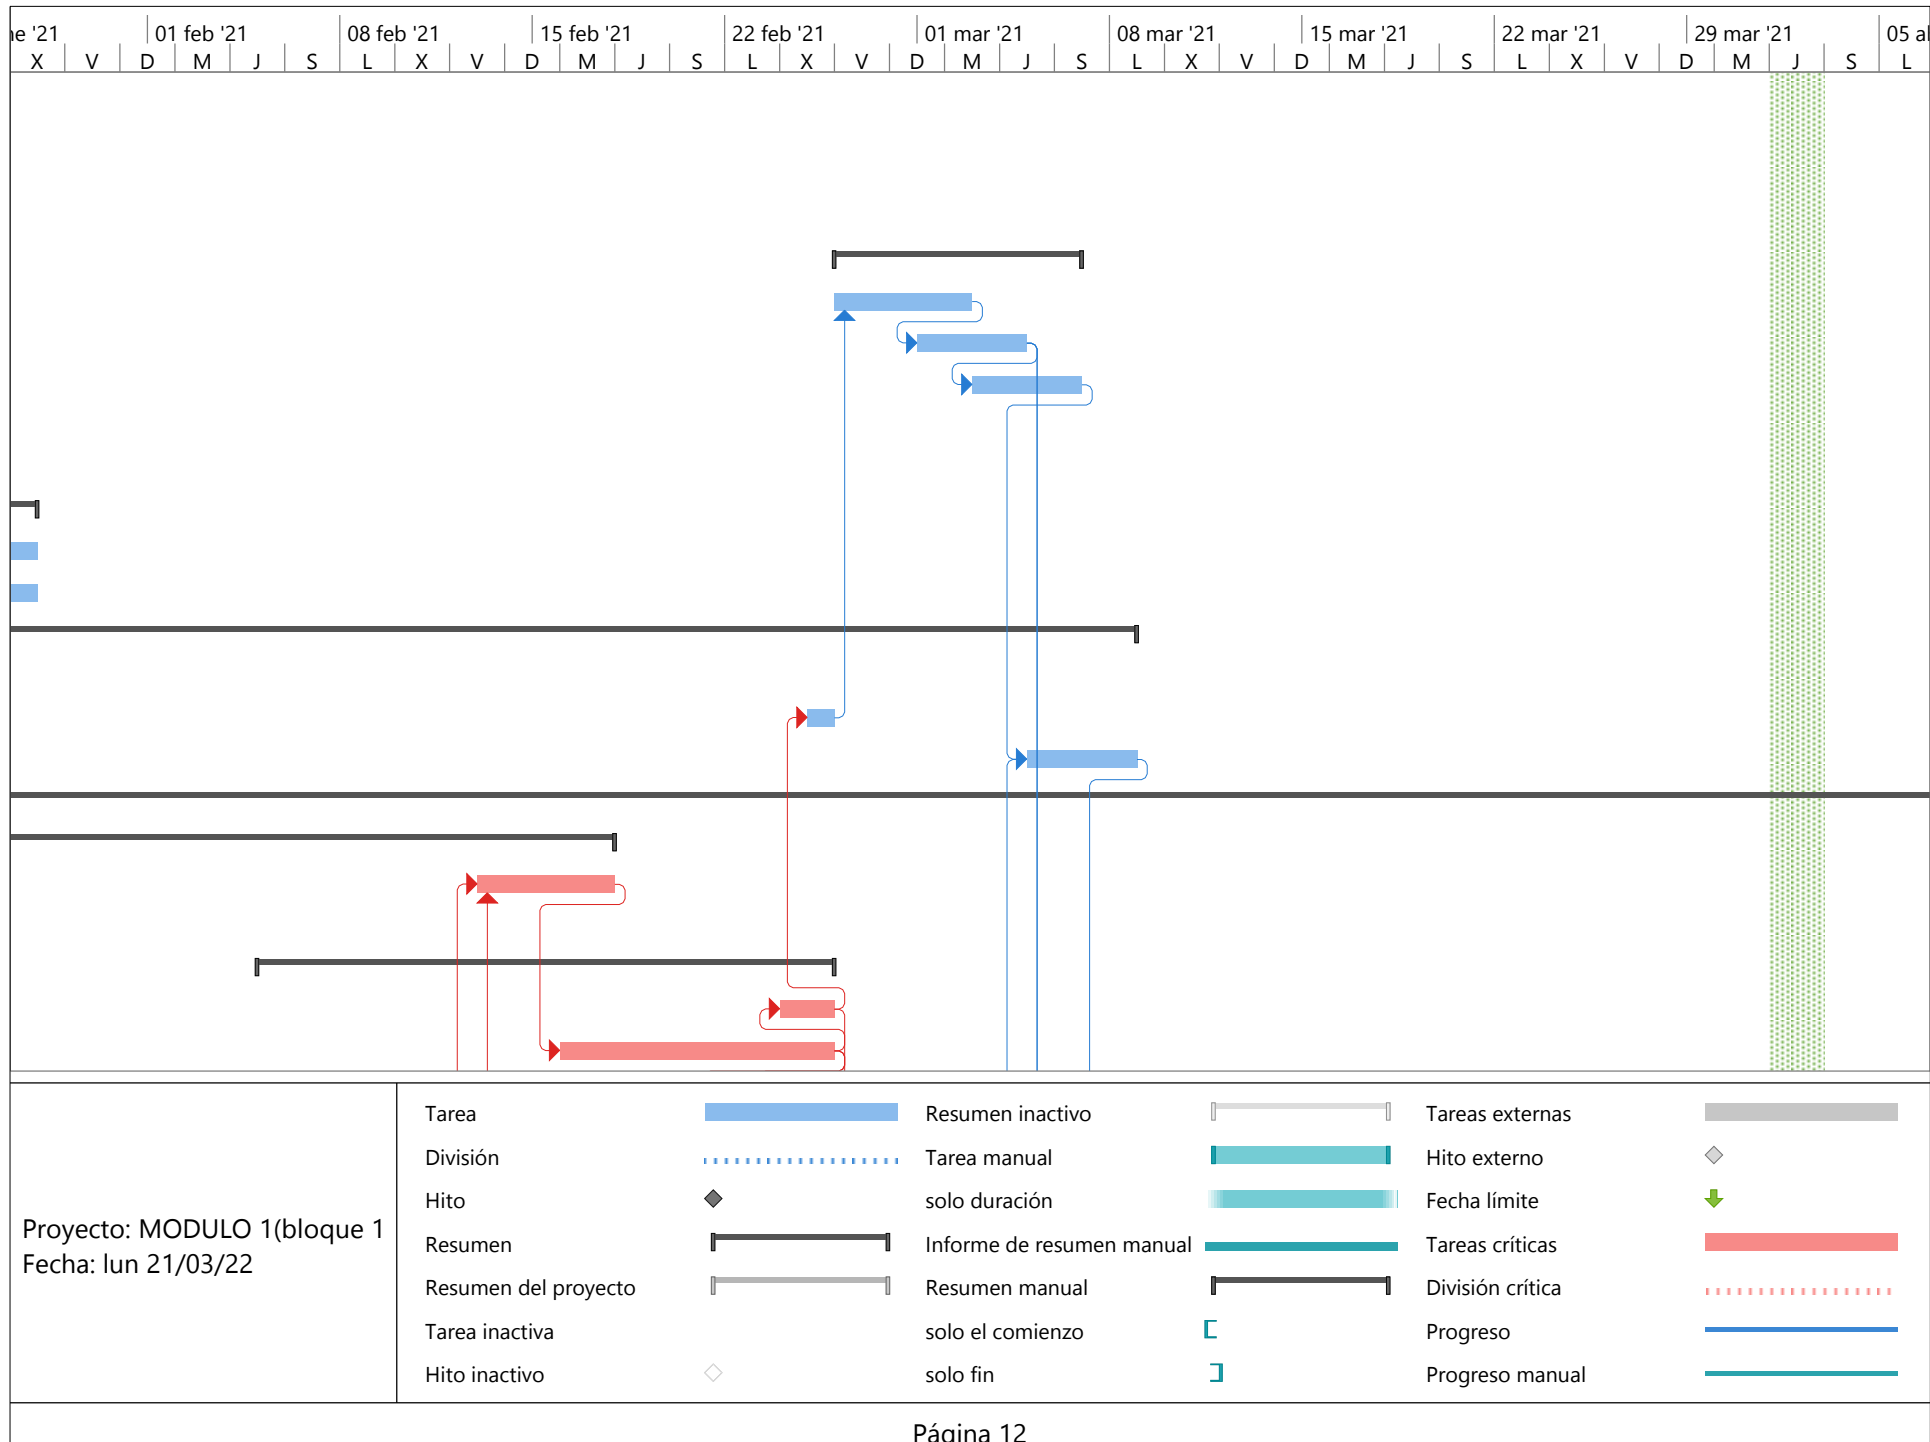

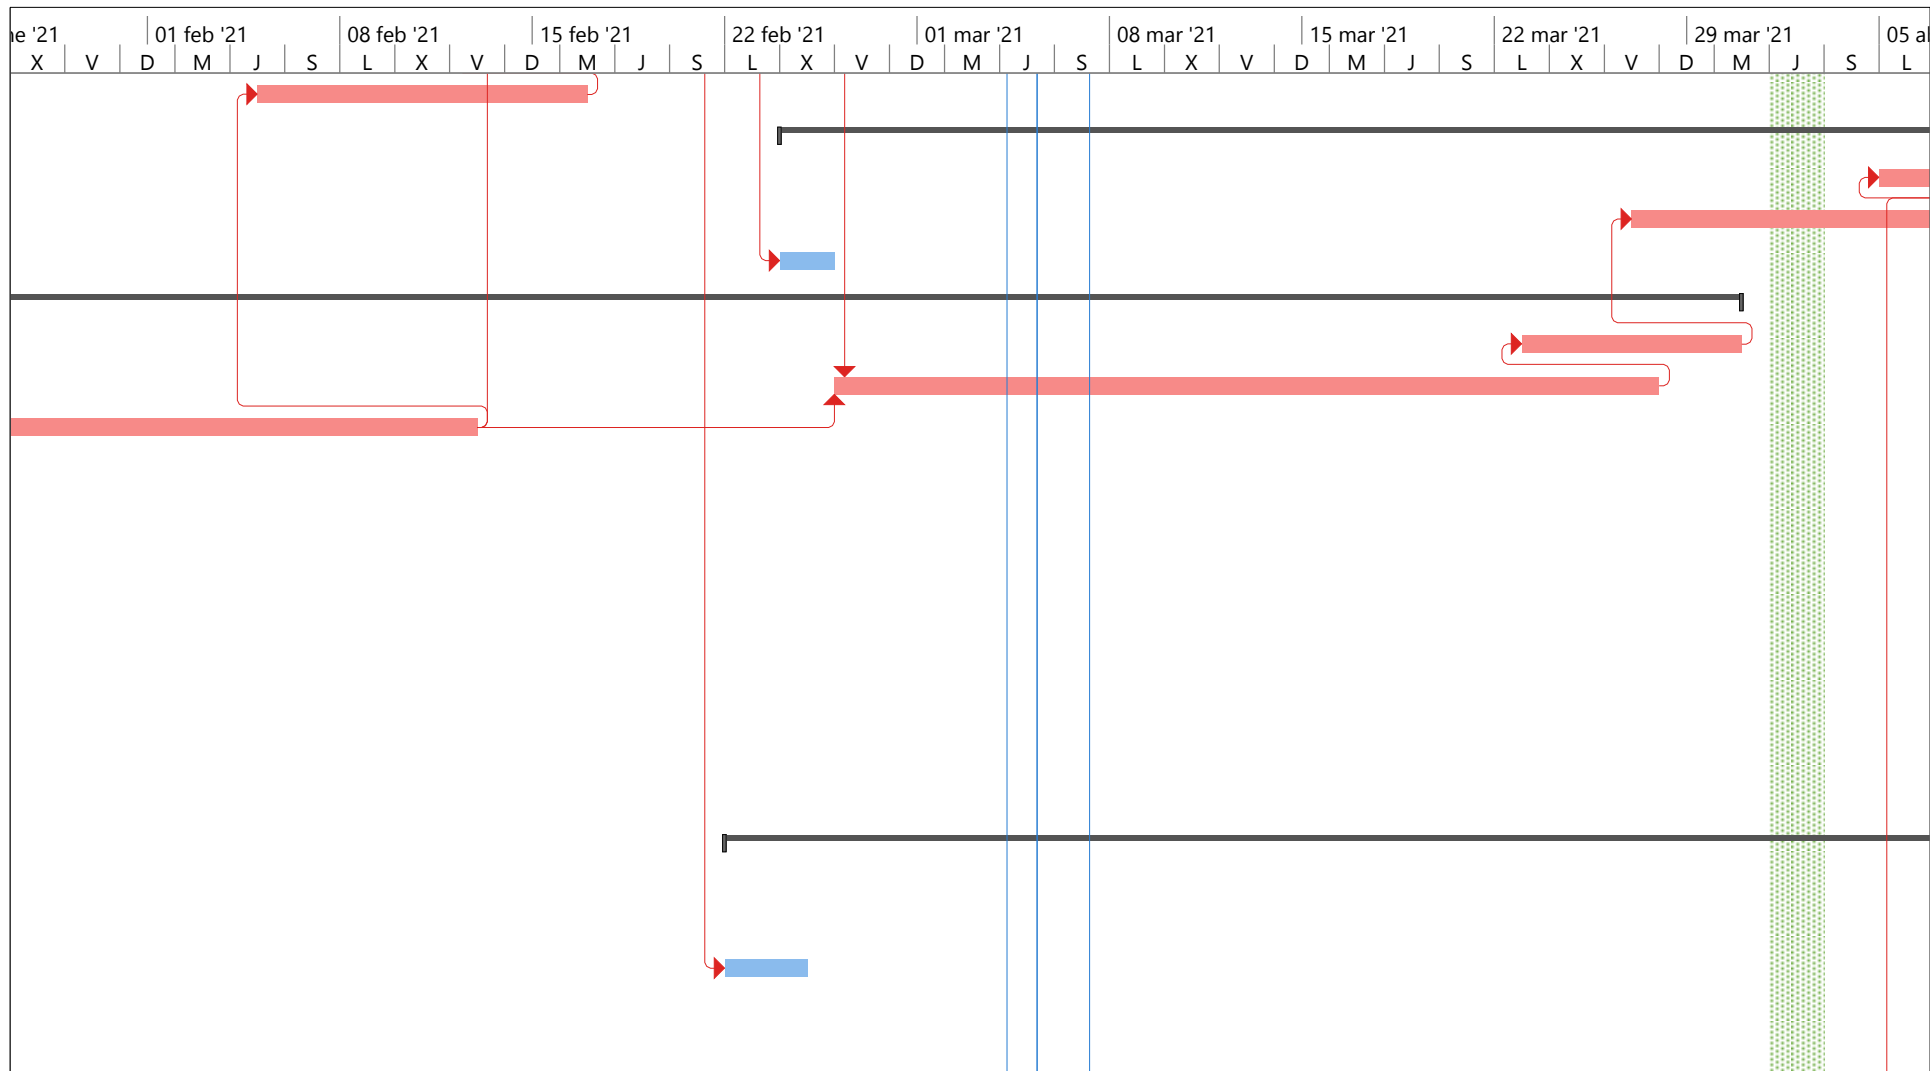



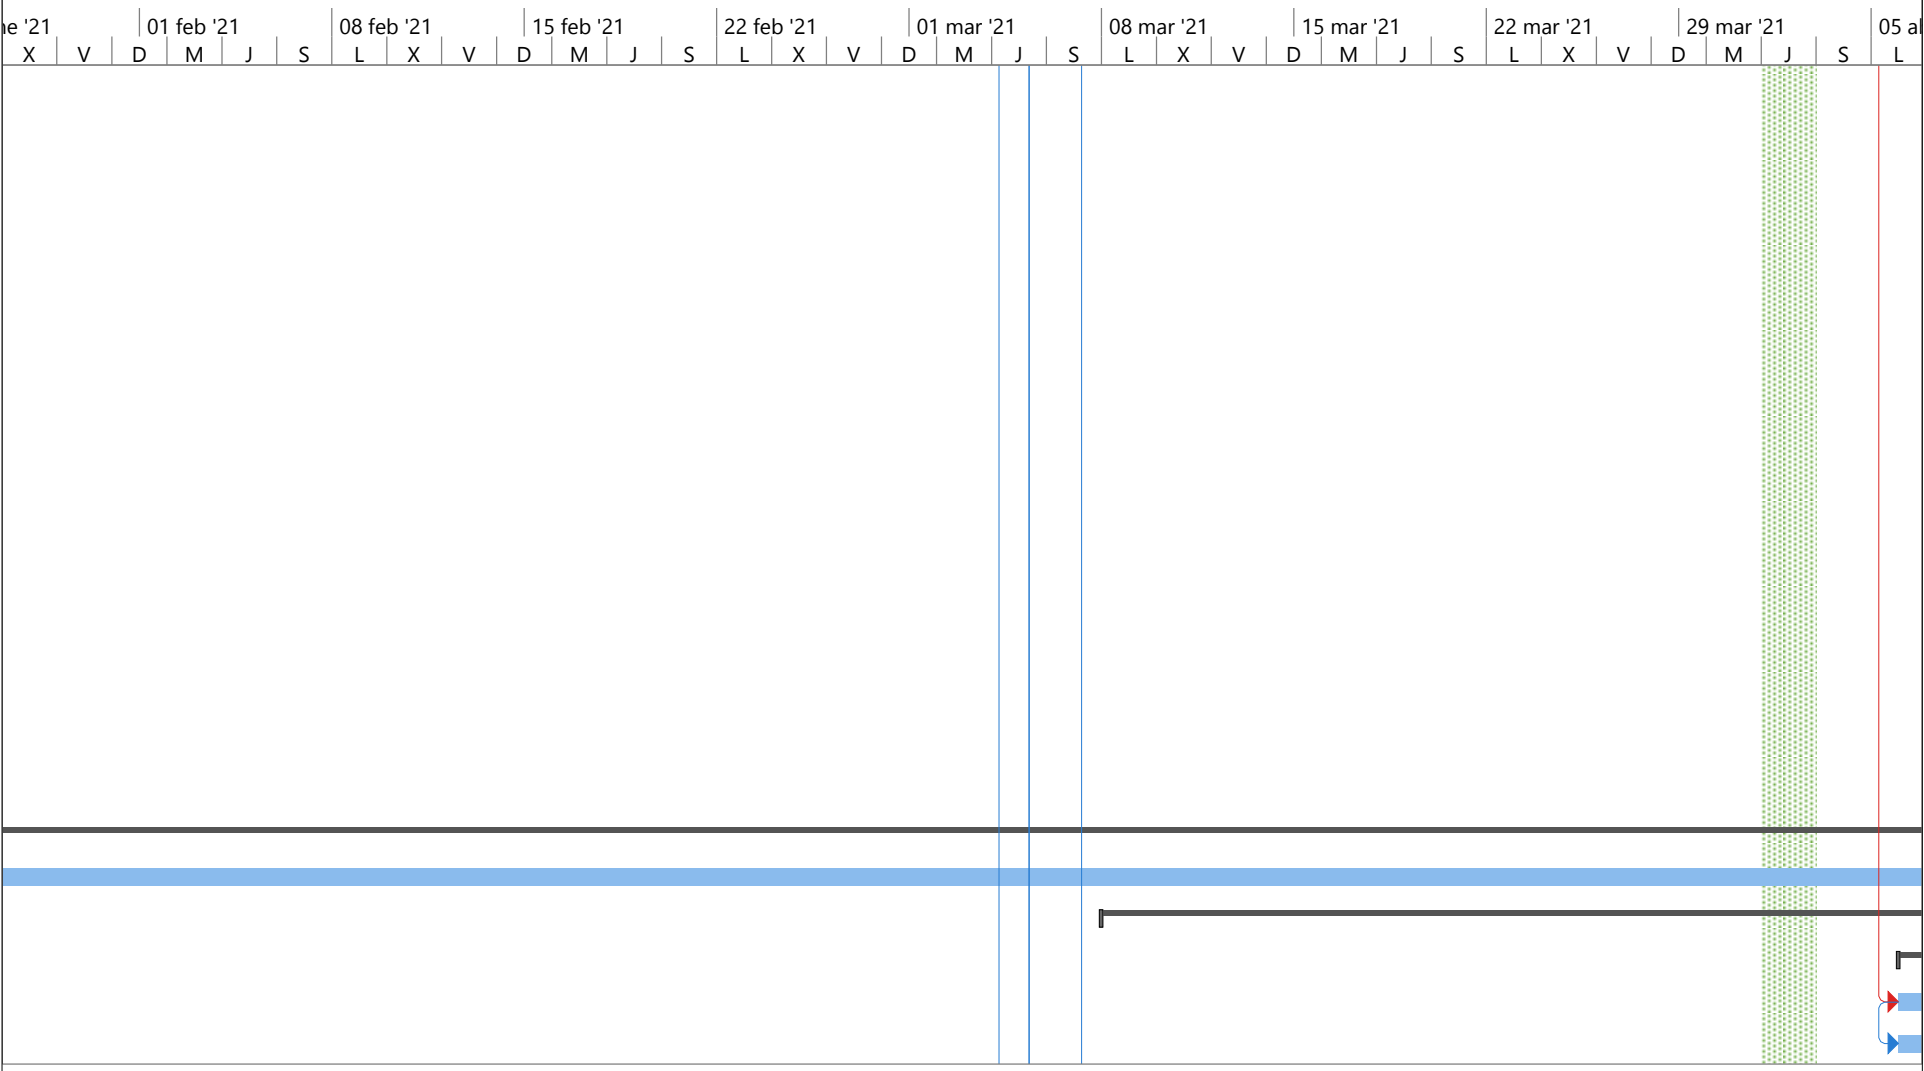












Proyecto: MODULO 1(bloque 1) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	








Proyecto: MODULO 1(bloque 1) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





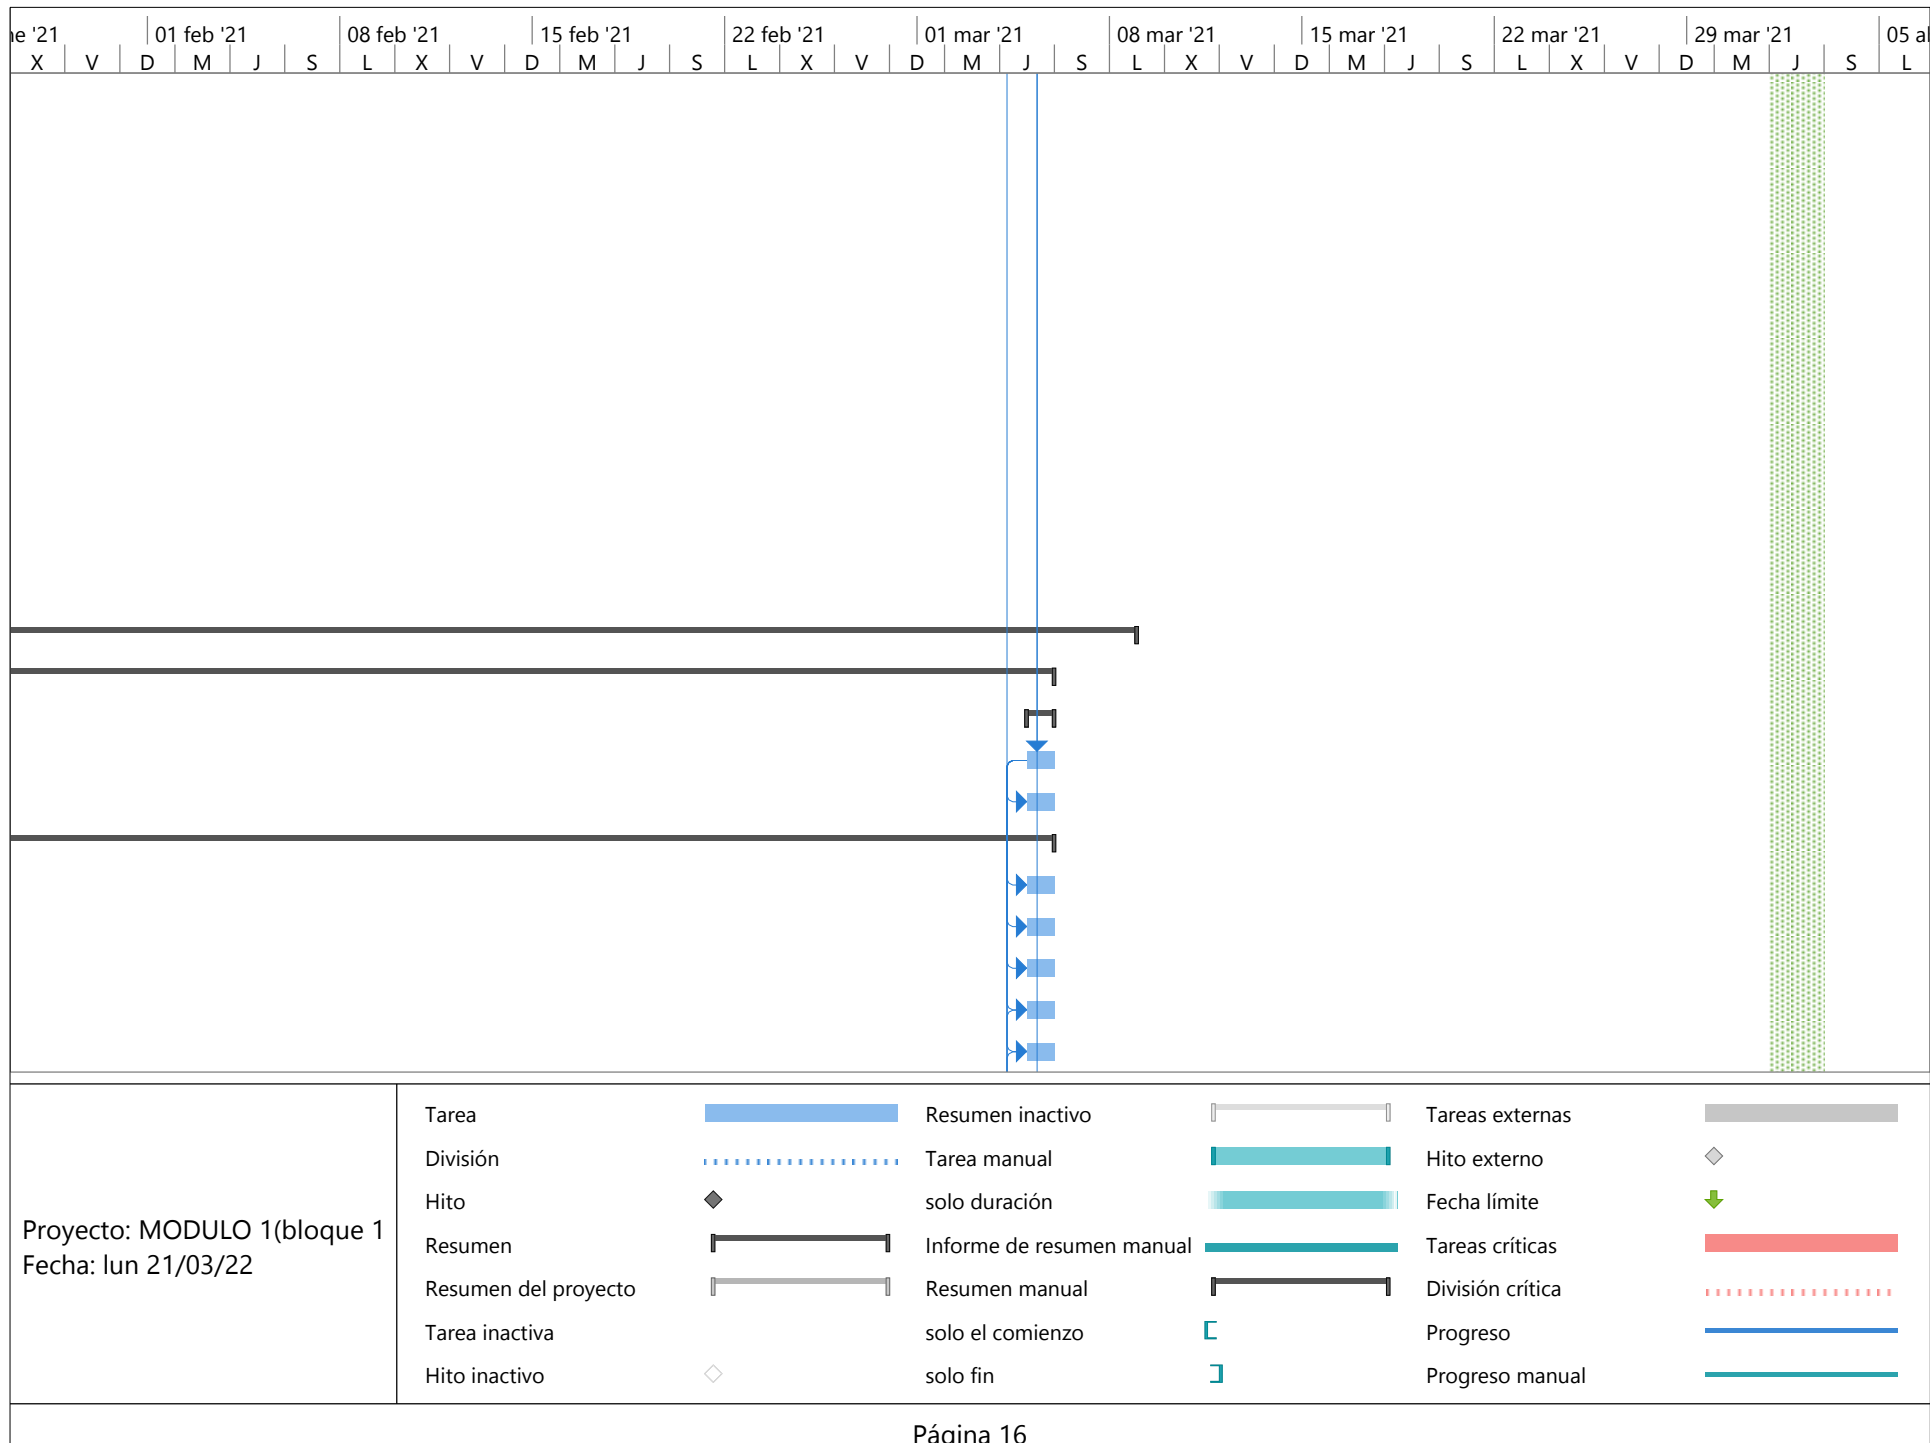

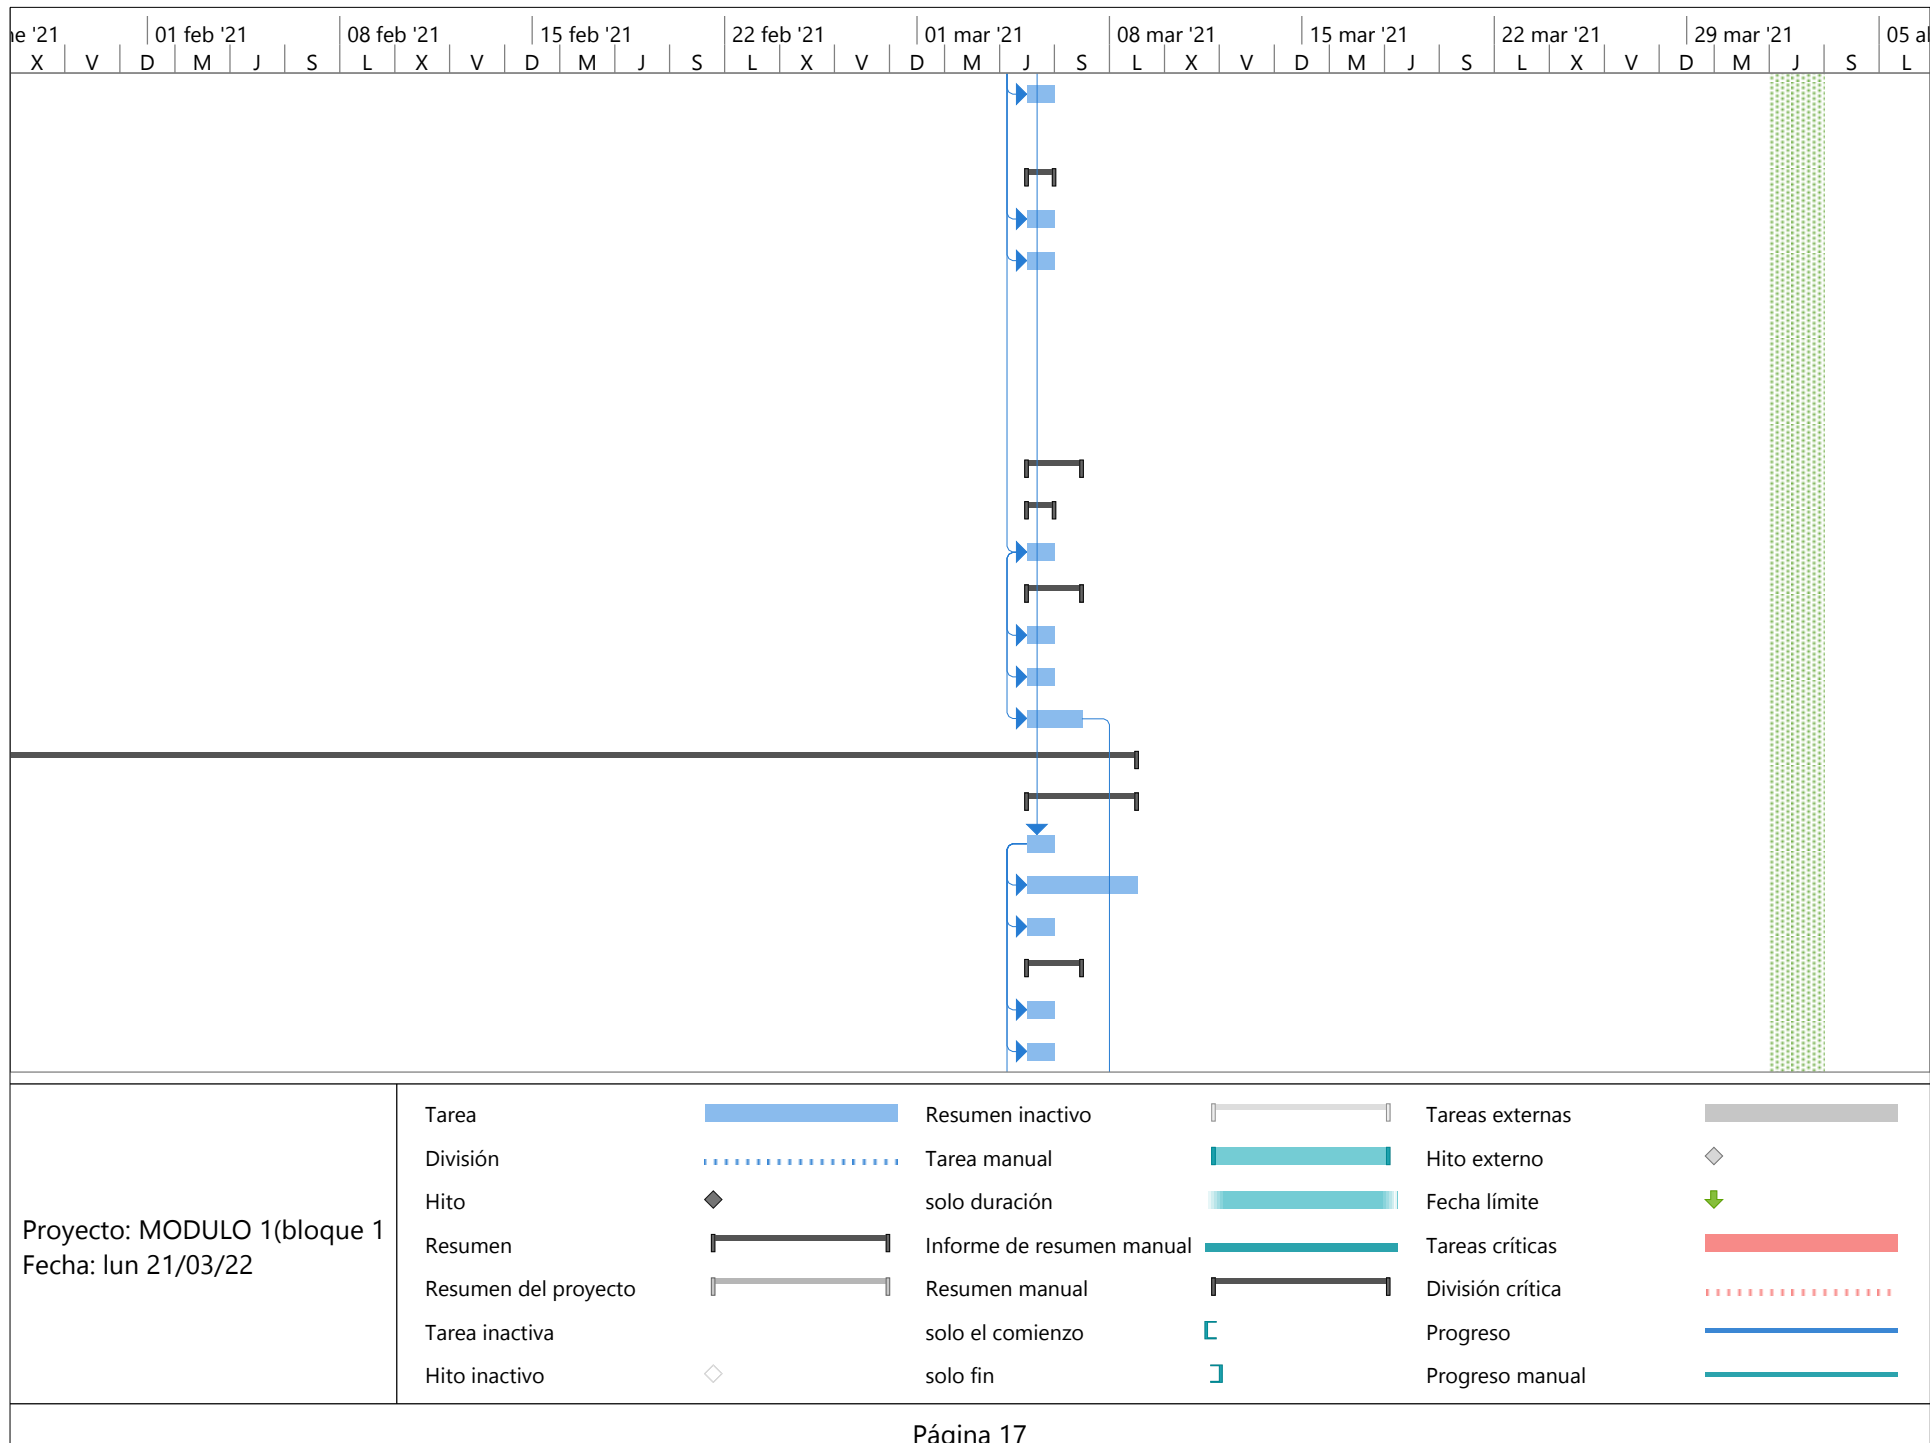

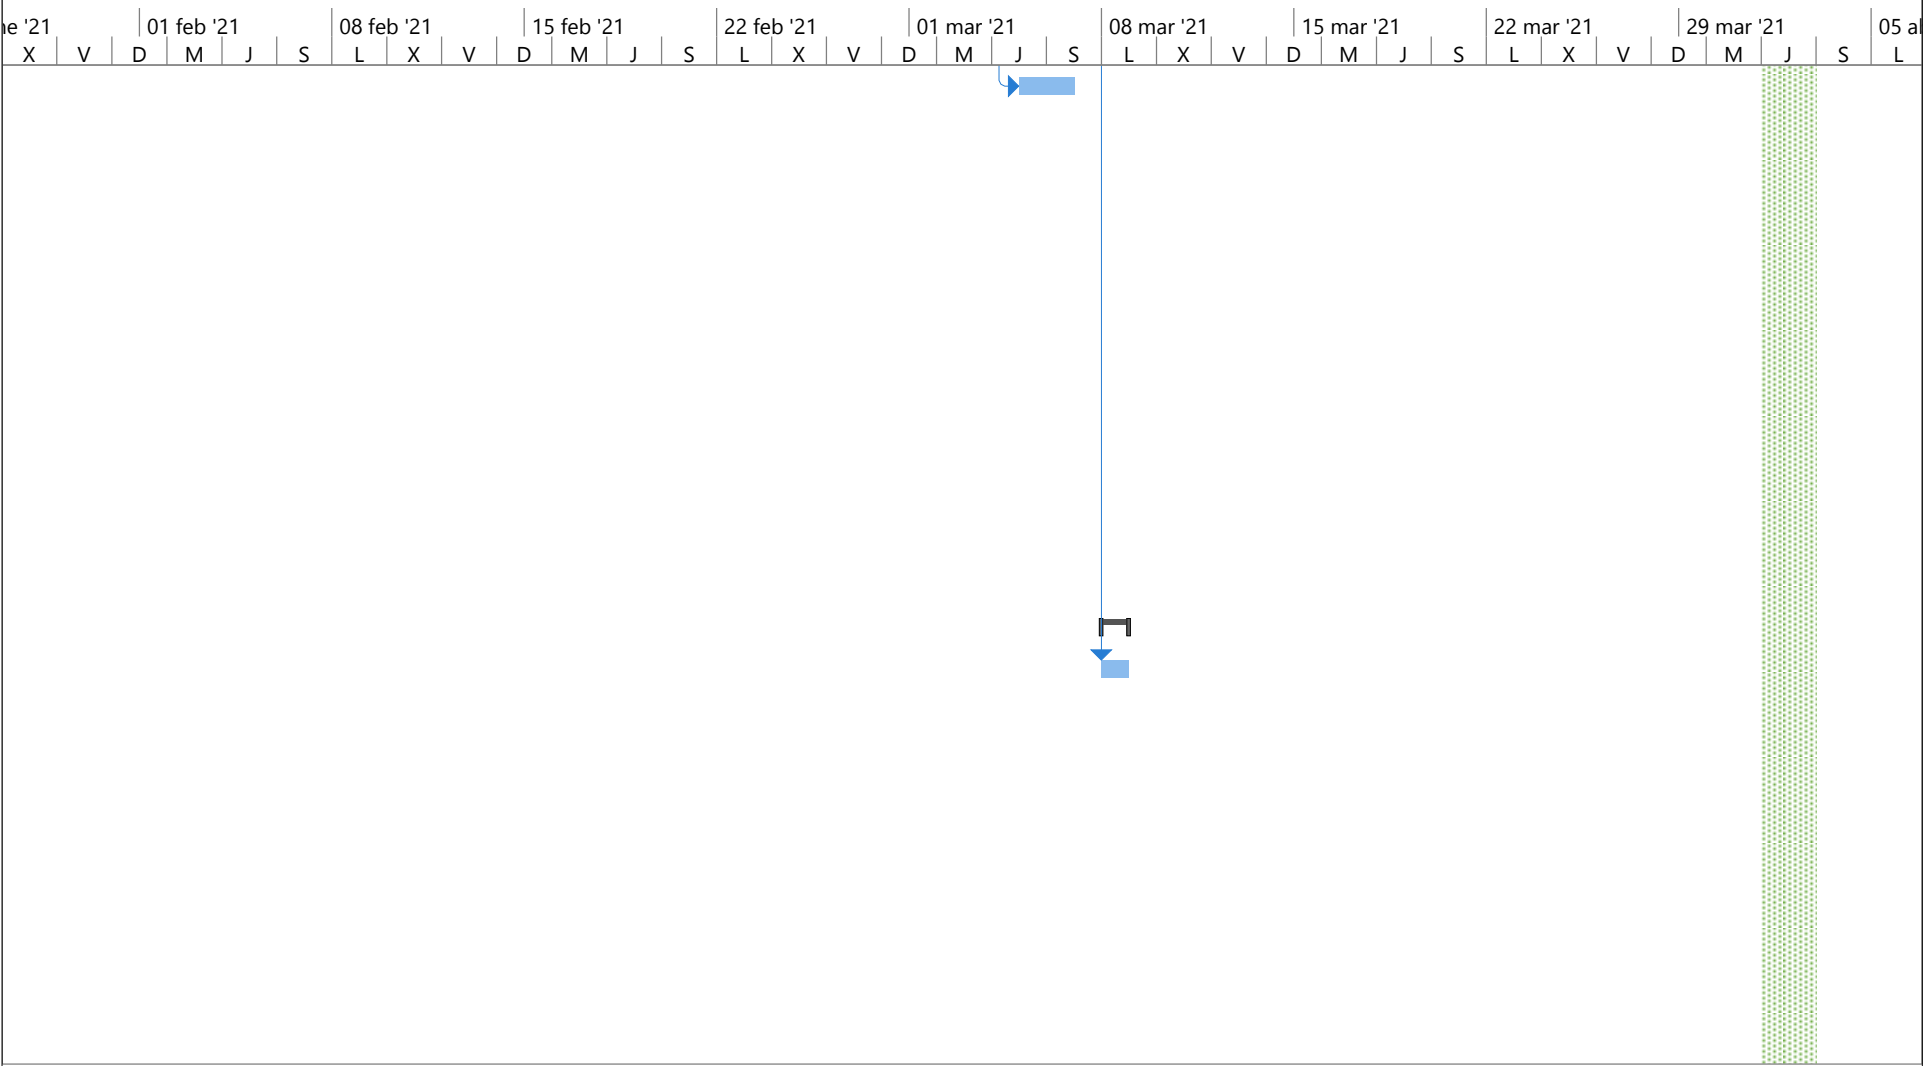














Proyecto: MODULO 1(bloque 1) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	









Proyecto: MODULO 1(bloque 1) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

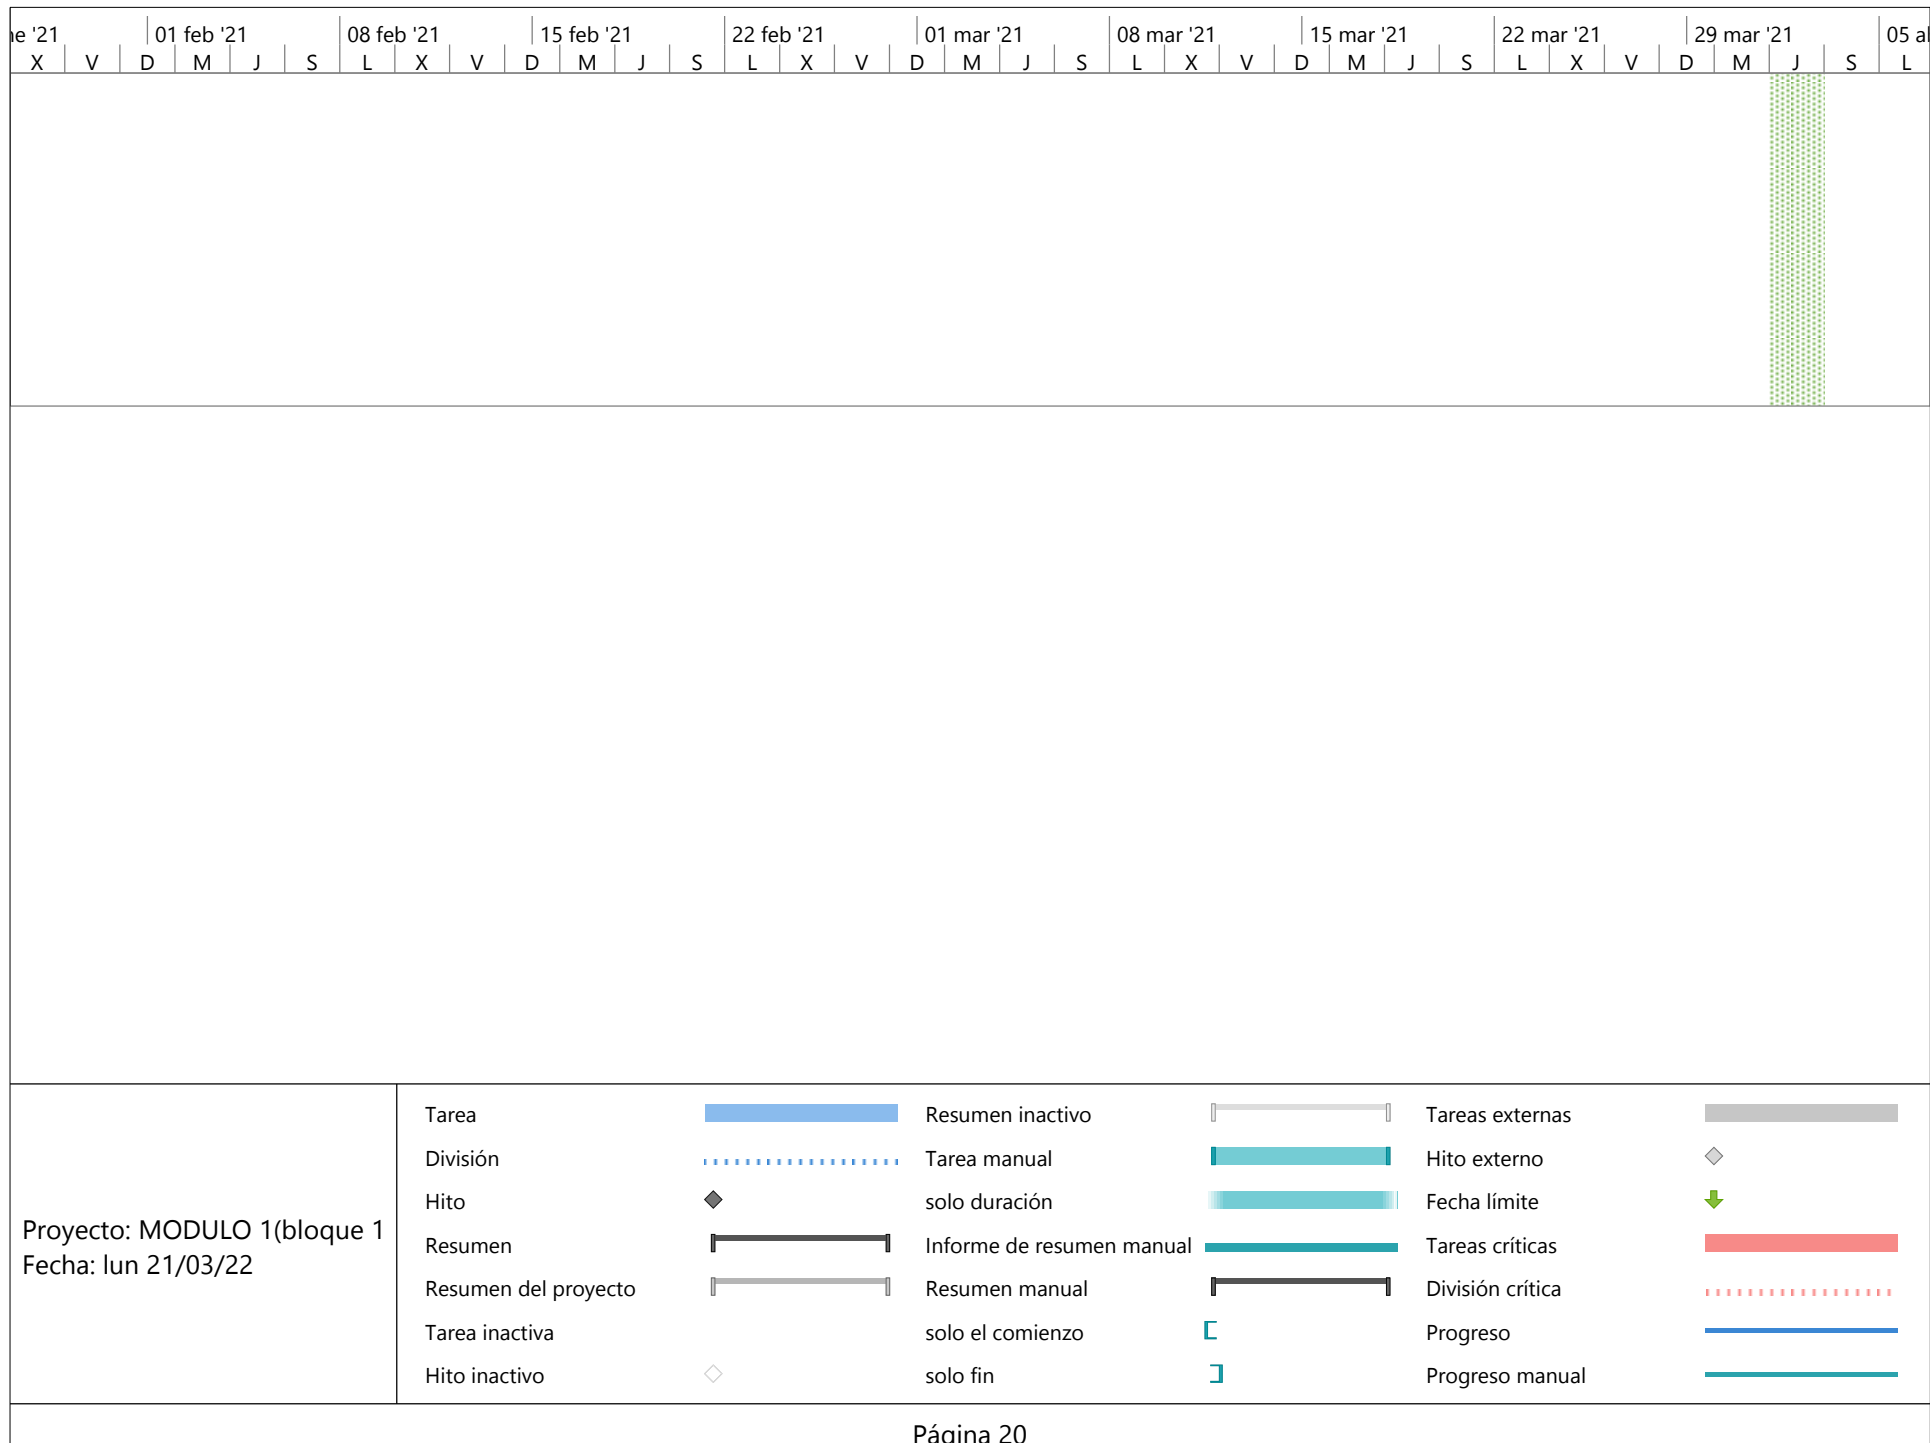


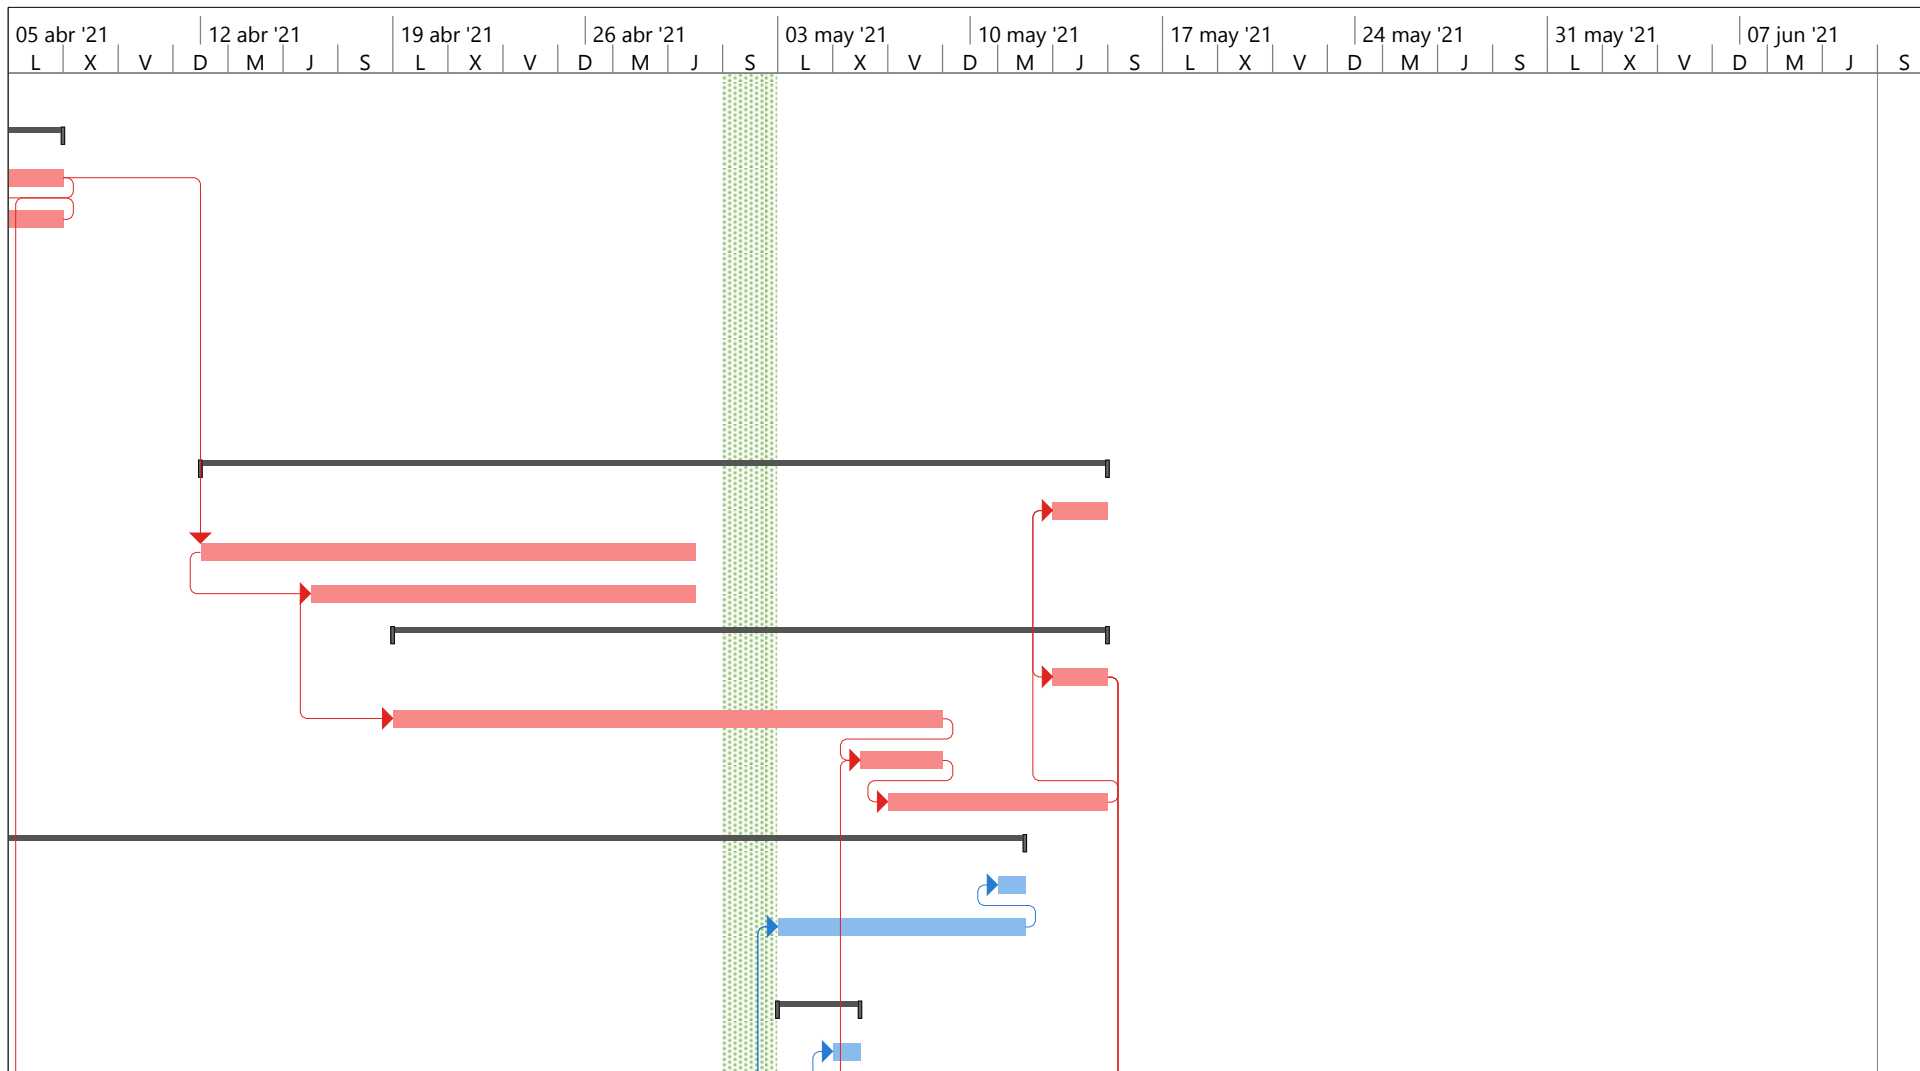



Proyecto: MODULO 1(bloque 1) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

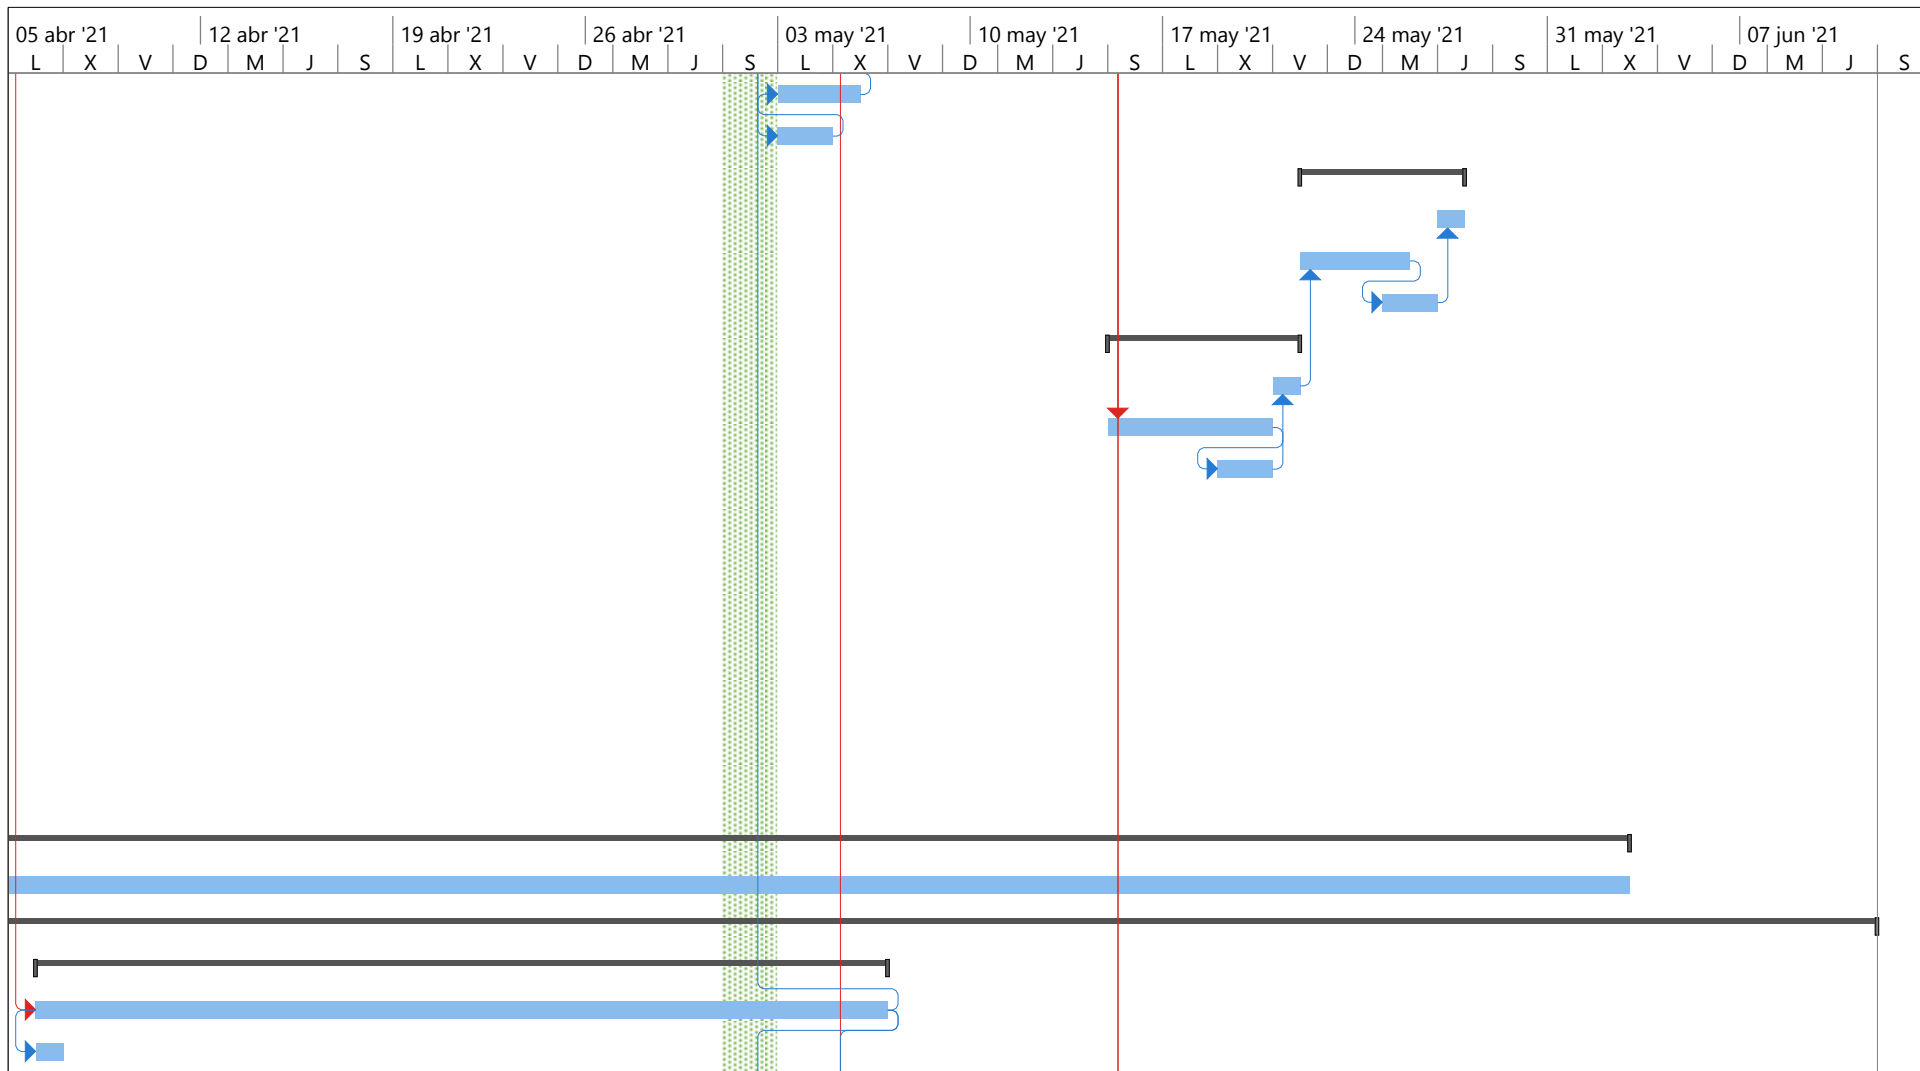



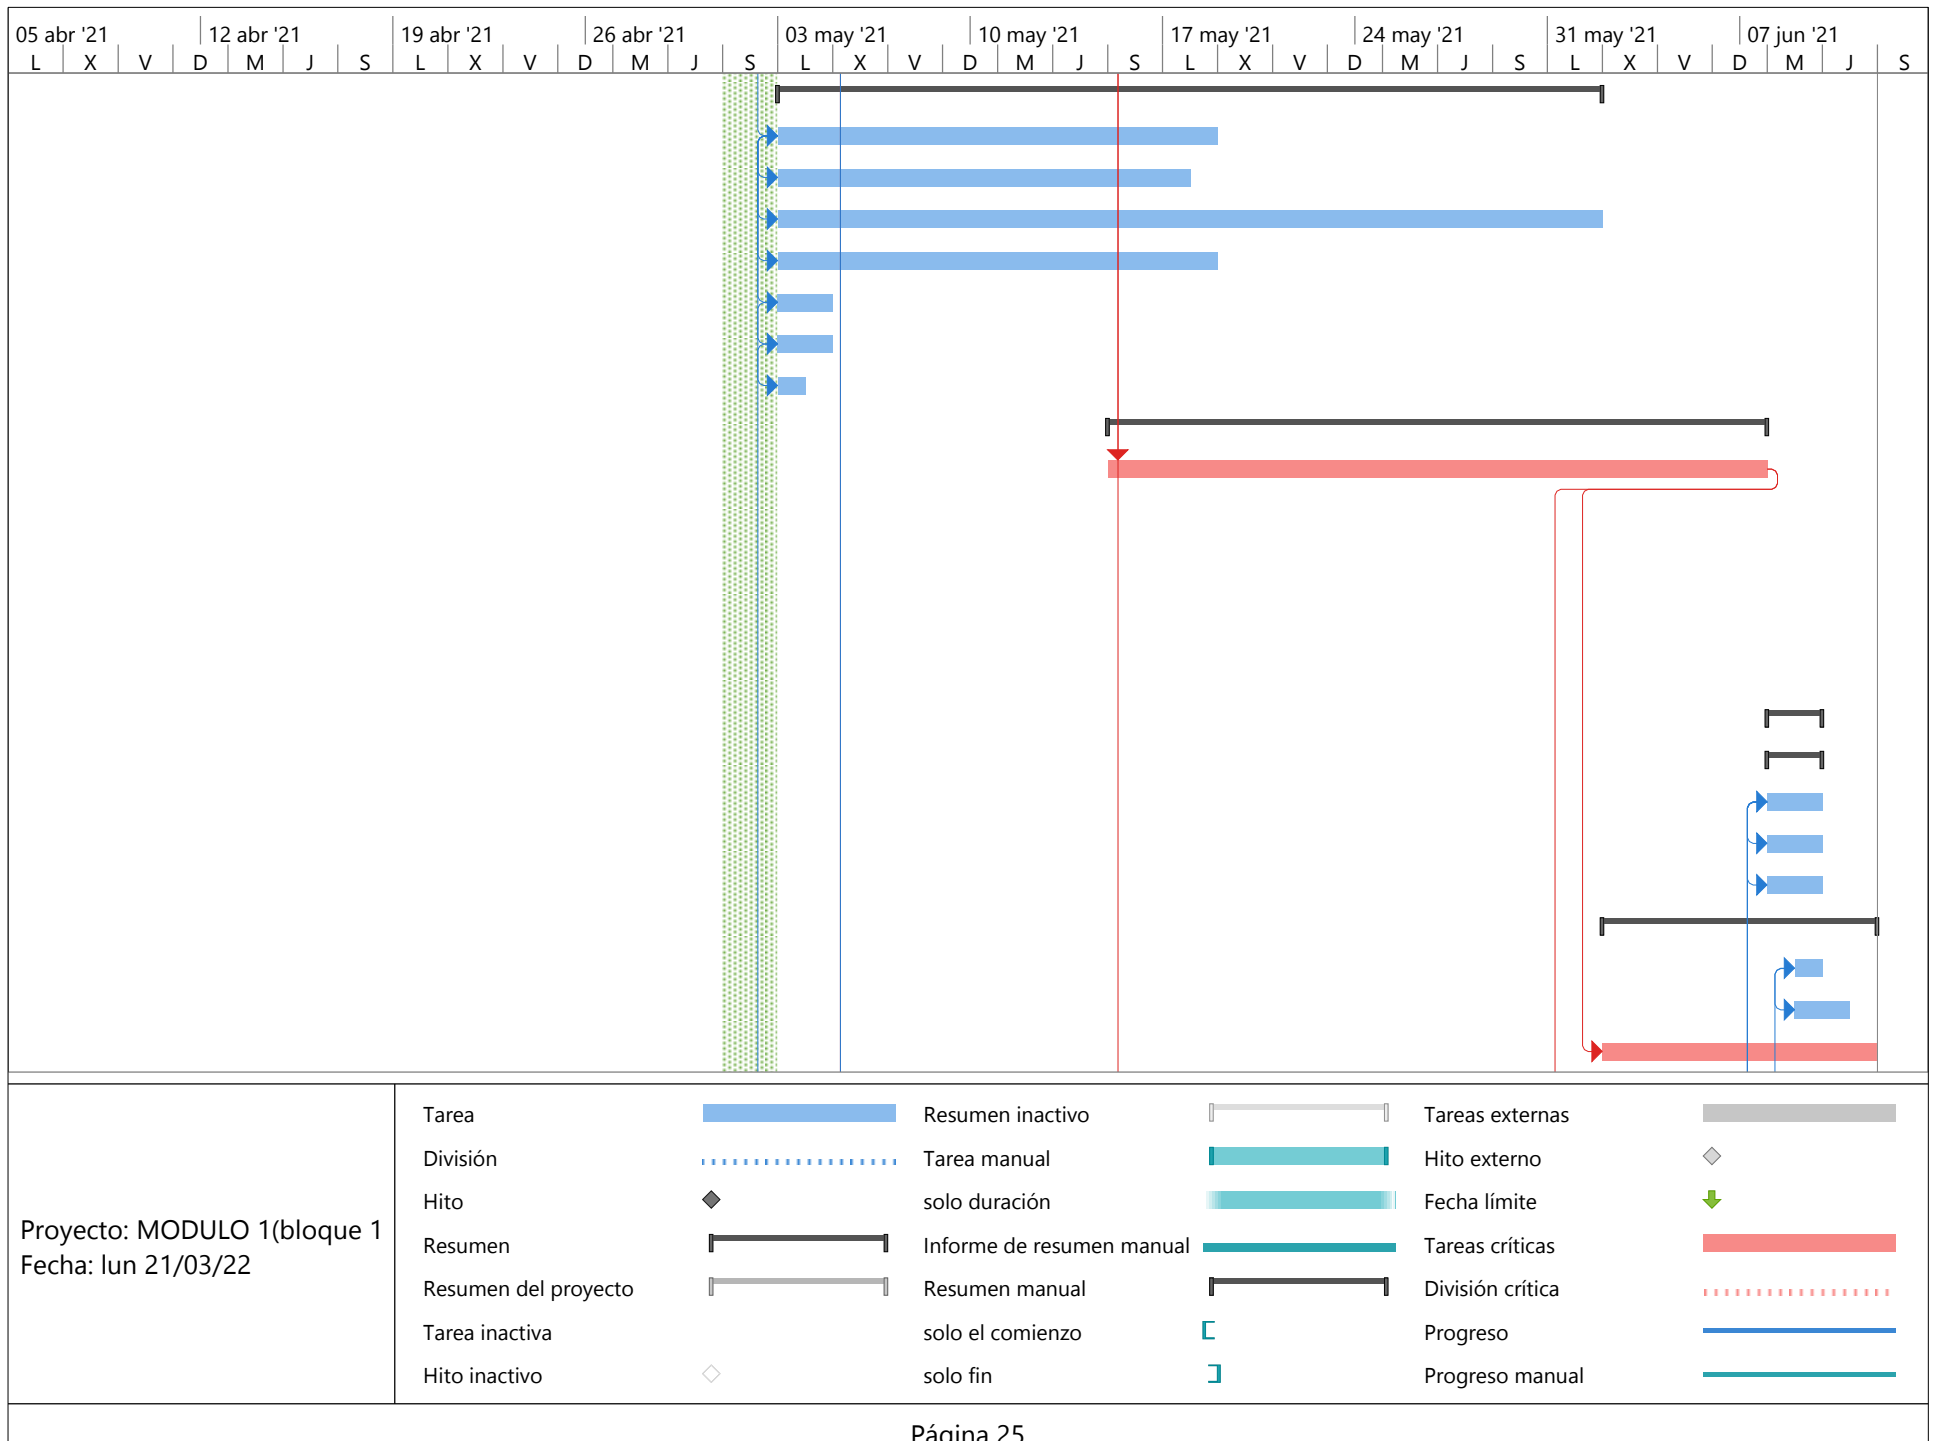

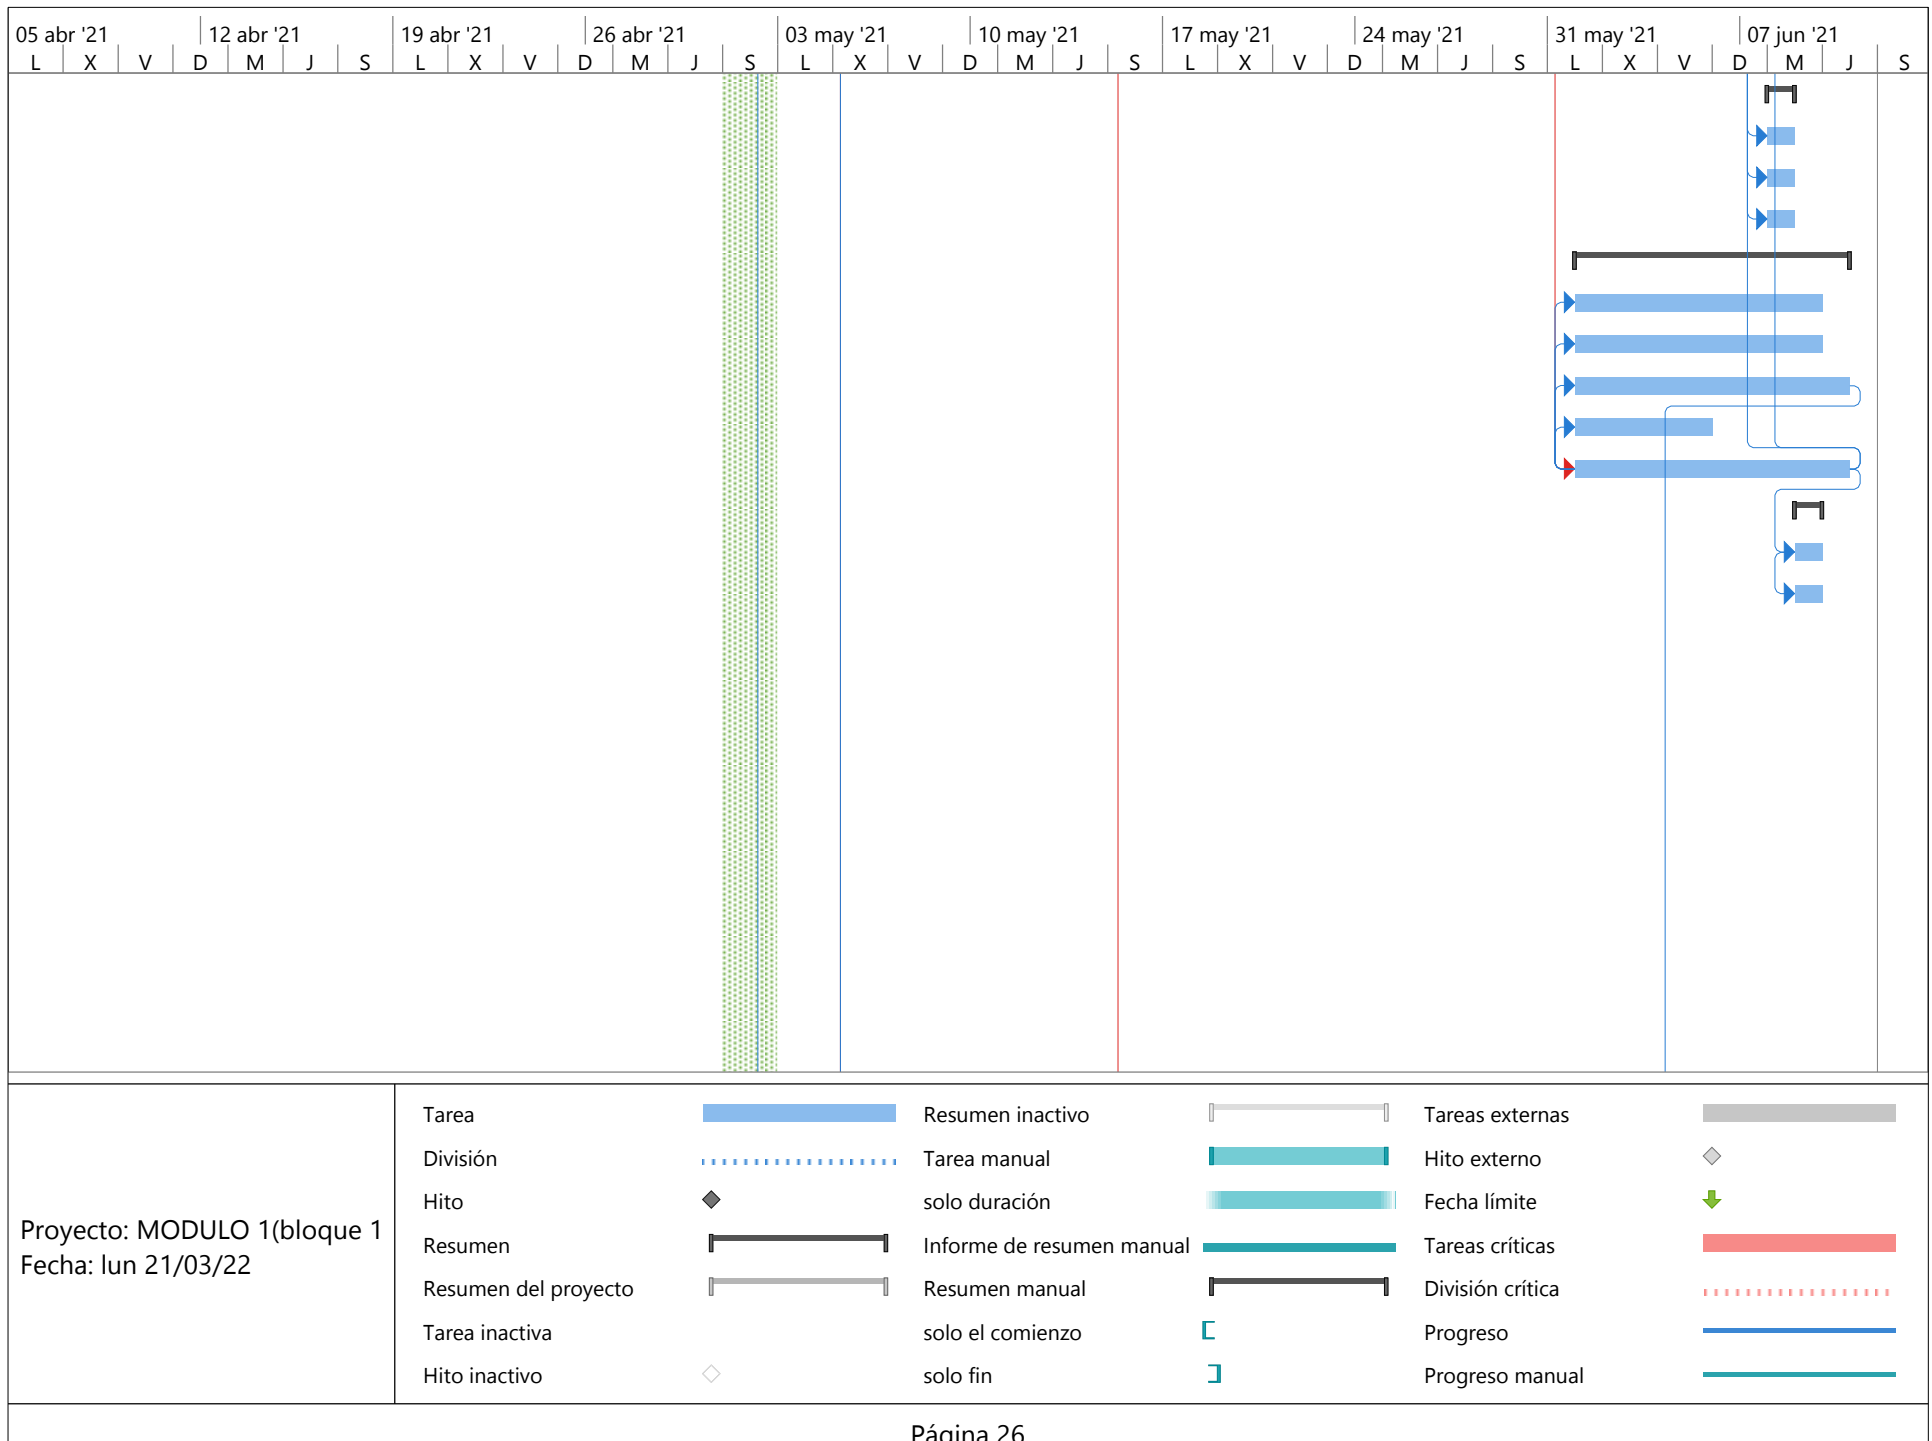

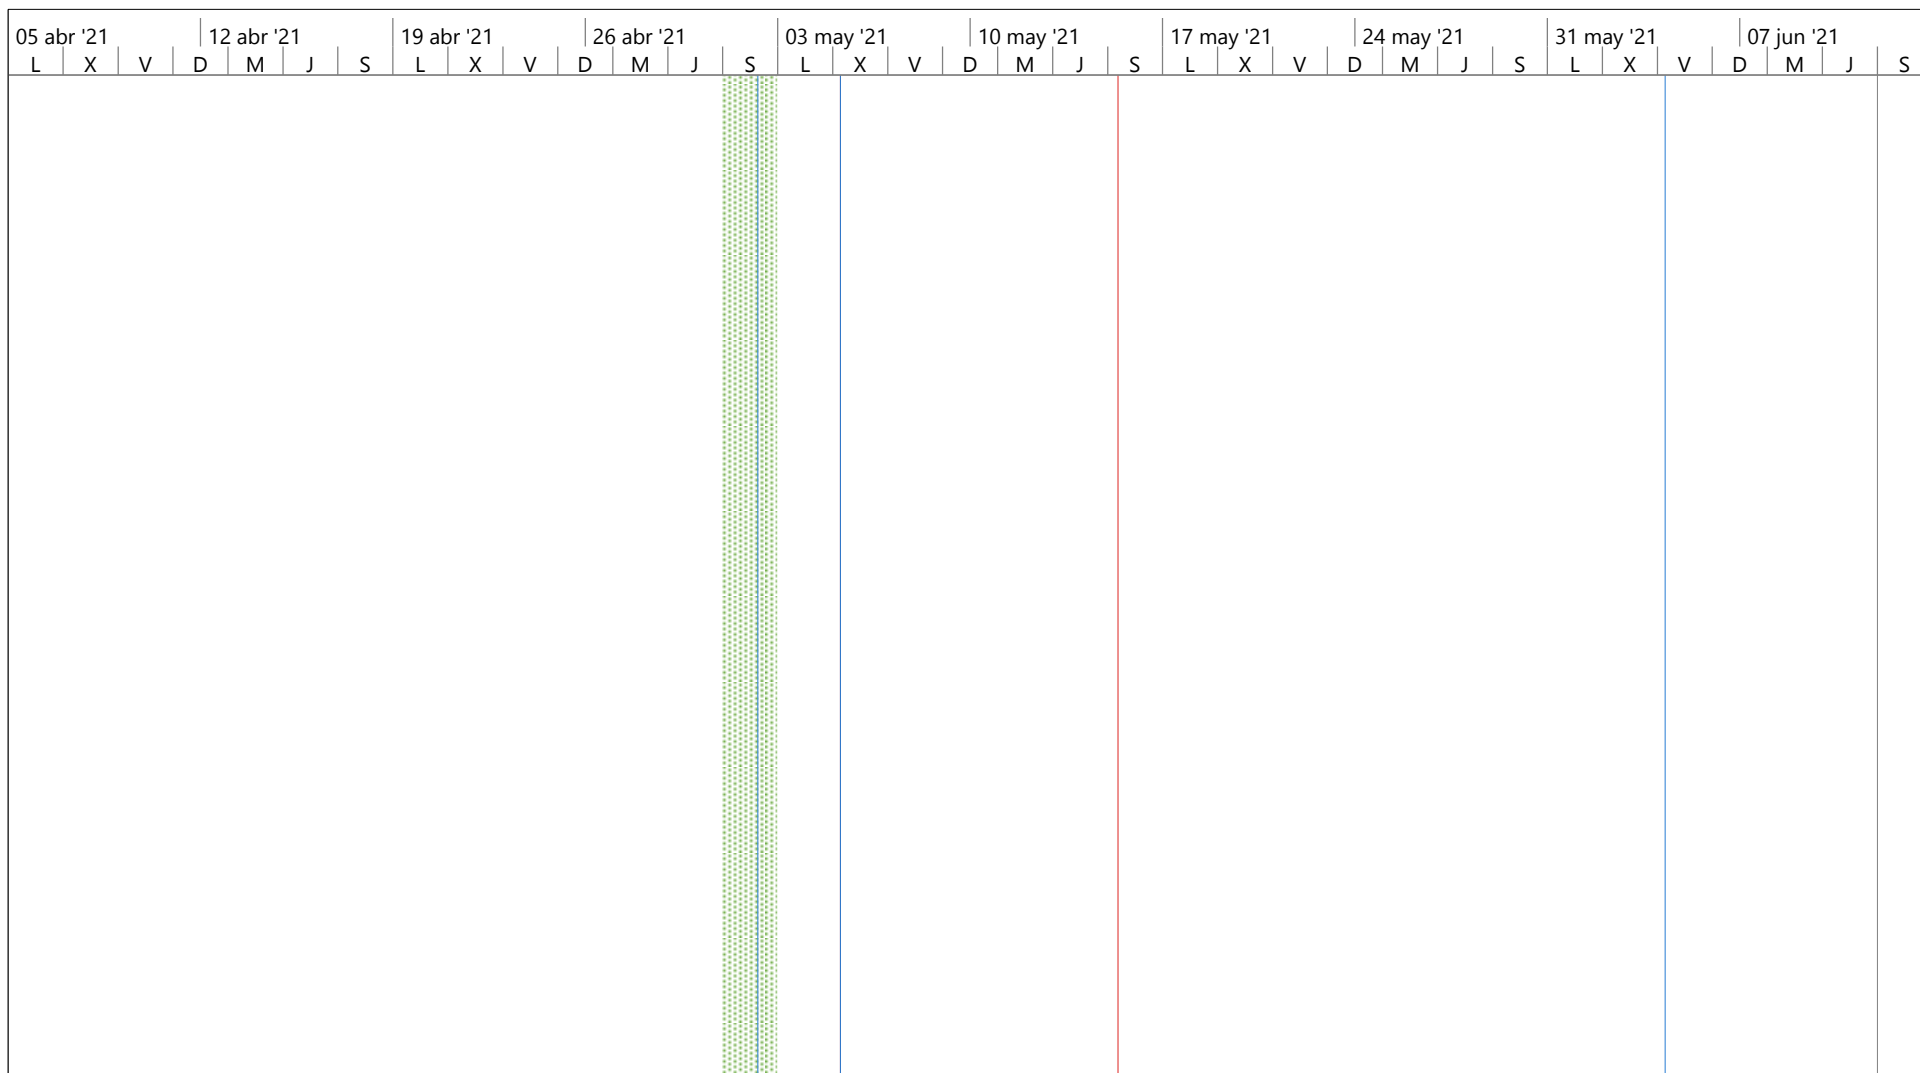














Proyecto: MODULO 1(bloque 1) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	










Proyecto: MODULO 1(bloque 1) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

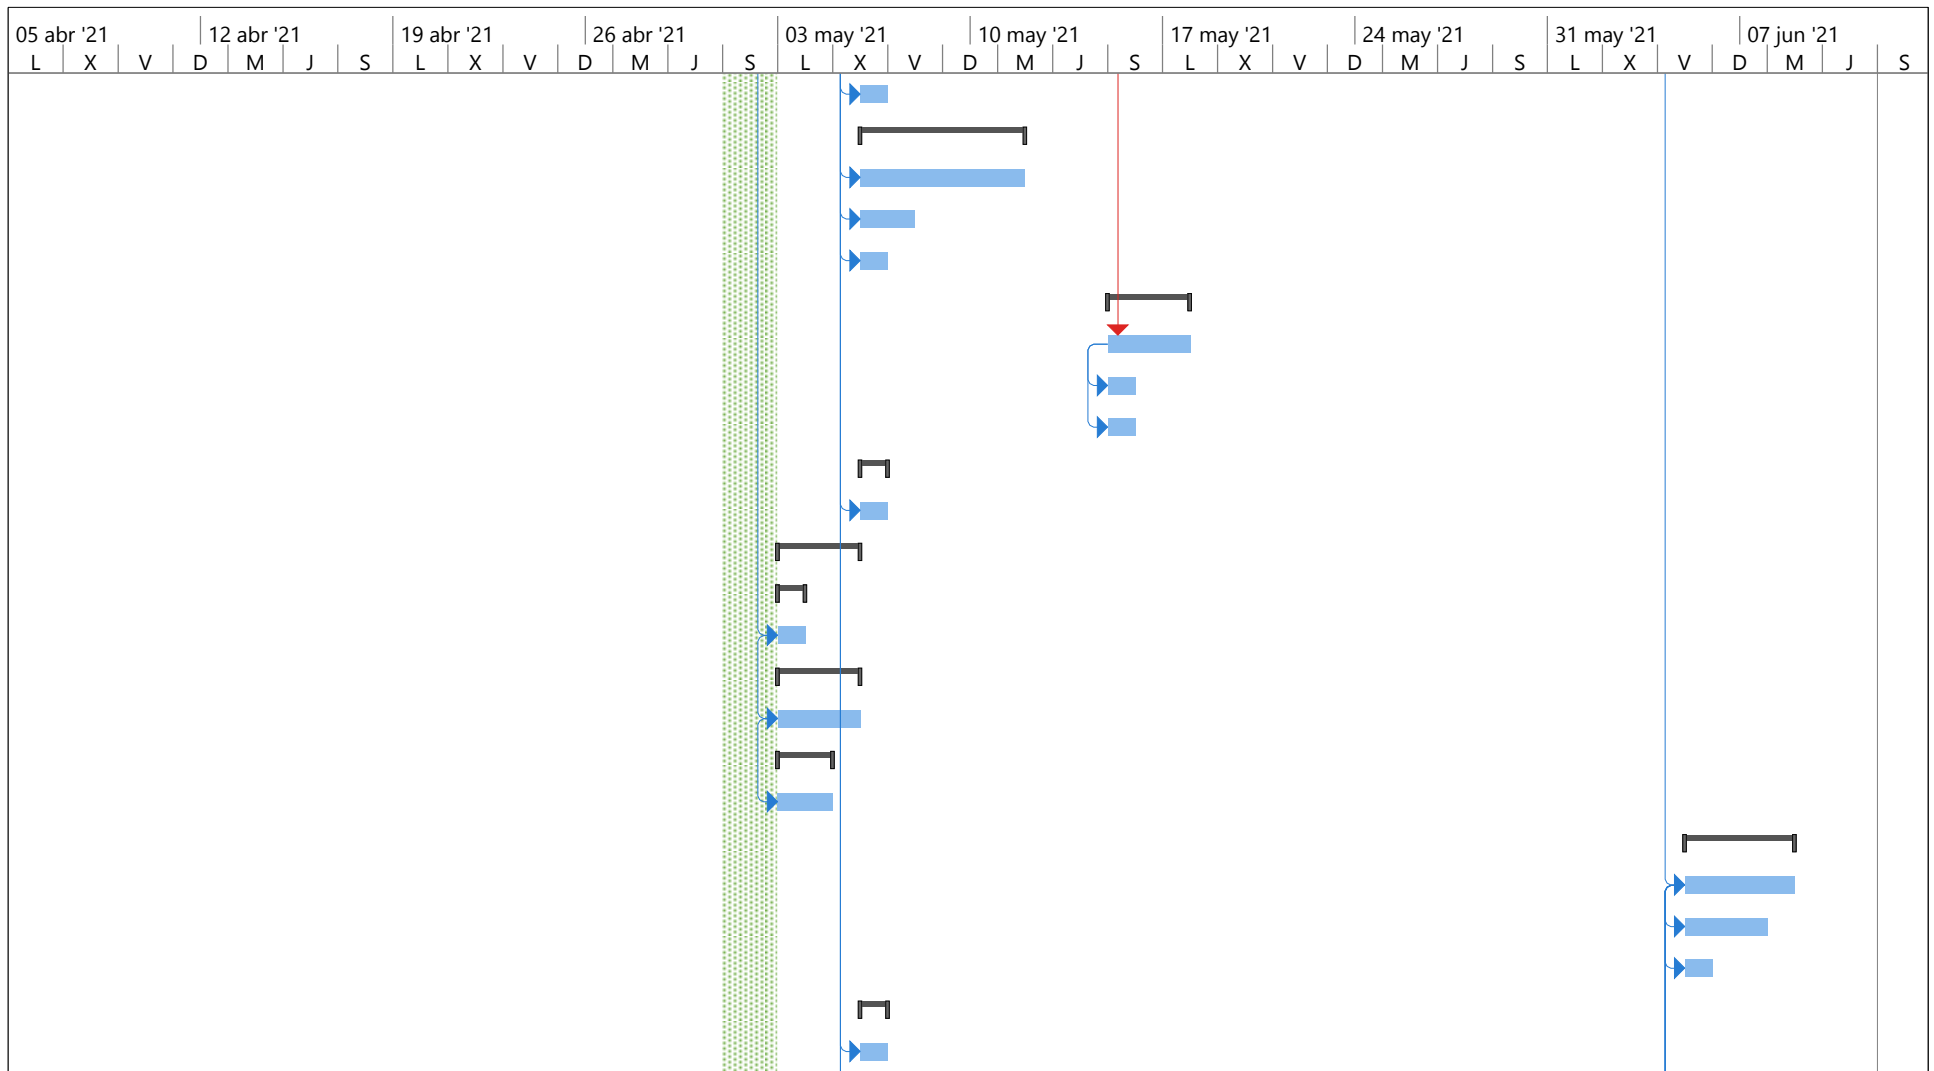


Proyecto: MODULO 1(bloque 1) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

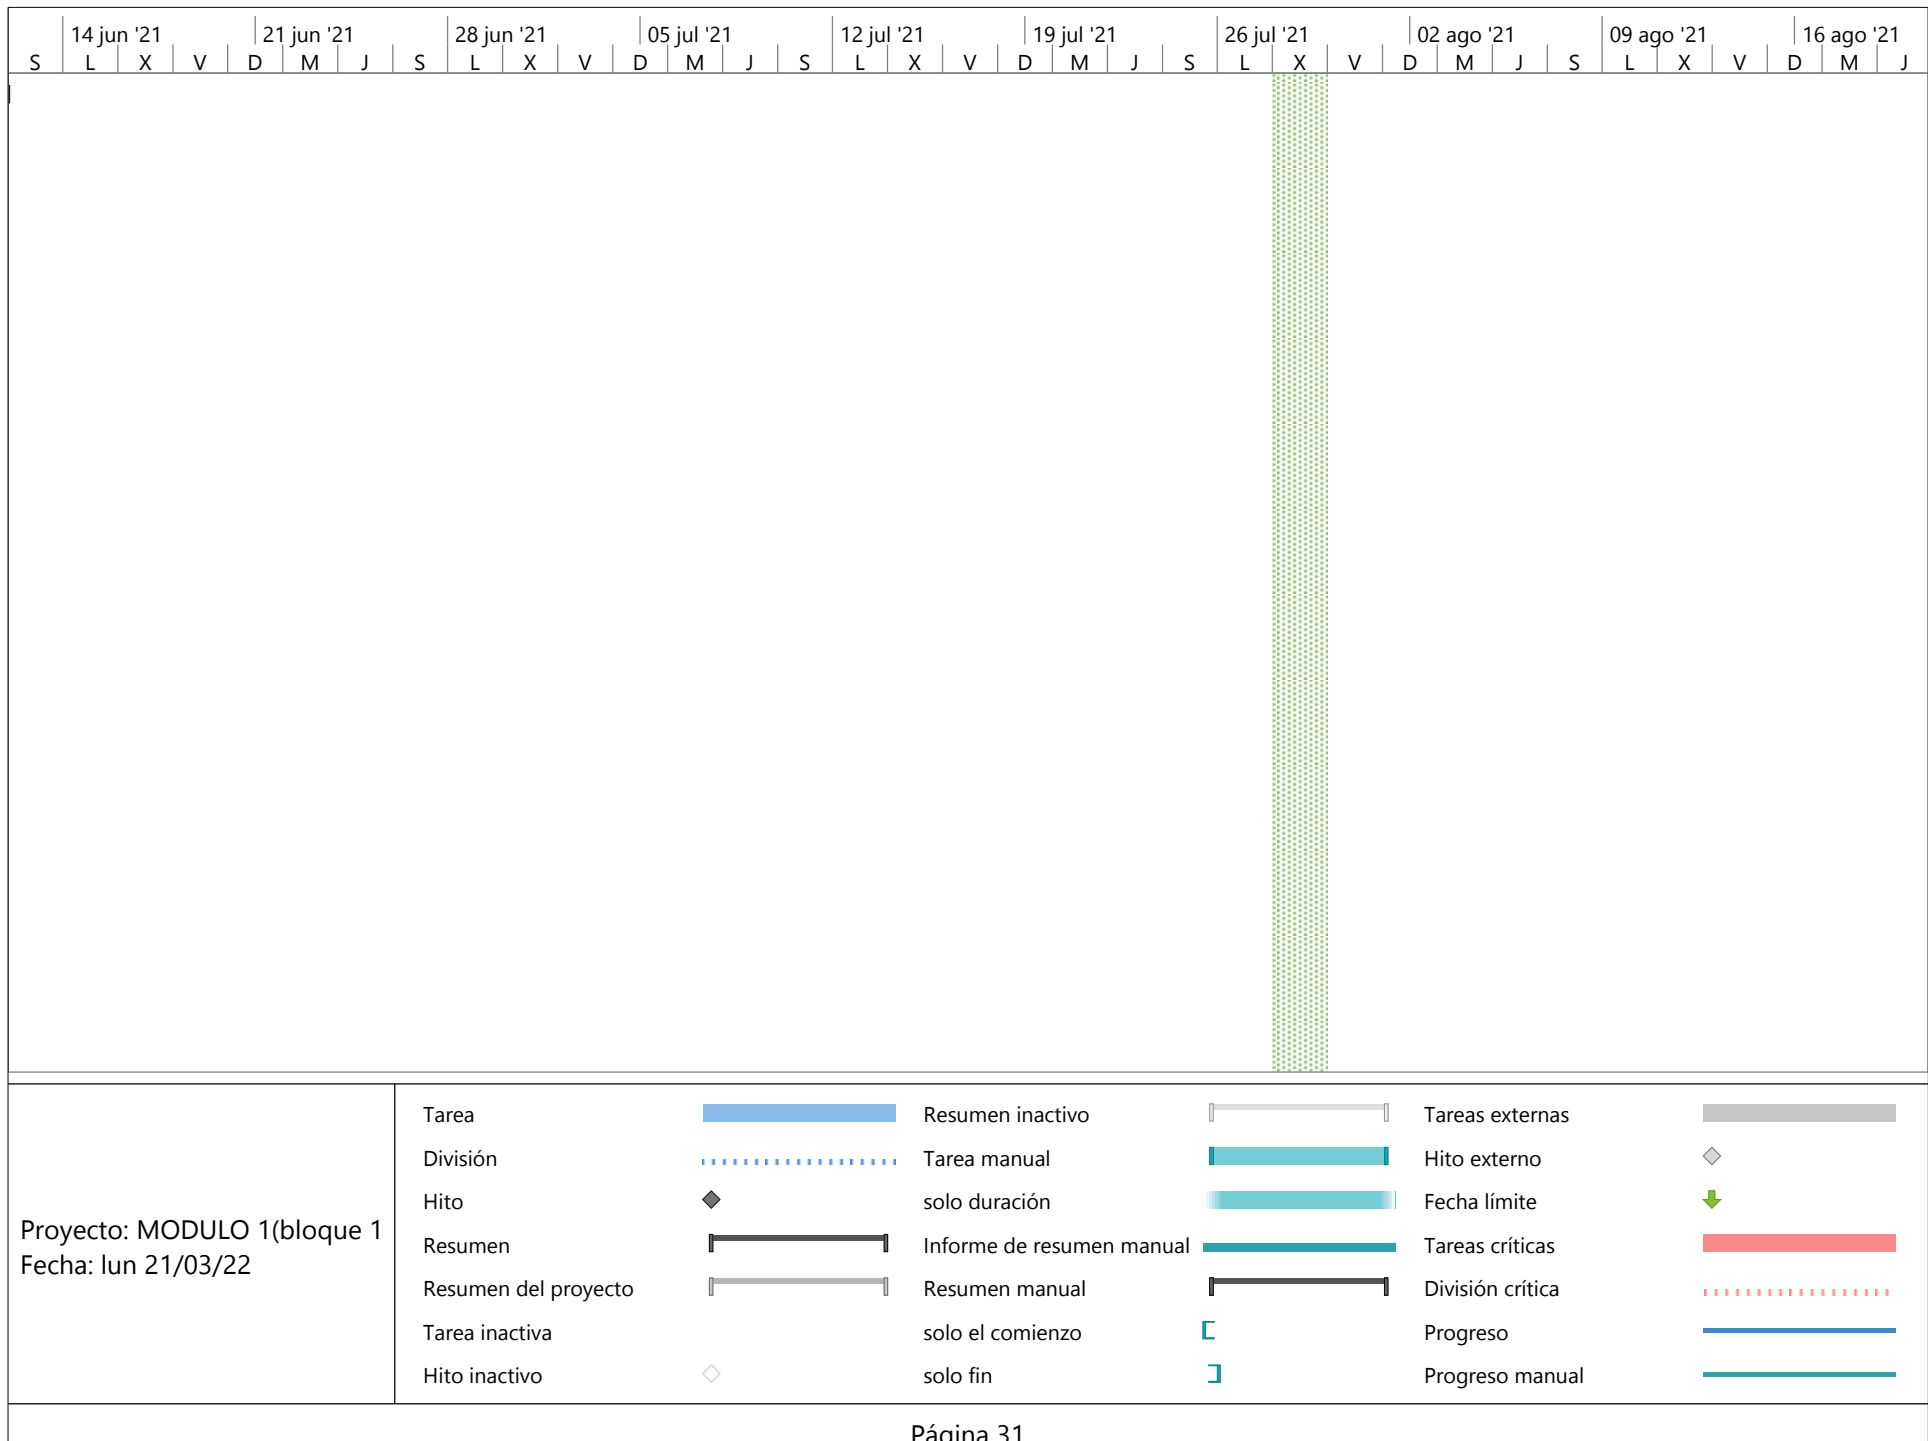

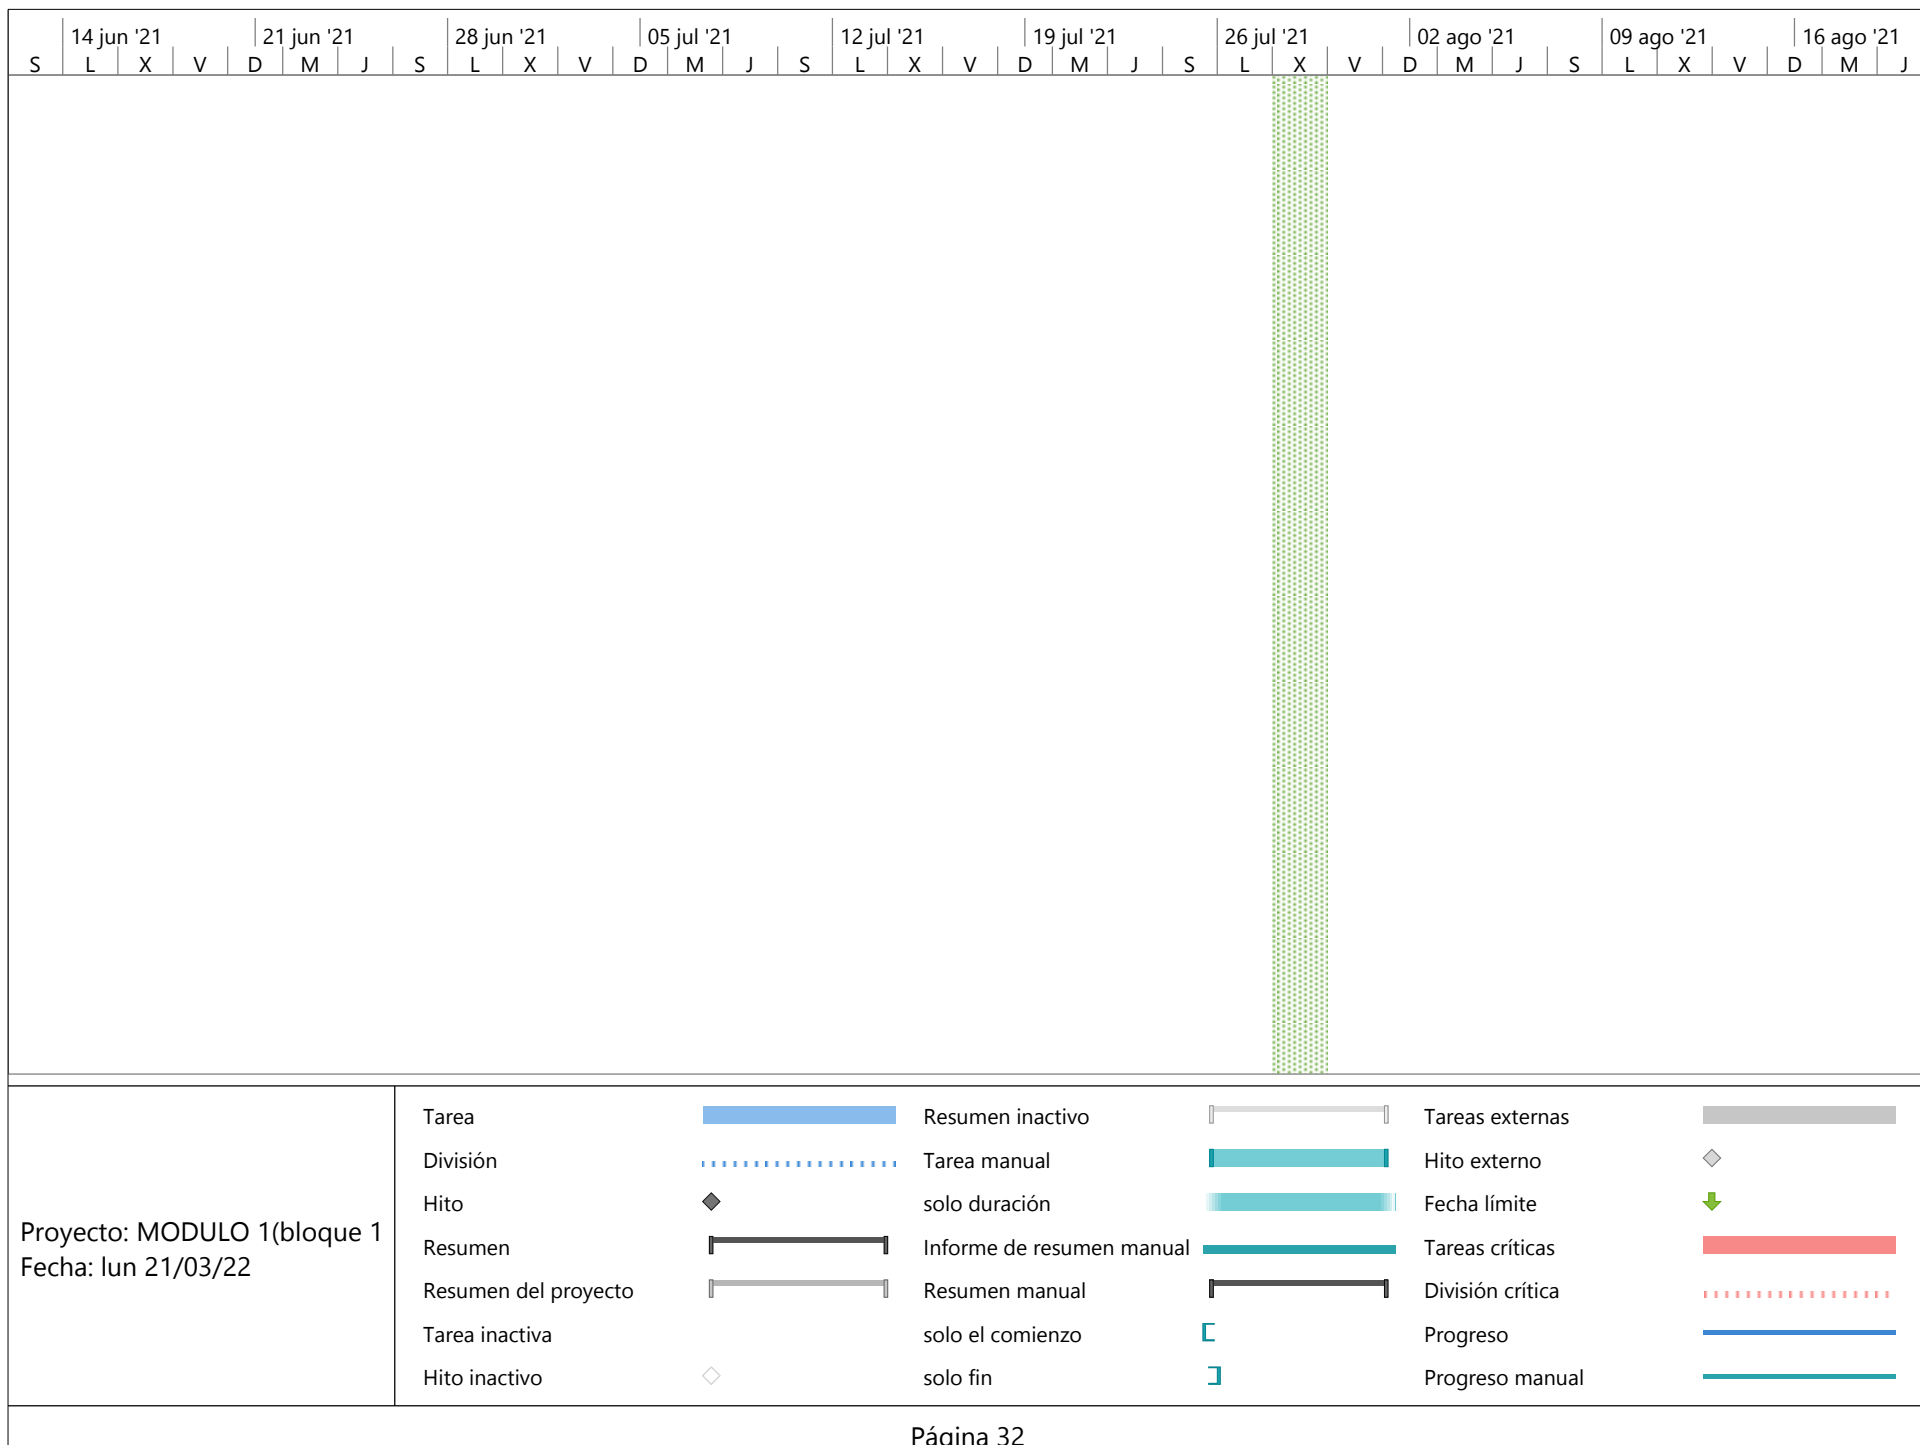

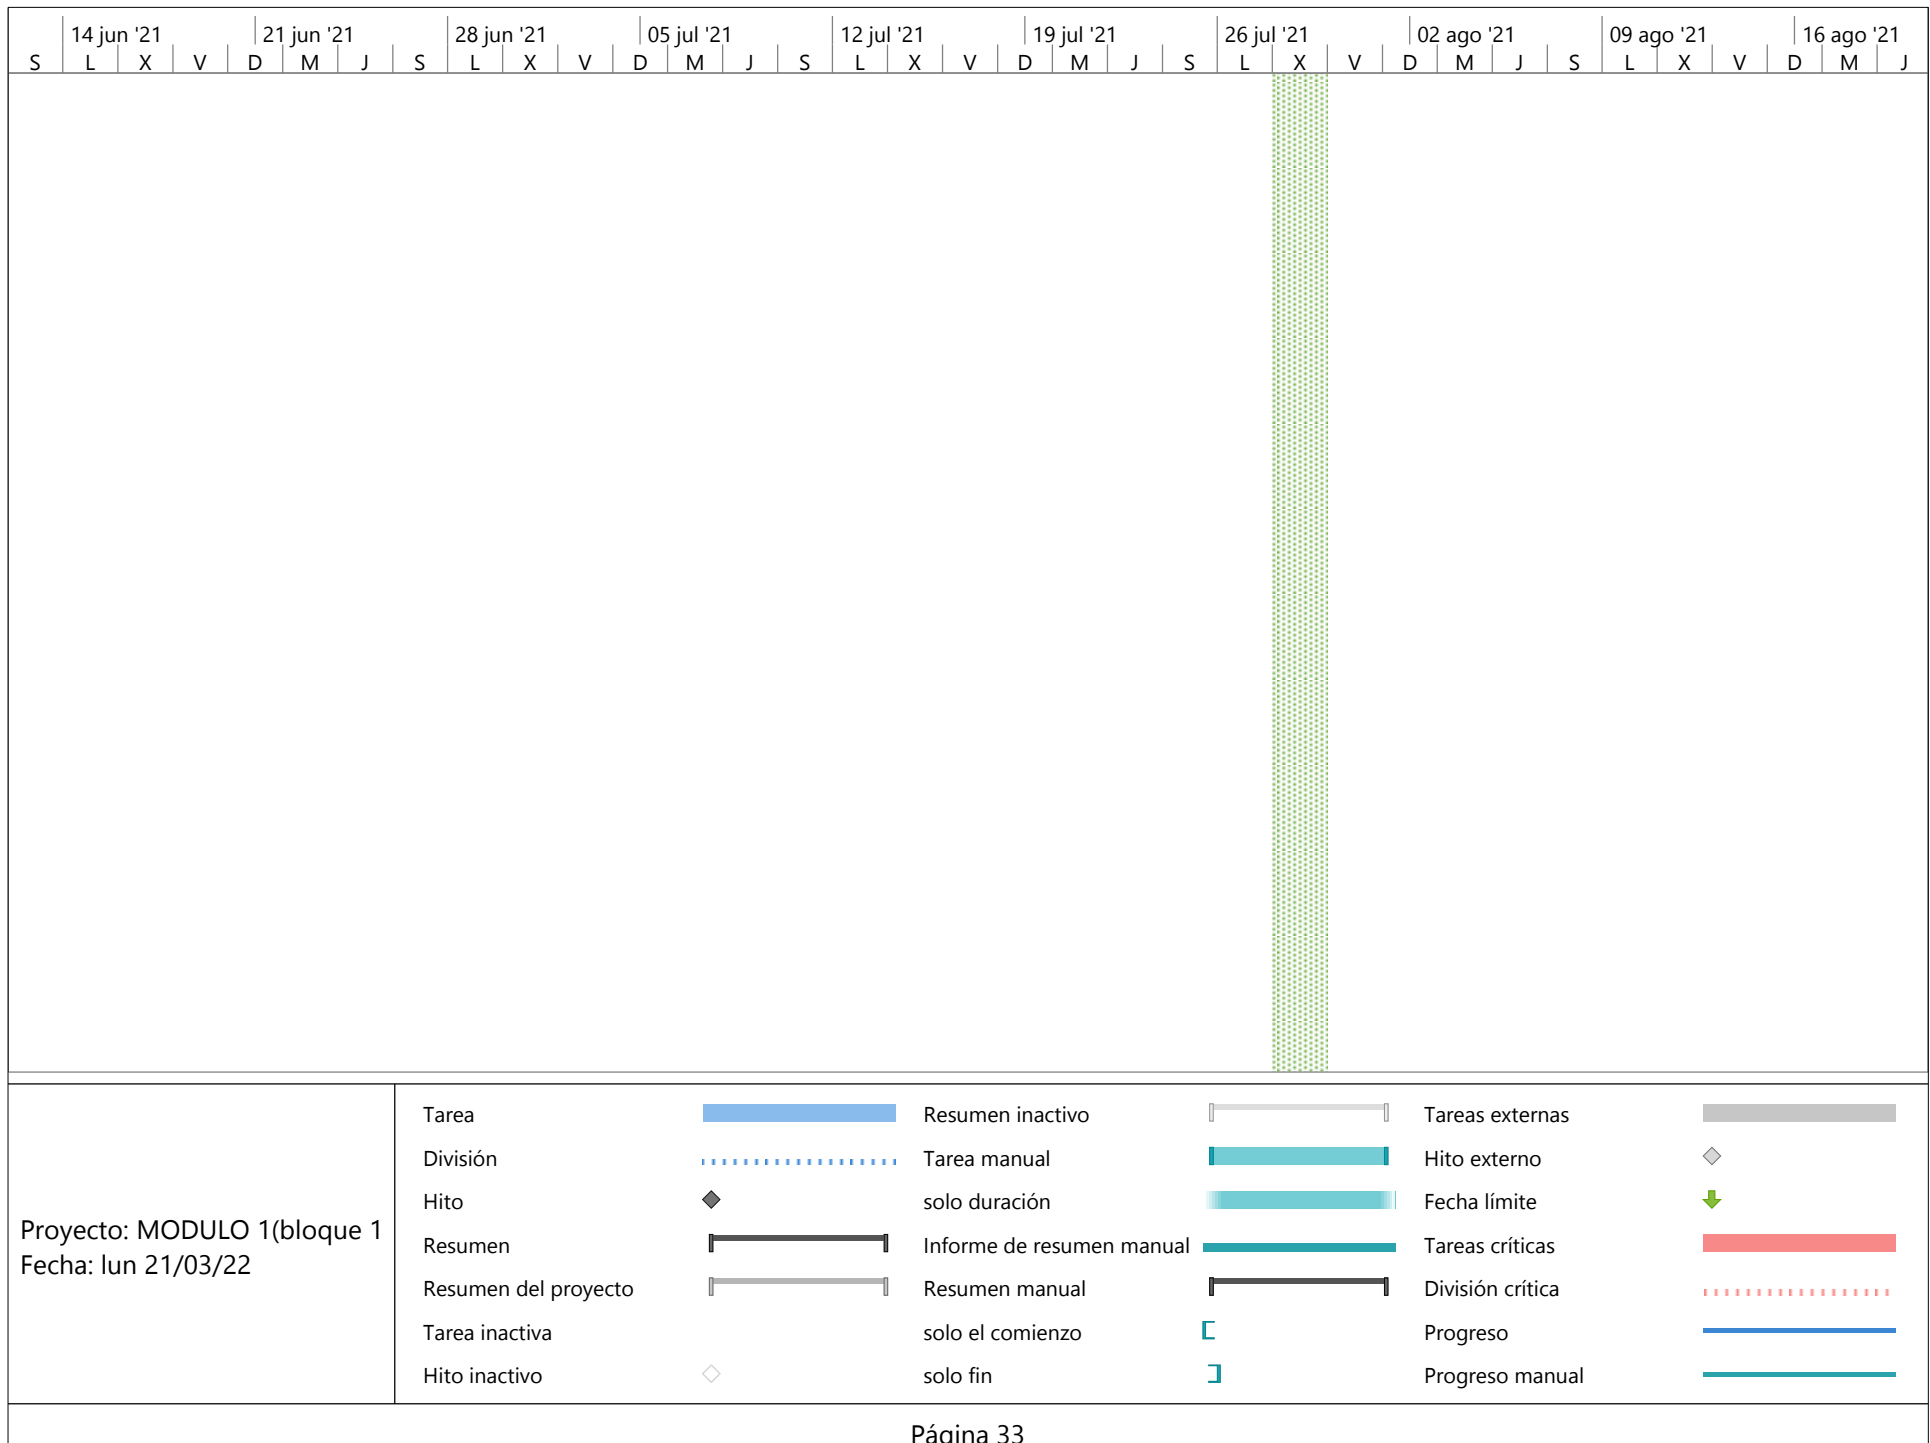

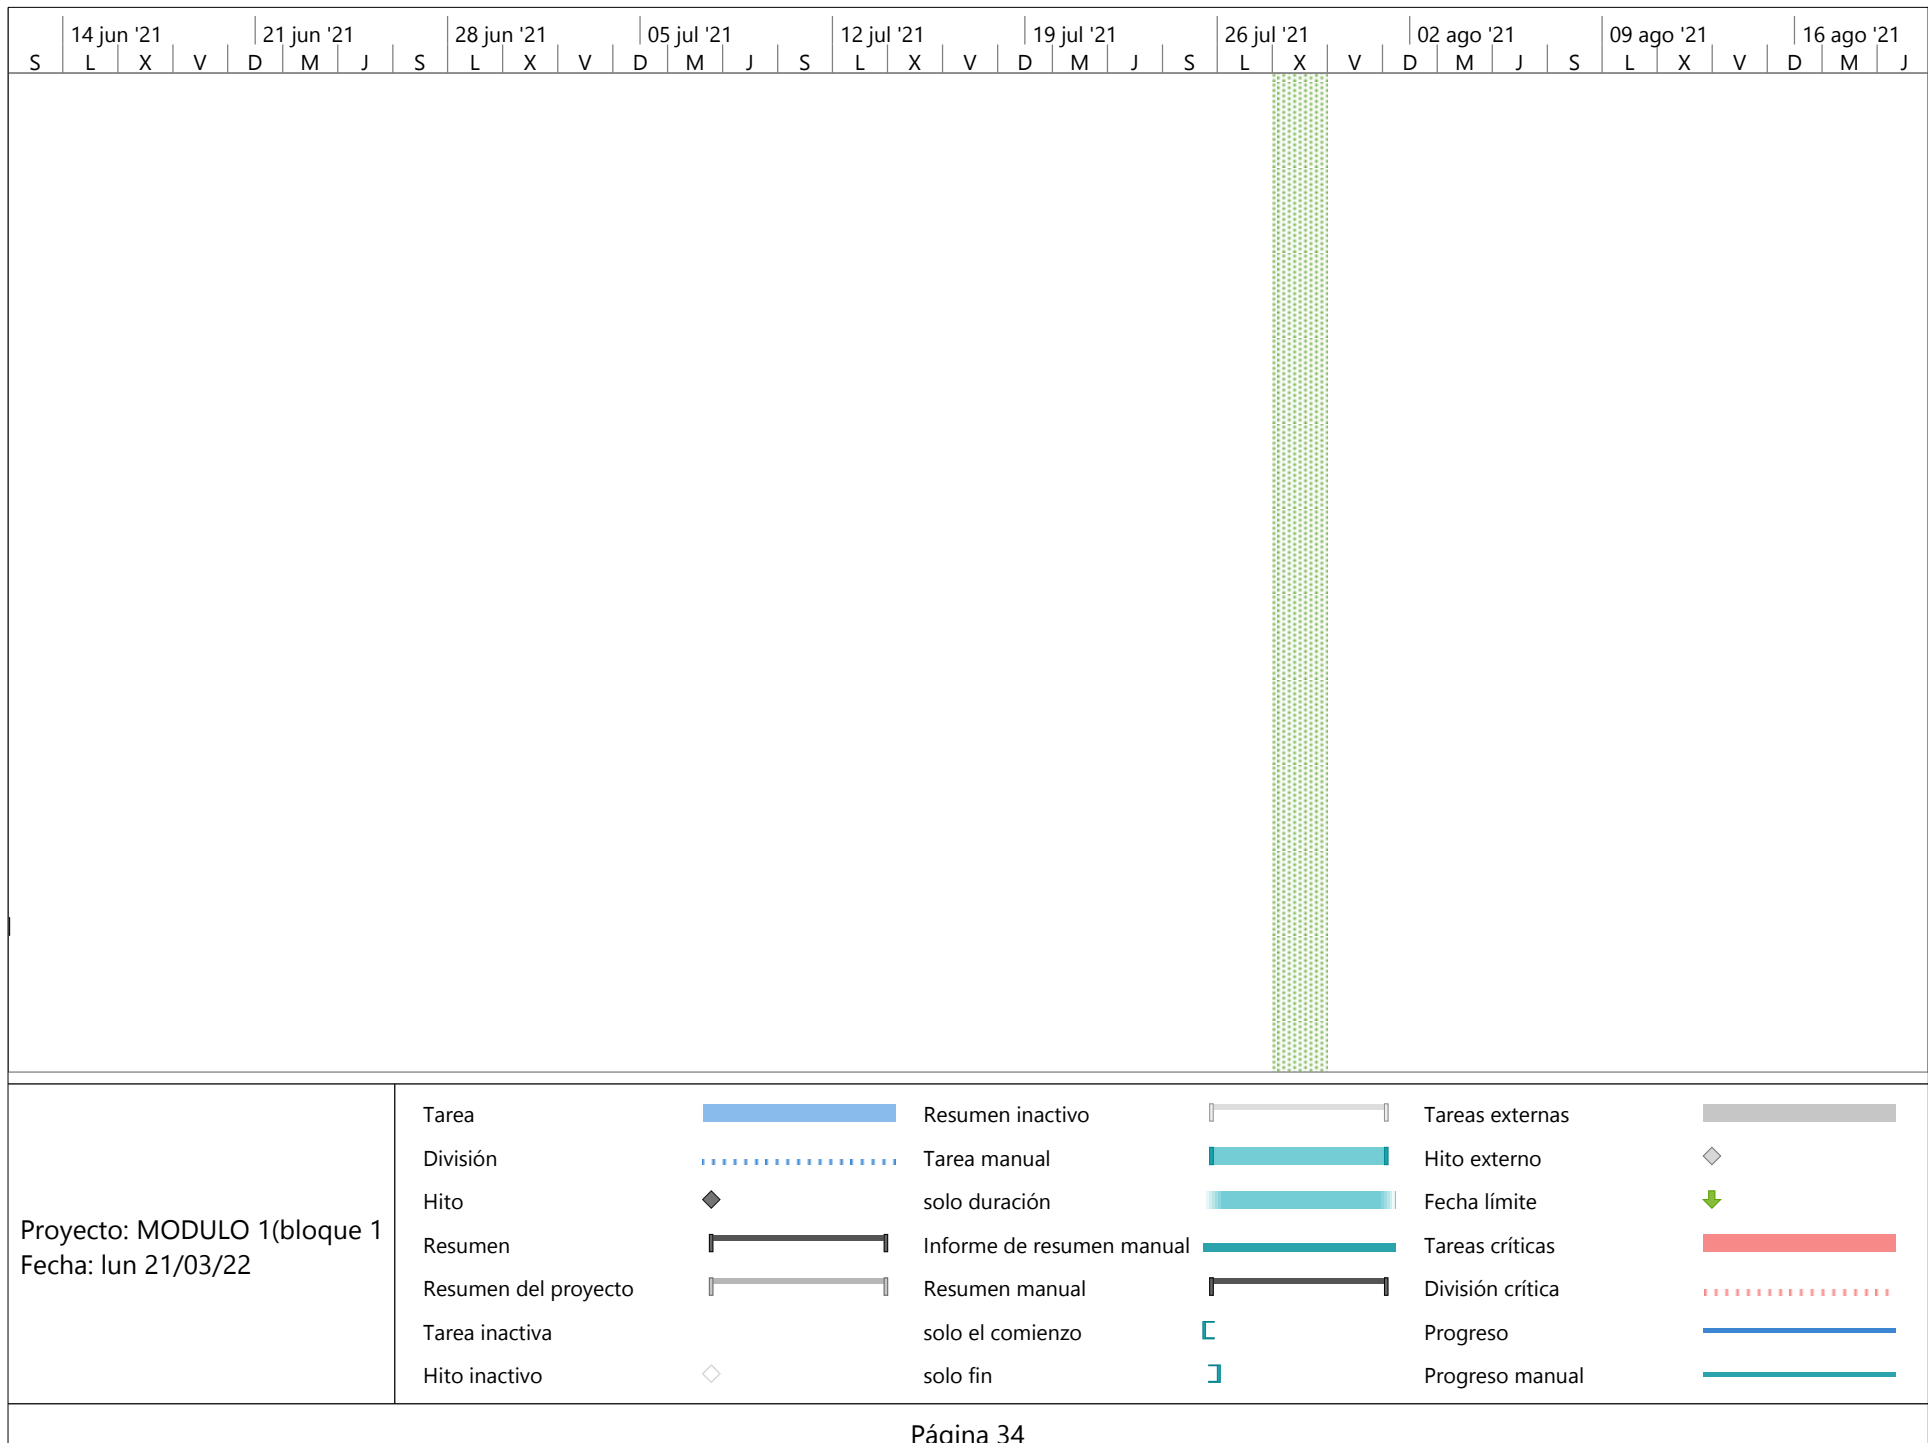




















S	14 jun '21				21 jun '21				28 jun '21				05 jul '21				12 jul '21				19 jul '21				26 jul '21			02 ago '21				09 ago '21			16 ago '21		
S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J			

Proyecto: MODULO 1(bloque 1) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
