




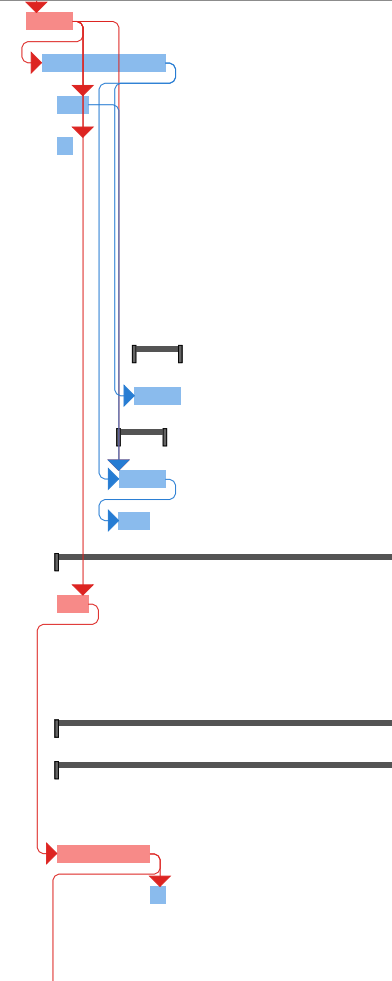























Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	04 oct '21							18 oct '21		01 nov	
						X	L	S	J	M	D	V	X			
1		MODULO 3 (B5-B6)	117 días?	lun 11/10/21	lun 28/02/22											
2		OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	105 días?	lun 11/10/21	lun 14/02/22											
3		OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PRELIMINARES	105 días?	lun 11/10/21	lun 14/02/22											
4		CONSTRUCCIONES PROVINCIONALES	1 día?	mar 12/10/21	mar 12/10/21											
5		OFICINA DE OBRA	1 día?	mar 12/10/21	mar 12/10/21											
6		CASETA DE GUARDIANIA	1 día?	mar 12/10/21	mar 12/10/21											
7		CARTEL DE OBRA 7.2 x 3.6 m	1 día?	mar 12/10/21	mar 12/10/21											
8		CERCO PROVINCIONAL	1 día?	mar 12/10/21	mar 12/10/21											
9		SERVICIOS HIGIENICOS PROVINCIONALES	1 día?	mar 12/10/21	mar 12/10/21											
10		INSTALACIONES PROVINCIONALES	1 día?	mar 12/10/21	mar 12/10/21											
11		AGUA PARA LA CONSTRUCCION	1 día?	mar 12/10/21	mar 12/10/21											
12		ENERGIA ELECTRICA	1 día?	mar 12/10/21	mar 12/10/21											
13		CONEXIÓN A INTERNET	1 día?	mar 12/10/21	mar 12/10/21											
14		DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION	1 día?	mar 12/10/21	mar 12/10/21											
15		TRABAJOS PRELIMINARES	2 días?	lun 11/10/21	mar 12/10/21											
16		LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	1 día?	lun 11/10/21	lun 11/10/21											
17		TRAZO Y REPLANTEO	1 día?	mar 12/10/21	mar 12/10/21											
18		SALUD Y SEGURIDAD	105 días	lun 11/10/21	lun 14/02/22											
19		IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN D	105 días	lun 11/10/21	lun 14/02/22											
20		EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	105 días	lun 11/10/21	lun 14/02/22											
21		SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	105 días	lun 11/10/21	lun 14/02/22											
22		ESTRUCTURAS	105 días	lun 11/10/21	lun 14/02/22											
23		MOVIMIENTO DE TIERRAS	42 días	mié 13/10/21	mié 01/12/21											
24		EXCAVACIONES	8 días	mié 13/10/21	jue 21/10/21											





















Proyecto: MODULO 3 (bloque 5) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	<div> <div>X</div> <div>04 oct '21</div> <div>L</div> <div>S</div> <div>J</div> <div>18 oct '21</div> <div>M</div> <div>D</div> <div>01 nov</div> <div>V</div> <div>X</div> </div>						
25		EXCAVACIONES CON MAQUINARIA	3 días	mié 13/10/21	vie 15/10/21							
26		EXCAVACION MANUAL	7 días	jue 14/10/21	jue 21/10/21							
27		CORTE DE TERRENO NATURAL DE 15 cm	2 días	vie 15/10/21	sáb 16/10/21							
28		REFINE DEL TERRENO EXCAVACION	1 día	vie 15/10/21	vie 15/10/21							
29		<b>RELLENOS</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 23/11/21</b>	<b>mié 01/12/21</b>							
30		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	4 días	mar 23/11/21	vie 26/11/21							
31		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PREST	4 días	jue 25/11/21	lun 29/11/21							
32		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PREST	4 días	sáb 27/11/21	mié 01/12/21							
33		<b>NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO</b>	<b>3 días</b>	<b>mié 20/10/21</b>	<b>vie 22/10/21</b>							
34		NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO	3 días	mié 20/10/21	vie 22/10/21							
35		<b>ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE</b>	<b>3 días</b>	<b>mar 19/10/21</b>	<b>jue 21/10/21</b>							
36		ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	3 días	mar 19/10/21	jue 21/10/21							
37		ELIMINACIÓN DE MATERIAL C/MAQUINA	2 días	mar 19/10/21	mié 20/10/21							
38		<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>	<b>40 días</b>	<b>vie 15/10/21</b>	<b>mié 01/12/21</b>							
39		CONCRETO PARA SOLADOS e=10 cm C:H 1:10	2 días	vie 15/10/21	sáb 16/10/21							
40		CIMENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G.	1 día	lun 22/11/21	lun 22/11/21							
41		CONCRETO PARA FALSOPISO C:H 1:8 e=10 cm	2 días	mar 30/11/21	mié 01/12/21							
42		<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>100 días</b>	<b>vie 15/10/21</b>	<b>sáb 12/02/22</b>							
43		<b>ZAPATAS</b>	<b>29 días</b>	<b>vie 15/10/21</b>	<b>jue 18/11/21</b>							
44		CONCRETO EN ZAPATAS f'c=280 kg/cm2	4 días	lun 15/11/21	jue 18/11/21							
45		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS	5 días	vie 15/10/21	mié 20/10/21							
46		ENCOFRADO PARA ZAPATAS	1 día	jue 21/10/21	jue 21/10/21							
47		<b>VIGAS DE CONEXIÓN</b>	<b>13 días</b>	<b>mar 09/11/21</b>	<b>mar 23/11/21</b>							
48		CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTAC	1 día	lun 22/11/21	lun 22/11/21							

Proyecto: MODULO 3 (bloque 5)  
Fecha: lun 21/03/22






















Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	X	04 oct '21		18 oct '21		01 nov	
							L	S	J	M	D	V
49		ENCOFRADO PARA VIGAS DE CONEXIÓN	6 días	mié 17/11/21	mar 23/11/21							
50		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CON	7 días	mar 09/11/21	mar 16/11/21							
51		<b>SOBRECIMENTOS REFORZADOS</b>	<b>31 días</b>	<b>lun 22/11/21</b>	<b>mié 29/12/21</b>							
52		CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO f'c=175 kg/cm2	1 día	mar 28/12/21	mar 28/12/21							
53		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIEN	7 días	mar 21/12/21	mié 29/12/21							
54		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en SOBRECIMIEN	1 día	lun 22/11/21	lun 22/11/21							
55		<b>COLUMNAS</b>	<b>56 días</b>	<b>sáb 16/10/21</b>	<b>mié 22/12/21</b>							
56		CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	4 días	sáb 18/12/21	mié 22/12/21							
57		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLL	23 días	mar 23/11/21	lun 20/12/21							
58		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS	22 días	sáb 16/10/21	jue 11/11/21							
59		<b>VIGAS</b>	<b>28 días</b>	<b>mié 05/01/22</b>	<b>sáb 05/02/22</b>							
60		CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	2 días	vie 04/02/22	sáb 05/02/22							
61		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA	13 días	mié 05/01/22	mié 19/01/22							
62		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS	10 días	lun 10/01/22	jue 20/01/22							
63		<b>LOSAS ALIGERADAS</b>	<b>22 días</b>	<b>mié 12/01/22</b>	<b>sáb 05/02/22</b>							
64		CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2	2 días	vie 04/02/22	sáb 05/02/22							
65		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA	16 días	mié 12/01/22	sáb 29/01/22							
66		LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECH	3 días	jue 27/01/22	sáb 29/01/22							
67		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGER	8 días	vie 28/01/22	sáb 05/02/22							
68		<b>COLUMNETAS</b>	<b>56 días</b>	<b>vie 19/11/21</b>	<b>mié 26/01/22</b>							
69		CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 kg/cm2	1 día	mié 26/01/22	mié 26/01/22							
70		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLL	8 días	mar 18/01/22	mié 26/01/22							
71		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNETAS	2 días	vie 19/11/21	sáb 20/11/21							
72		<b>VIGA DE CONFINAMIENTO</b>	<b>3 días</b>	<b>lun 17/01/22</b>	<b>mié 19/01/22</b>							





















Proyecto: MODULO 3 (bloque 5) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	04 oct '21							18 oct '21		01 nov				
						X	L	S	J	M	D	V	X						
73		CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO f'c=175	1 día	mié 19/01/22	mié 19/01/22														
74		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA	3 días	lun 17/01/22	mié 19/01/22														
75		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CON	1 día	mar 18/01/22	mar 18/01/22														
76		ESCALERAS	3 días	jue 10/02/22	sáb 12/02/22														
77		CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2	1 día	sáb 12/02/22	sáb 12/02/22														
78		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCA	2 días	jue 10/02/22	vie 11/02/22														
79		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS	1 día	vie 11/02/22	vie 11/02/22														
80		LOSAS MACIZAS	3 días	lun 07/02/22	mié 09/02/22														
81		CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=210 kg/cm2	1 día	mié 09/02/22	mié 09/02/22														
82		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA	3 días	lun 07/02/22	mié 09/02/22														
83		ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS MACIZA	1 día	mar 08/02/22	mar 08/02/22														
84		VARIOS	105 días	lun 11/10/21	lun 14/02/22														
85		MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL	105 días	lun 11/10/21	lun 14/02/22														
86		ARQUITECTURA	74 días?	mié 01/12/21	lun 28/02/22														
87		ALBAÑILERIA	21 días?	mar 28/12/21	vie 21/01/22														
88		MURO DE LADRILLO DE ARCILLA 18 H (09x13x24) AMAF	21 días	mar 28/12/21	vie 21/01/22														
89		MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AM	1 día?	mar 28/12/21	mar 28/12/21														
90		REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	23 días	mar 18/01/22	sáb 12/02/22														
91		TARRAJEO PRIMARIO	5 días	mar 18/01/22	sáb 22/01/22														
92		TARRAJEO DE MUROS INTERIORES	14 días	mar 18/01/22	mié 02/02/22														
93		TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES	11 días	mar 18/01/22	sáb 29/01/22														
94		TARRAJEO COLUMNAS	23 días	mar 18/01/22	sáb 12/02/22														
95		TARRAJEO DE VIGAS	14 días	mar 18/01/22	mié 02/02/22														
96		TARRAJEO FONDO DE ESCALERAS	2 días	mar 18/01/22	mié 19/01/22														

Proyecto: MODULO 3 (bloque 5)  
Fecha: lun 21/03/22





















Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	04 oct '21							18 oct '21		01 nov '21		
						X	L	S	J	M	D	V	X				
97		PREPARACION DE GRADAS DE ESCALERA DE CONCR	2 días	mar 18/01/22	mié 19/01/22												
98		PREPARACION DE DESCANZO DE ESCALERA C:A 1:8 e	1 día	mar 18/01/22	mar 18/01/22												
99		CIELORRASOS	16 días	lun 07/02/22	jue 24/02/22												
100		TARRAJEO CIELO RASO	16 días	lun 07/02/22	jue 24/02/22												
101		PISOS Y PAVIMENTOS	8 días	mié 01/12/21	vie 10/12/21												
102		CONTRAPISOS	5 días	mié 01/12/21	lun 06/12/21												
103		CONTRAPISO DE 5 cm	5 días	mié 01/12/21	lun 06/12/21												
104		PISOS	5 días	sáb 04/12/21	vie 10/12/21												
105		PISO DE CEMENTO PULIDO	3 días	lun 06/12/21	jue 09/12/21												
106		PISO CERAMICO CELIMA 30x30 cm STONE GRIS	5 días	sáb 04/12/21	vie 10/12/21												
107		ZOCALOS	9 días	jue 09/12/21	sáb 18/12/21												
108		ZOCALO DE CERAMICA 30X30 cm	9 días	jue 09/12/21	sáb 18/12/21												
109		CARPINTERIA DE MADERA	5 días	mié 23/02/22	lun 28/02/22												
110		Puertas	5 días	mié 23/02/22	lun 28/02/22												
111		PUERTA P2 0.75 x 2.1 m	2 días	mié 23/02/22	jue 24/02/22												
112		PUERTA P3 0.90 x 2.1 m.	5 días	mié 23/02/22	lun 28/02/22												
113		PUERTA P4 1.25 x 2.1 m	2 días	mié 23/02/22	jue 24/02/22												
114		PUERTA P5 1.40 x 2.1 m	2 días	mié 23/02/22	jue 24/02/22												
115		PUERTA P6 0.65 x 1.2 m	2 días	mié 23/02/22	jue 24/02/22												
116		DIVICION DE MADERA DE BAÑOS H=1.20	1 día	mié 23/02/22	mié 23/02/22												
117		CARPINTERIA METALICA	8 días	sáb 19/02/22	lun 28/02/22												
118		PUERTA METALICA DOS HOJAS PIVOTANTE CON PLAN	1 día	vie 25/02/22	vie 25/02/22												
119		BARANDAS METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 "	2 días	vie 25/02/22	sáb 26/02/22												
120		PUERTAS ENROLLABLES DE FIERRO	8 días	sáb 19/02/22	lun 28/02/22												





















Proyecto: MODULO 3 (bloque 5) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	X	04 oct '21				18 oct '21				01 nov	
							L	S	J	M	D	V	X			
121		<b>CERRAJERIA</b>	<b>1 día?</b>	<b>mié 23/02/22</b>	<b>mié 23/02/22</b>											
122		BISAGRA 3.5" X 3.5"	1 día?	mié 23/02/22	mié 23/02/22											
123		BISAGRA 2.5" X 2.5"	1 día?	mié 23/02/22	mié 23/02/22											
124		CERRADURA 3 GOLPES	1 día?	mié 23/02/22	mié 23/02/22											
125		CERRADURA DE POMO	1 día	mié 23/02/22	mié 23/02/22											
126		MANIJA PARA PUERTA DE BRONCE	1 día	mié 23/02/22	mié 23/02/22											
127		CERROJO PARA PUERTA	1 día	mié 23/02/22	mié 23/02/22											
128		<b>PINTURAS</b>	<b>7 días</b>	<b>vie 18/02/22</b>	<b>vie 25/02/22</b>											
129		PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	5 días	vie 18/02/22	mié 23/02/22											
130		PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	5 días	vie 18/02/22	mié 23/02/22											
131		PINTURA LATEX A 2 MANOS COLUMNAS	6 días	vie 18/02/22	jue 24/02/22											
132		PINTURA LATEX A 2 MANOS VIGAS	4 días	vie 18/02/22	mar 22/02/22											
133		PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 MANOS	7 días	vie 18/02/22	vie 25/02/22											
134		<b>OTROS</b>	<b>1 día?</b>	<b>vie 25/02/22</b>	<b>vie 25/02/22</b>											
135		CONTENEDORES DE BASURA 120 L	1 día?	vie 25/02/22	vie 25/02/22											
136		KIT PUNTO ECOLOGICO 3 CUERPOS	1 día?	vie 25/02/22	vie 25/02/22											
137		<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>	<b>111 días?</b>	<b>lun 11/10/21</b>	<b>lun 21/02/22</b>											
138		<b>APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>	<b>3 días</b>	<b>vie 18/02/22</b>	<b>lun 21/02/22</b>											
139		INODORO ONE PIECE INC. ACCESORIOS	3 días	vie 18/02/22	lun 21/02/22											
140		URINARIO INC. ACCESORIOS	2 días	vie 18/02/22	sáb 19/02/22											
141		LAVATORIO OVALIN BLANCO UNC. GRIFERIA	3 días	vie 18/02/22	lun 21/02/22											
142		LAVADERO ACERO INOXIDABLE INC/GRIFERIA 02	1 día	vie 18/02/22	vie 18/02/22											
143		DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	1 día	vie 18/02/22	vie 18/02/22											
144		DISPENSADOR DE JABON	1 día	vie 18/02/22	vie 18/02/22											

Proyecto: MODULO 3 (bloque 5)  
Fecha: lun 21/03/22





















Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin							
						X	04 oct '21	L	S	J	18 oct '21	M
145		PAPELERA PLASTICO C/BLANCO	1 día	vie 18/02/22	vie 18/02/22							


Proyecto: MODULO 3 (bloque 5) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





















Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	X	04 oct '21				18 oct '21				01 nov	
							L	S	J	M	D	V	X			
169		SALIDA DE VENTILACION PVC 2"	2 días	mar 30/11/21	mié 01/12/21											
170		<b>RED DE DERIVACION</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 30/11/21</b>	<b>mié 01/12/21</b>											
171		TUBERIA PARA DESAGUE PVC - SAL DE 2"	2 días	mar 30/11/21	mié 01/12/21											
172		TUBERIA PARA DESAGUE PVC - SAL DE 4"	2 días	mar 30/11/21	mié 01/12/21											
173		<b>ACCESORIOS DE REDES</b>	<b>2 días?</b>	<b>mar 30/11/21</b>	<b>mié 01/12/21</b>											
174		YEE PVC 2"	1 día?	mar 30/11/21	mar 30/11/21											
175		YEE PVC 4"	1 día?	mar 30/11/21	mar 30/11/21											
176		YEE PVC 4" a 2"	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21											
177		CODOS 45° PVC 2"	2 días	mar 30/11/21	mié 01/12/21											
178		CODOS 45° PVC 4"	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21											
179		SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	1 día	mar 30/11/21	mar 30/11/21											
180		REGISTRO DE BRONCE 4"	2 días	mar 30/11/21	mié 01/12/21											
181		CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" con registro de 8"	2 días	mar 30/11/21	mié 01/12/21											
182		<b>SISTEMA CONTRA INCENDIO</b>	<b>44 días</b>	<b>lun 11/10/21</b>	<b>mié 01/12/21</b>											
183		<b>TUBERIAS</b>	<b>2 días</b>	<b>mar 30/11/21</b>	<b>mié 01/12/21</b>											
184		TUBERIA 2 1/2" ACERO SCH 40	2 días	mar 30/11/21	mié 01/12/21											
185		<b>VARIOS</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 11/10/21</b>	<b>lun 11/10/21</b>											
186		GABINETE CONTRA INCENDIO	1 día	lun 11/10/21	lun 11/10/21											
187		<b>PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS</b>	<b>1 día?</b>	<b>jue 02/12/21</b>	<b>jue 02/12/21</b>											
188		PRUEBA HIDRAULICA	1 día?	jue 02/12/21	jue 02/12/21											
189		<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>	<b>30 días?</b>	<b>mar 18/01/22</b>	<b>lun 21/02/22</b>											
190		<b>SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA</b>	<b>30 días?</b>	<b>mar 18/01/22</b>	<b>lun 21/02/22</b>											
191		<b>SALIDAS</b>	<b>9 días</b>	<b>vie 21/01/22</b>	<b>lun 31/01/22</b>											
192		SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	4 días	jue 27/01/22	lun 31/01/22											


Proyecto: MODULO 3 (bloque 5)  
Fecha: lun 21/03/22





















Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	04 oct '21							18 oct '21		01 nov	
						X	L	S	J	M	D	V	X			
193		SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	4 días	vie 21/01/22	mar 25/01/22											
194		SALIDA INTERRUPTOR COMNUTACION	2 días	vie 21/01/22	sáb 22/01/22											
195		SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA	3 días	vie 21/01/22	lun 24/01/22											
196		SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIE	3 días	vie 21/01/22	lun 24/01/22											
197		SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO Y TEMPERA	2 días	jue 27/01/22	vie 28/01/22											
198		SALIDA PARA ESTACION MANUAL	1 día	vie 21/01/22	vie 21/01/22											
199		SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE	1 día	vie 21/01/22	vie 21/01/22											
200		AGUIA SALIDA PARA BRAQUETE	1 día	vie 21/01/22	vie 21/01/22											
201		CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS	6 días	jue 27/01/22	mié 02/02/22											
202		TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm	6 días	jue 27/01/22	mié 02/02/22											
203		TUBERIA TIPO CONDUIT 20 mm (SENSORES DE HUM	2 días	jue 27/01/22	vie 28/01/22											
204		TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm	1 día	jue 27/01/22	jue 27/01/22											
205		CABLES	2 días	lun 07/02/22	mar 08/02/22											
206		CABLE TW 2.5 mm2	2 días	lun 07/02/22	mar 08/02/22											
207		CABLE TW 4 mm2	1 día	lun 07/02/22	lun 07/02/22											
208		CAJAS	1 día?	jue 27/01/22	jue 27/01/22											
209		CAJA DE PASE CUADRADA 100 x 100 x 100 mm	1 día?	jue 27/01/22	jue 27/01/22											
210		TABLEROS ELECTRICOS	3 días	mar 18/01/22	jue 20/01/22											
211		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	3 días	mar 18/01/22	jue 20/01/22											
212		TABLERO DE DISTRIBUCION EMPOTRADO	3 días	mar 18/01/22	jue 20/01/22											
213		SISTEMA DE TIERRA	2 días	mar 18/01/22	mié 19/01/22											
214		POZO A TIERRA	2 días	mar 18/01/22	mié 19/01/22											
215		ARTEFACTOS DE ALUMBRADO	2 días	sáb 19/02/22	lun 21/02/22											
216		ARTEFACTO TIPO PHILIPS FOCO LED BULBO A60 7.	2 días	sáb 19/02/22	lun 21/02/22											

Proyecto: MODULO 3 (bloque 5) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	X	04 oct '21				18 oct '21				01 nov	
							L	S	J	M	D	V	X			
217		EQUIPO DOWNLIGHT REDONDO 24w	2 días	sáb 19/02/22	lun 21/02/22											
218		LUZ DE EMERGENCIA	2 días	sáb 19/02/22	lun 21/02/22											
219		<b>SISTEMA CONTRA INCENDIO</b>	<b>1 día</b>	<b>sáb 19/02/22</b>	<b>sáb 19/02/22</b>											
220		DETECTORES DE HUMO	1 día	sáb 19/02/22	sáb 19/02/22											
221		ESTACION MANUAL CONTRA INCENDIO	1 día	sáb 19/02/22	sáb 19/02/22											
222		SIRENA DE ALARMA CONTRA INCENDIO	1 día	sáb 19/02/22	sáb 19/02/22											


Proyecto: MODULO 3 (bloque 5) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




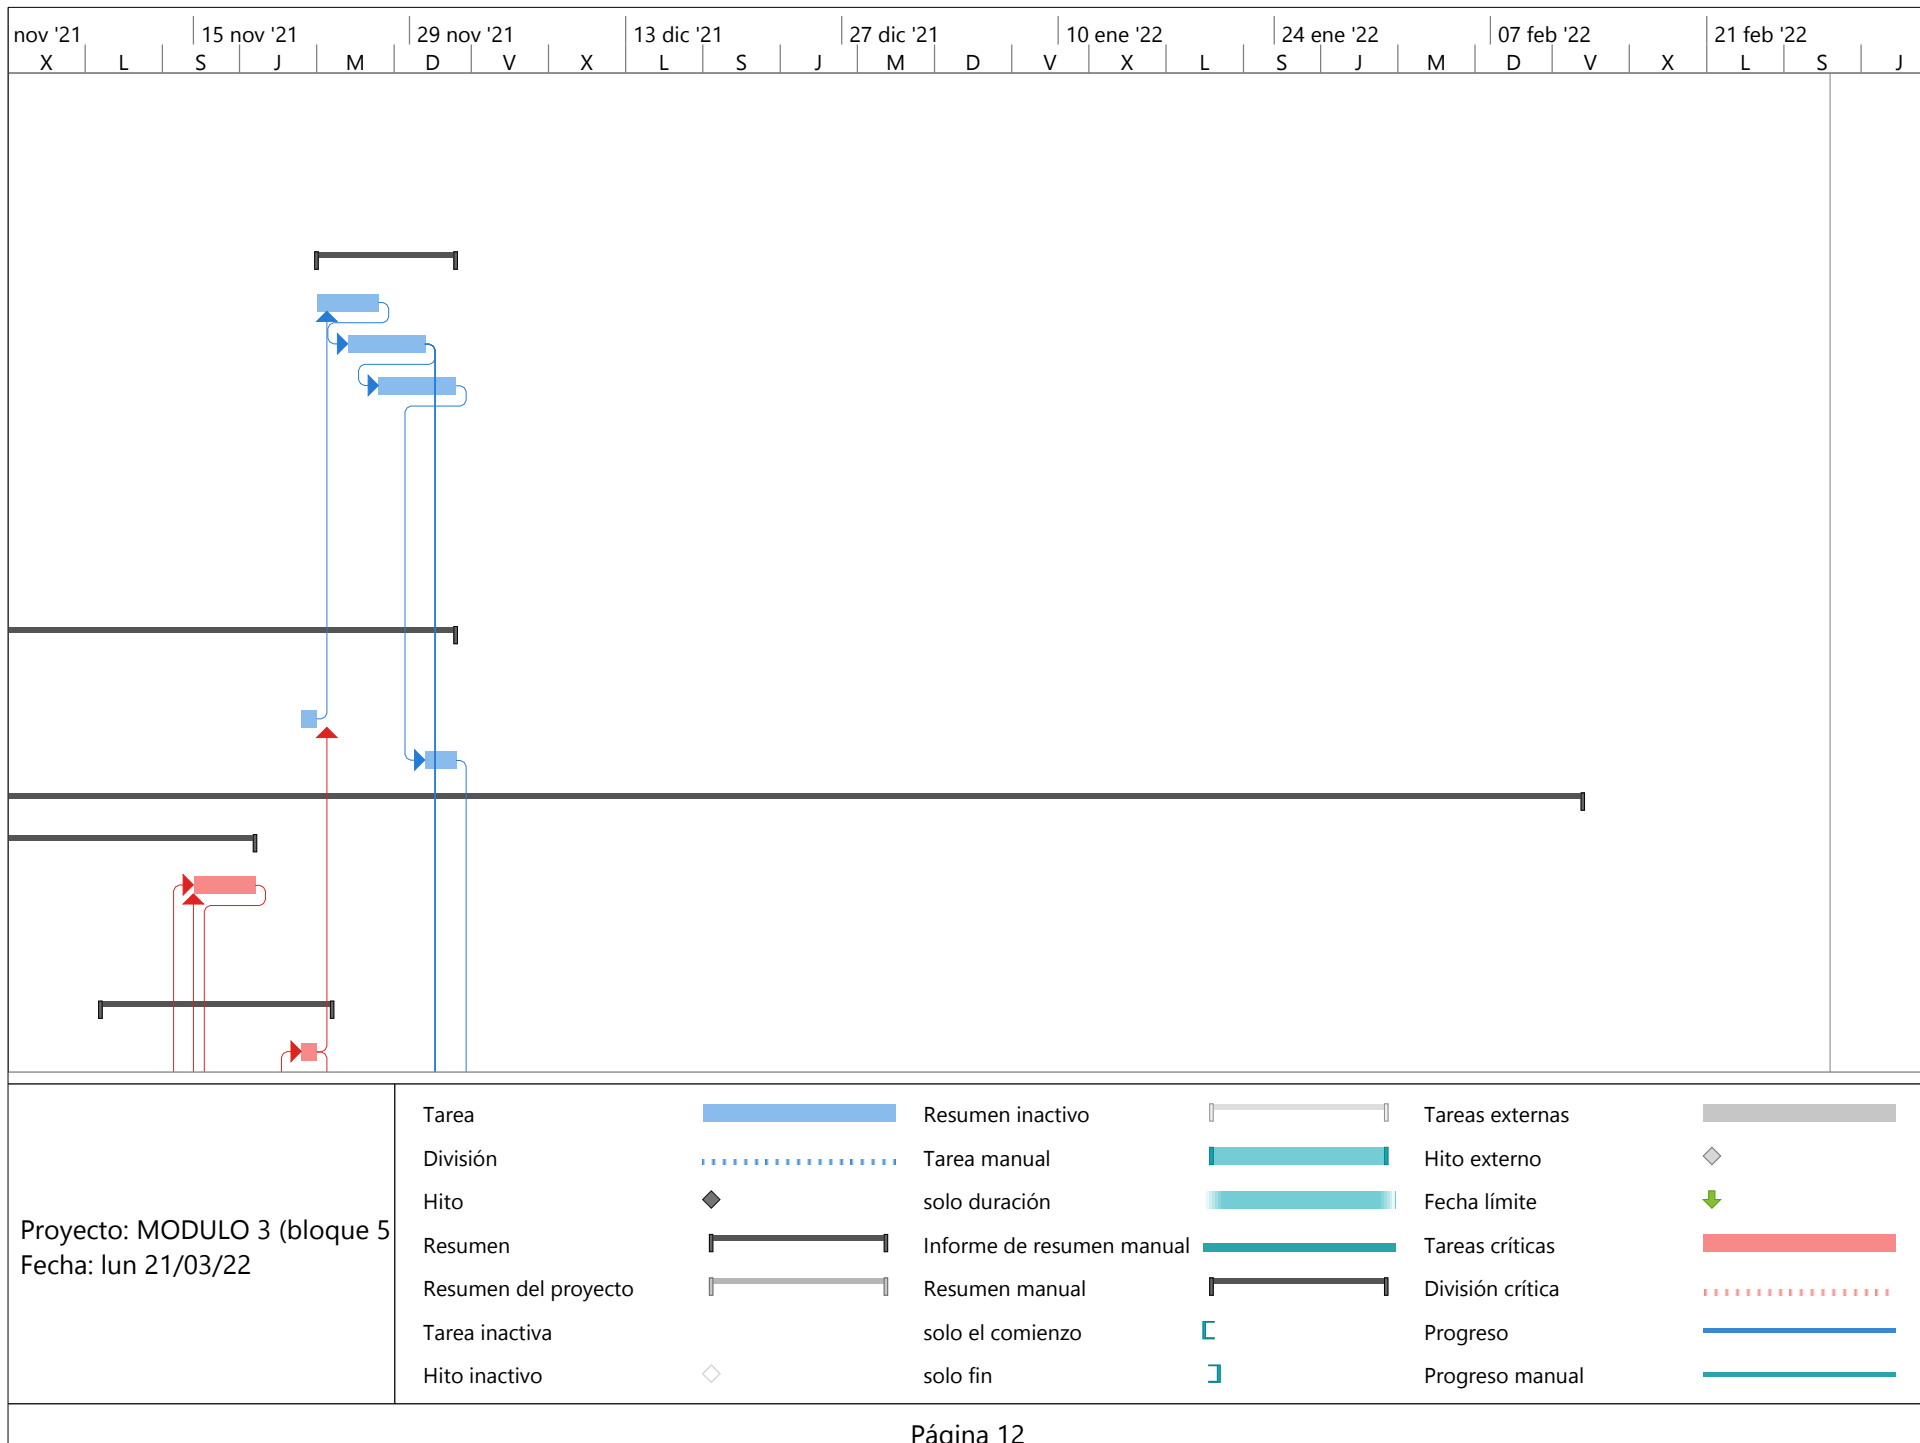




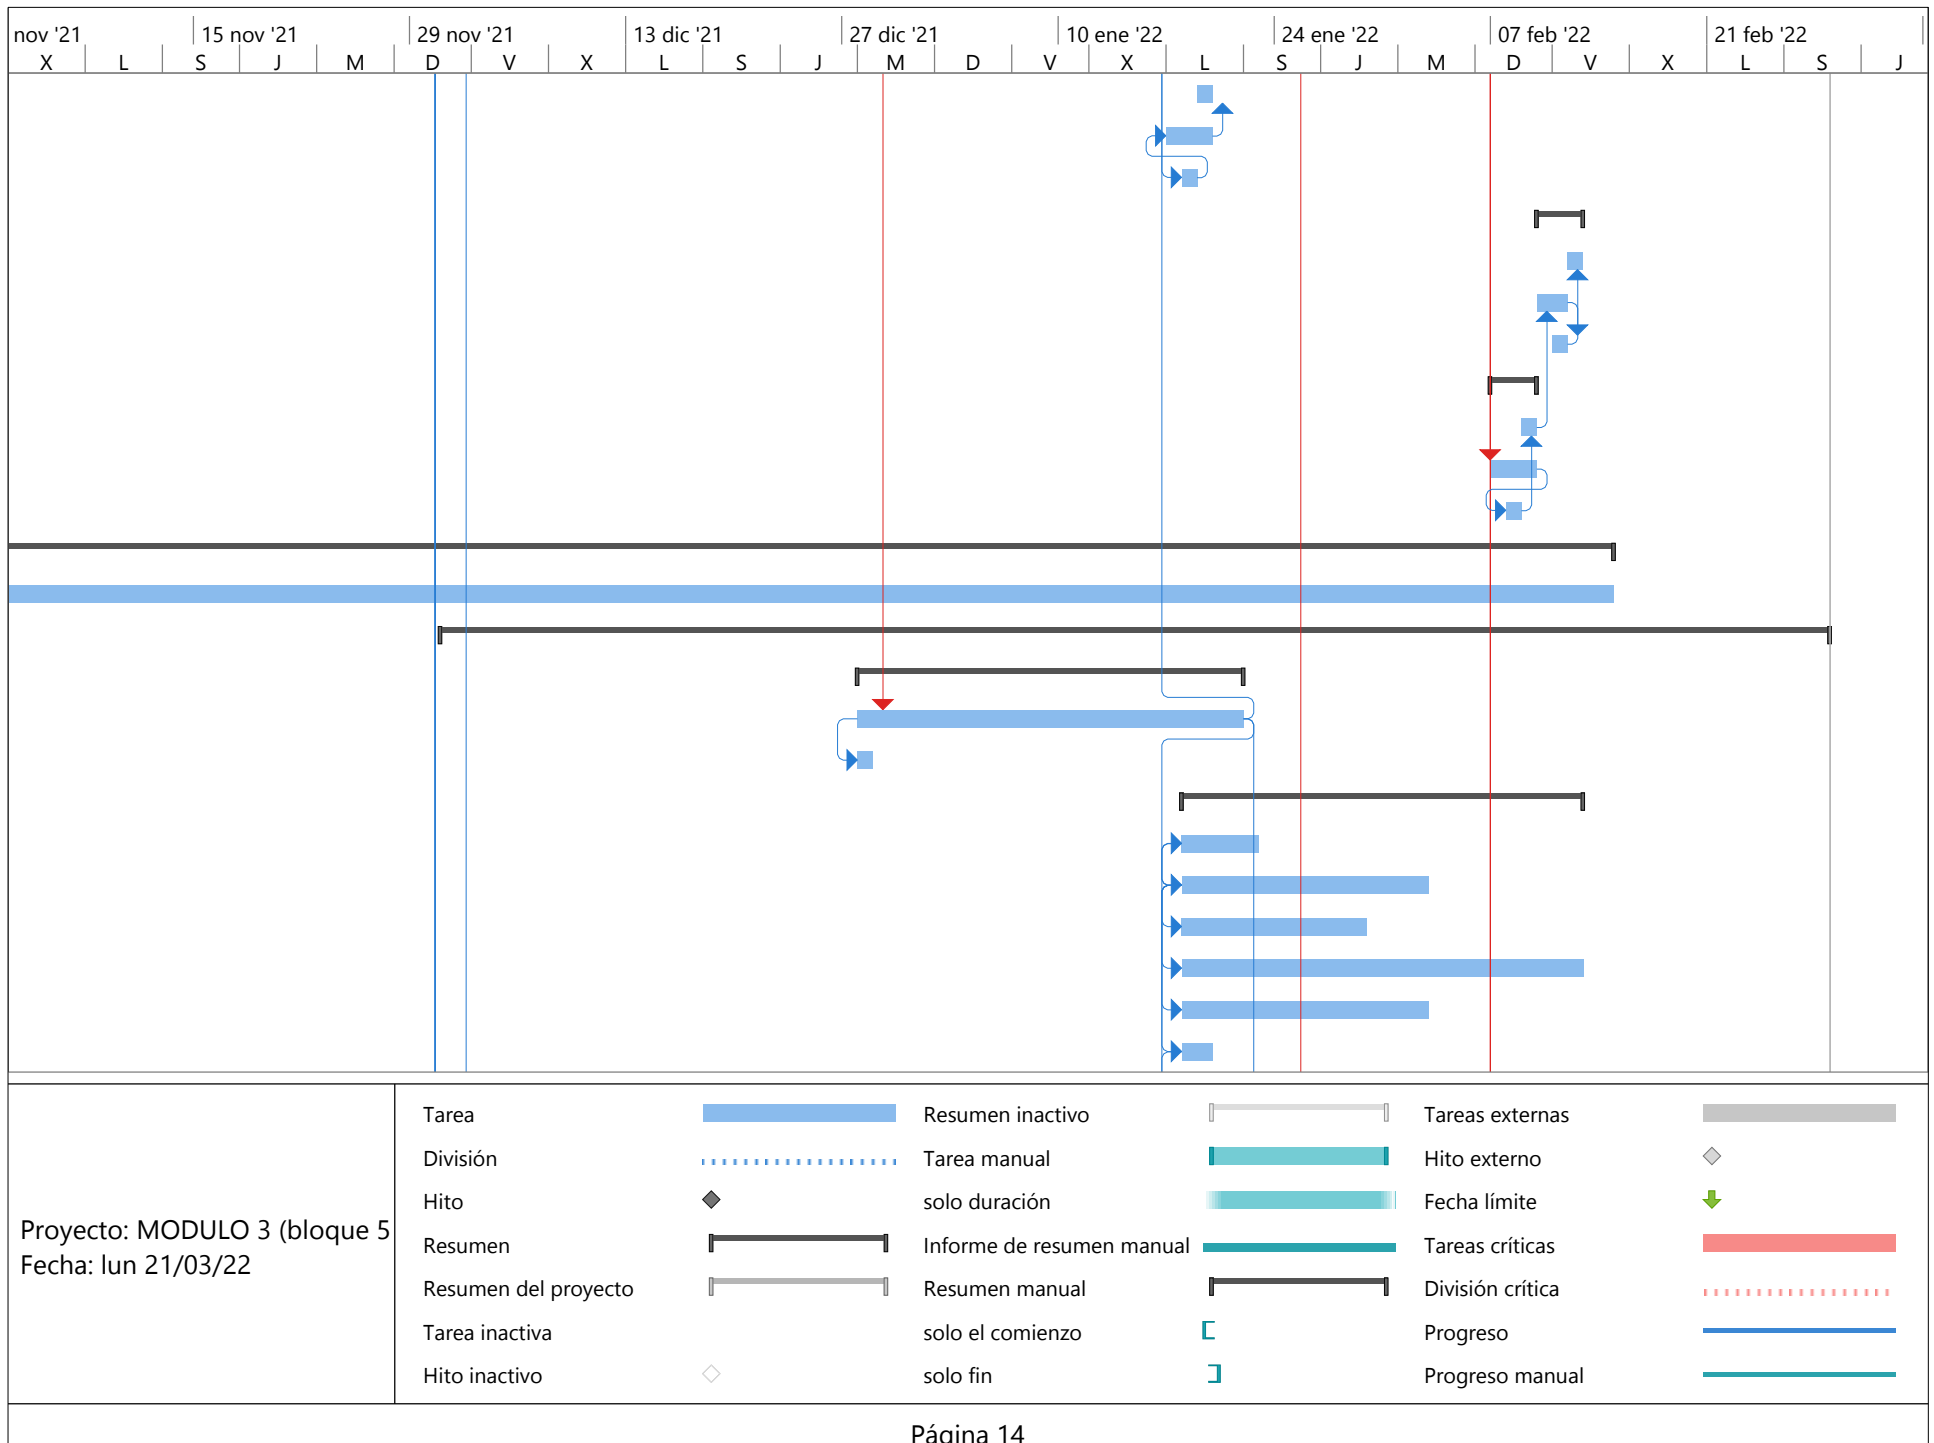


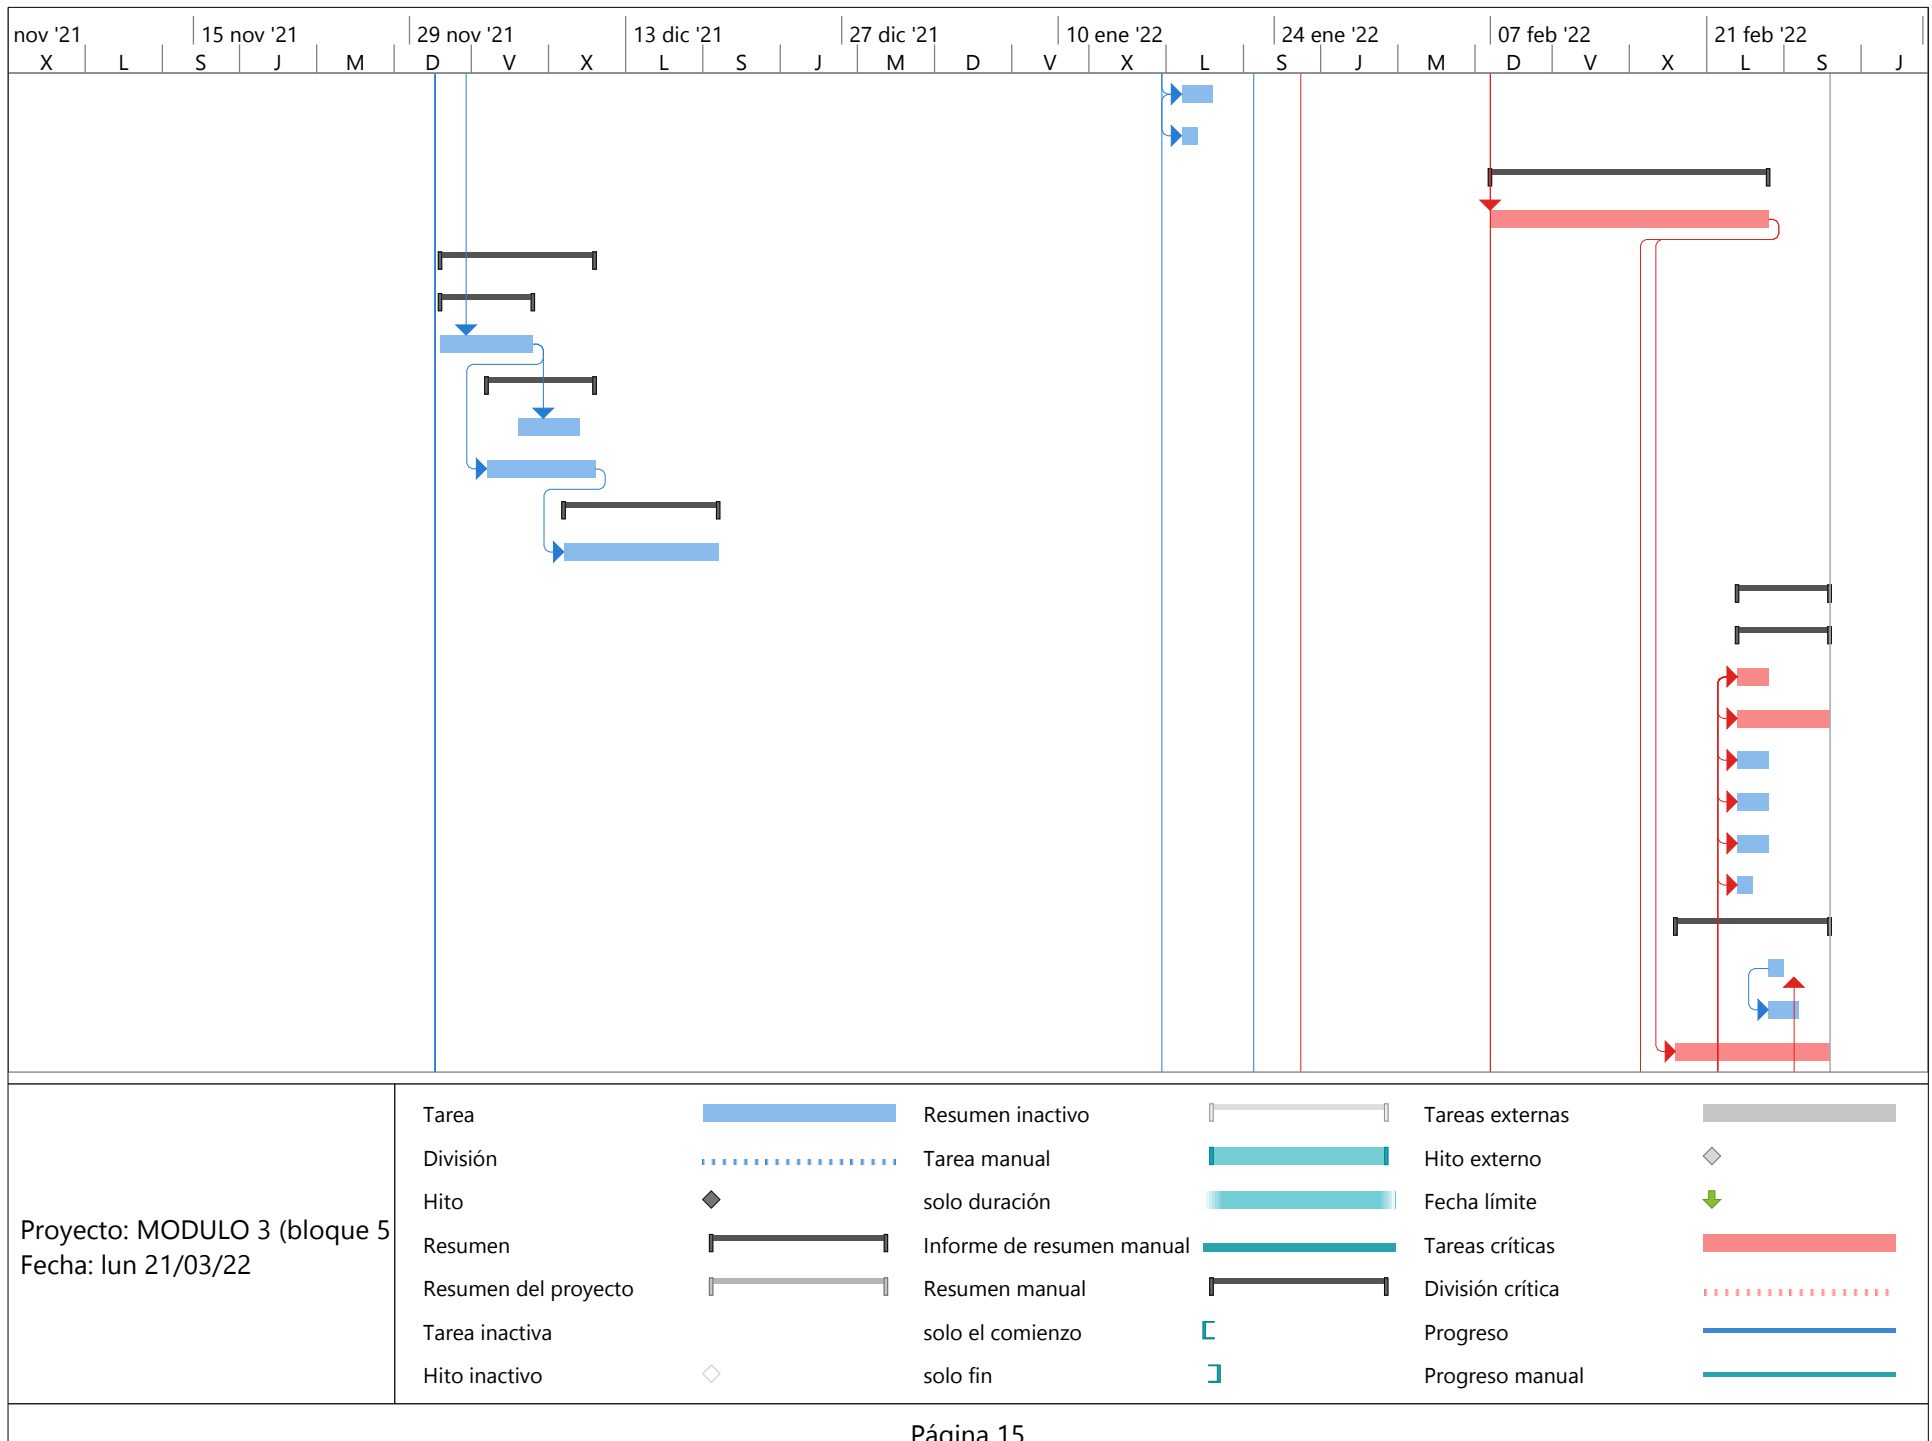

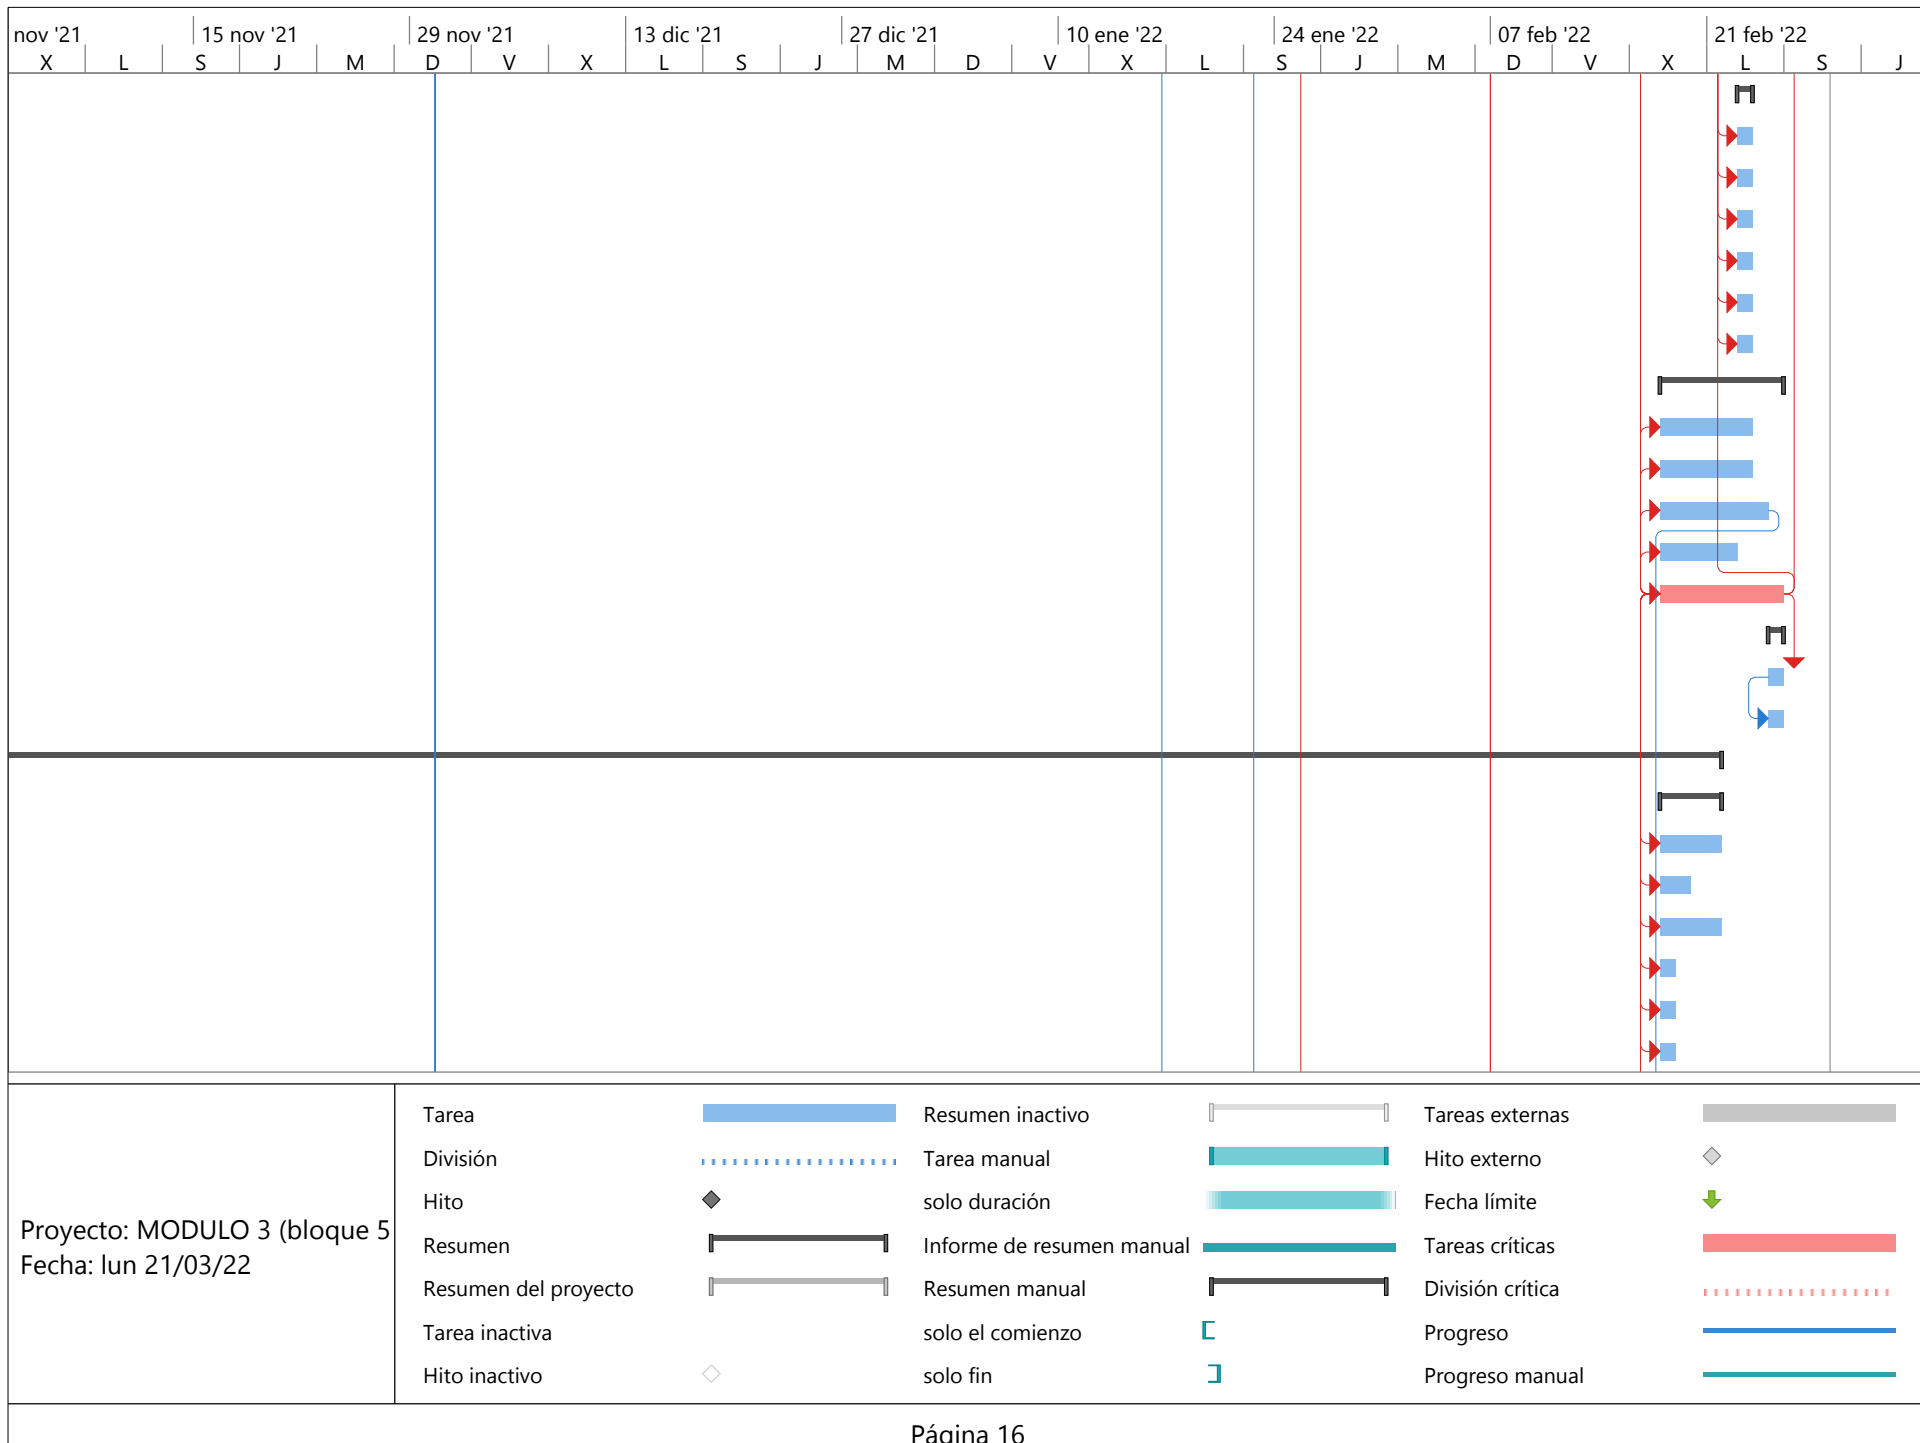




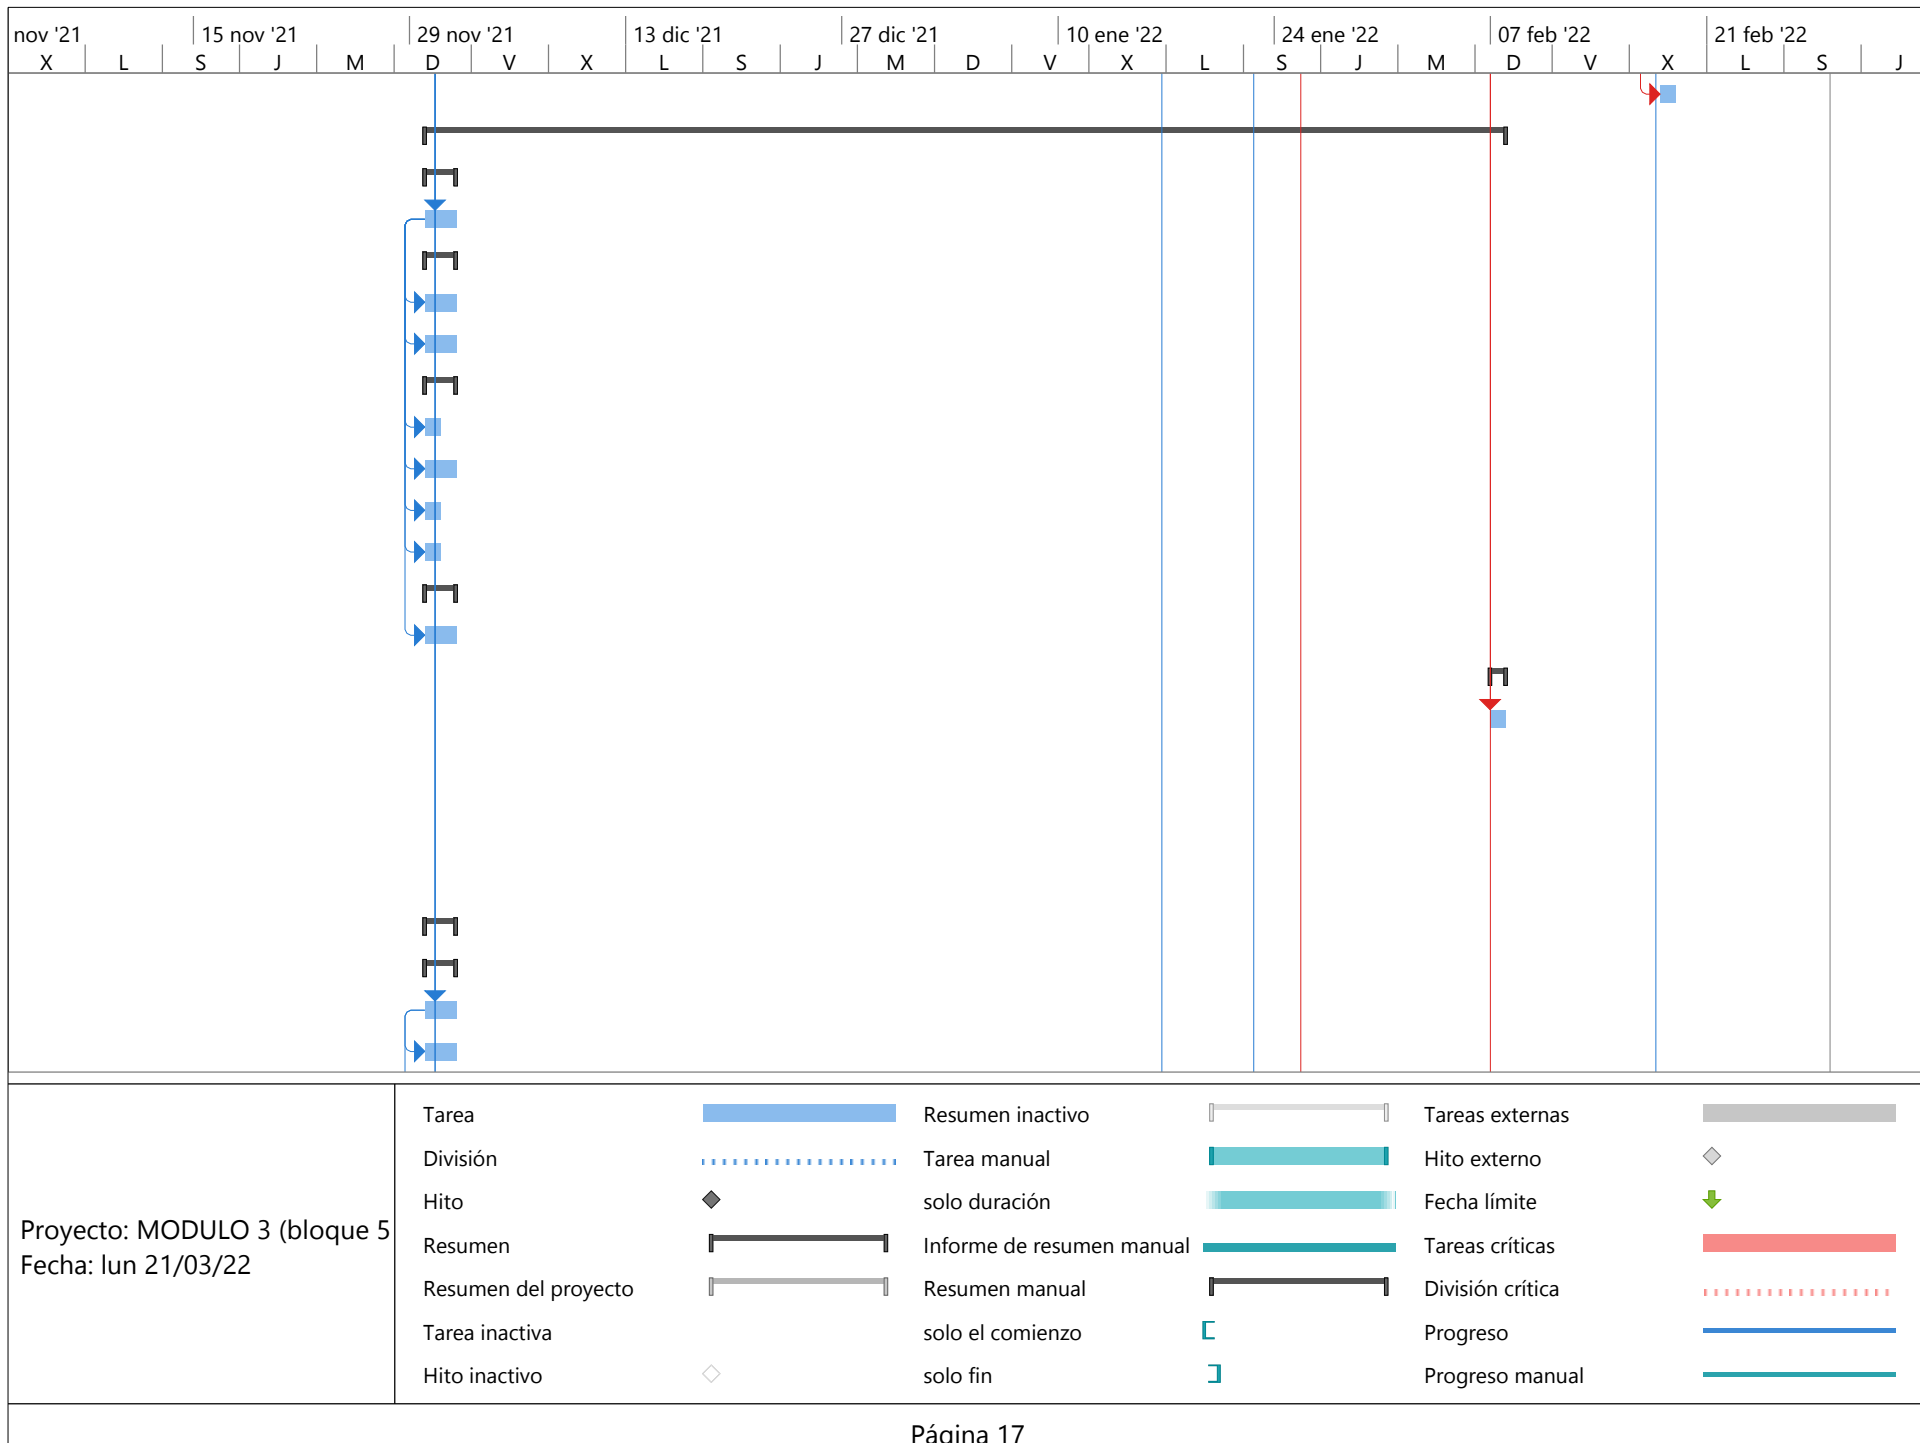

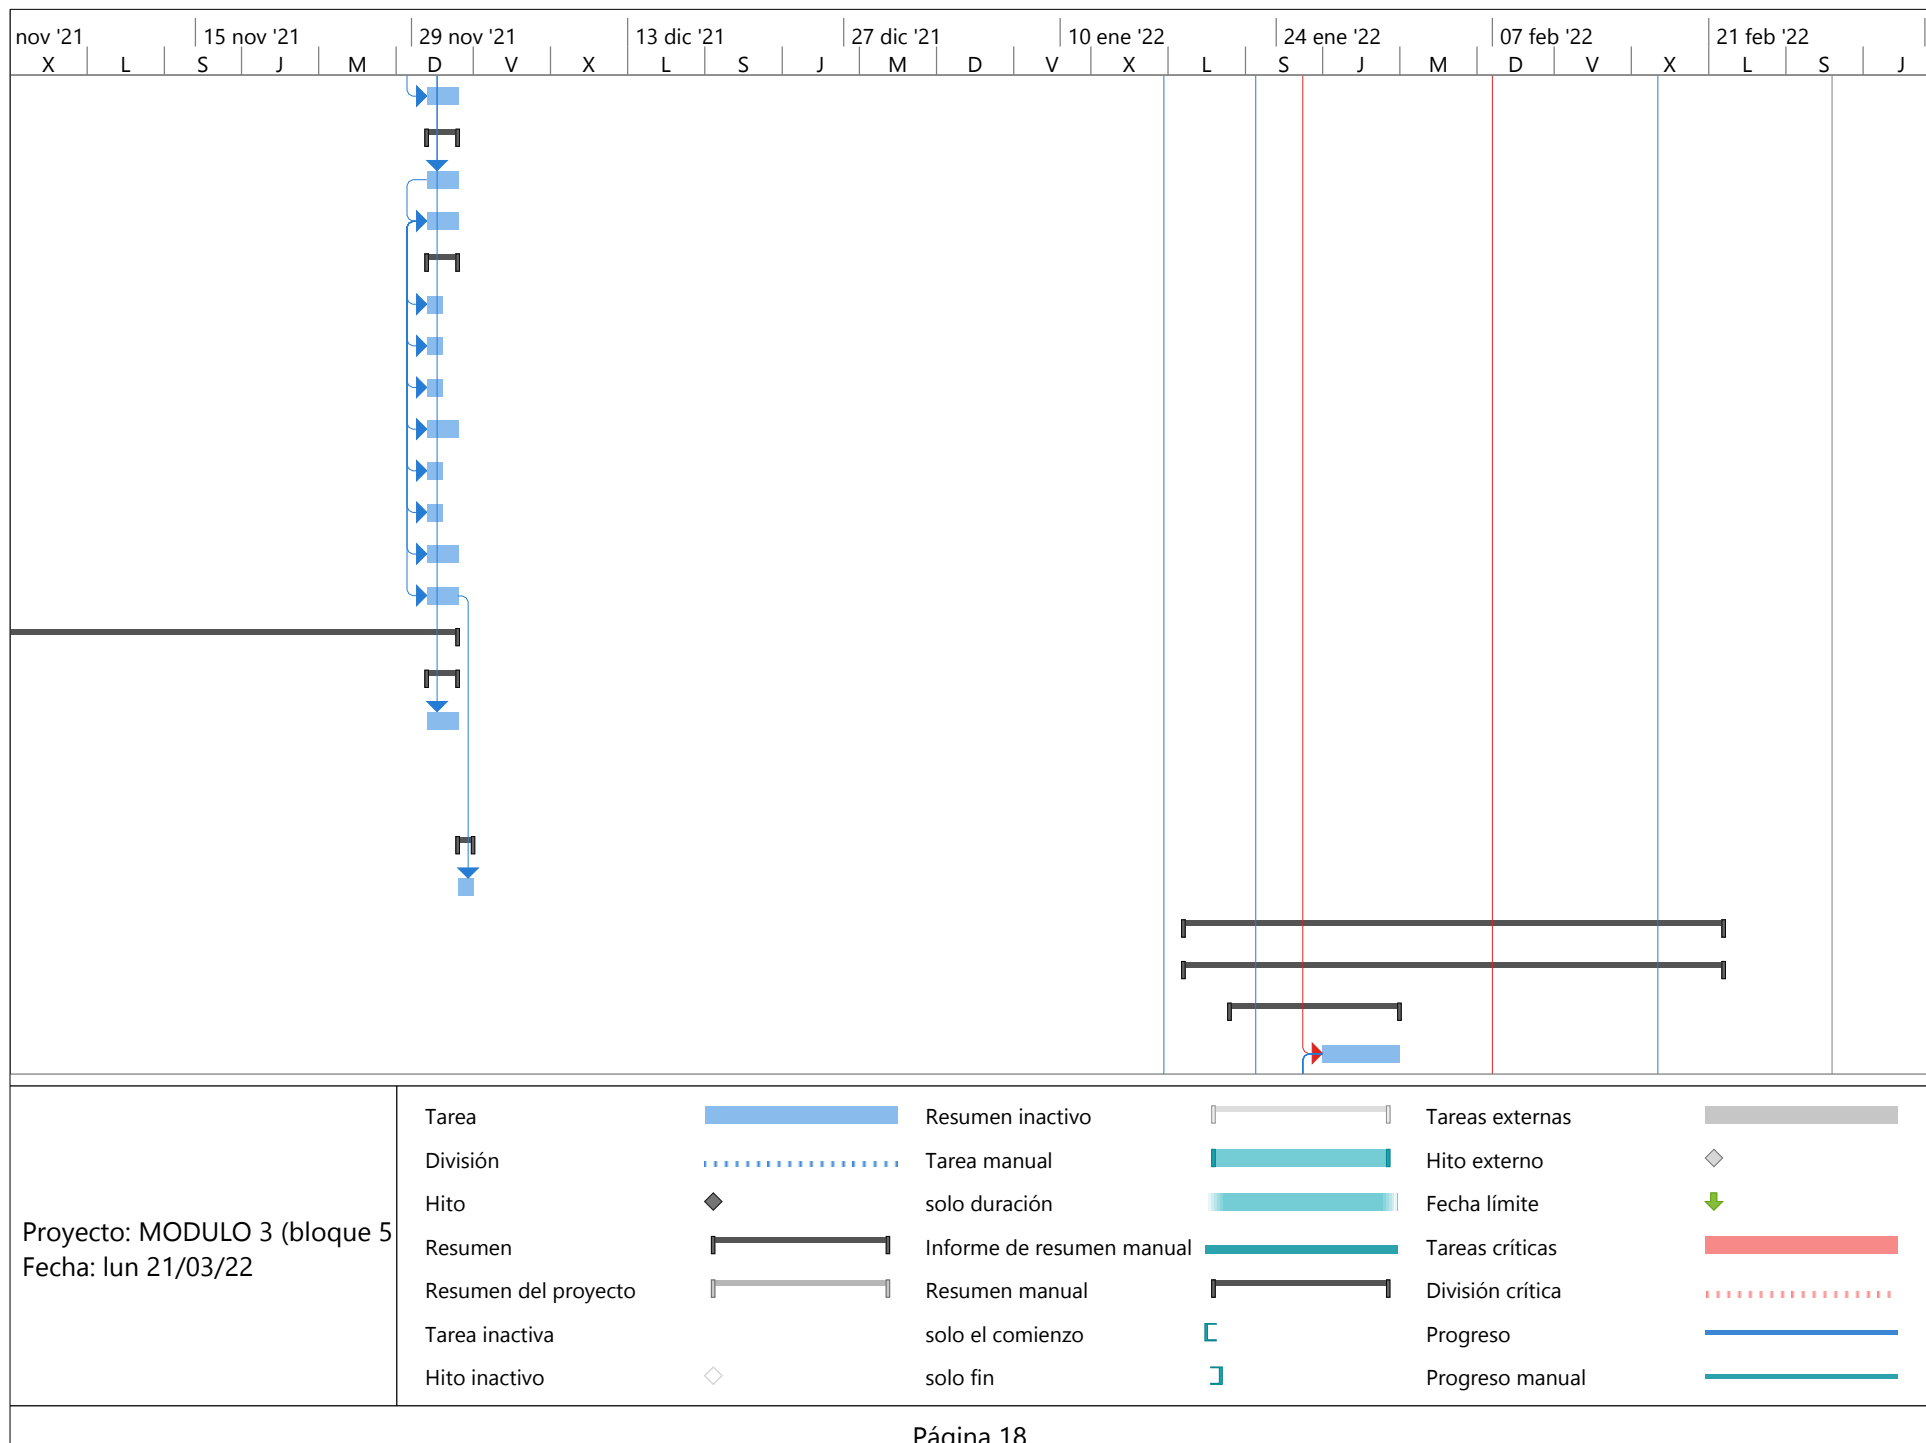





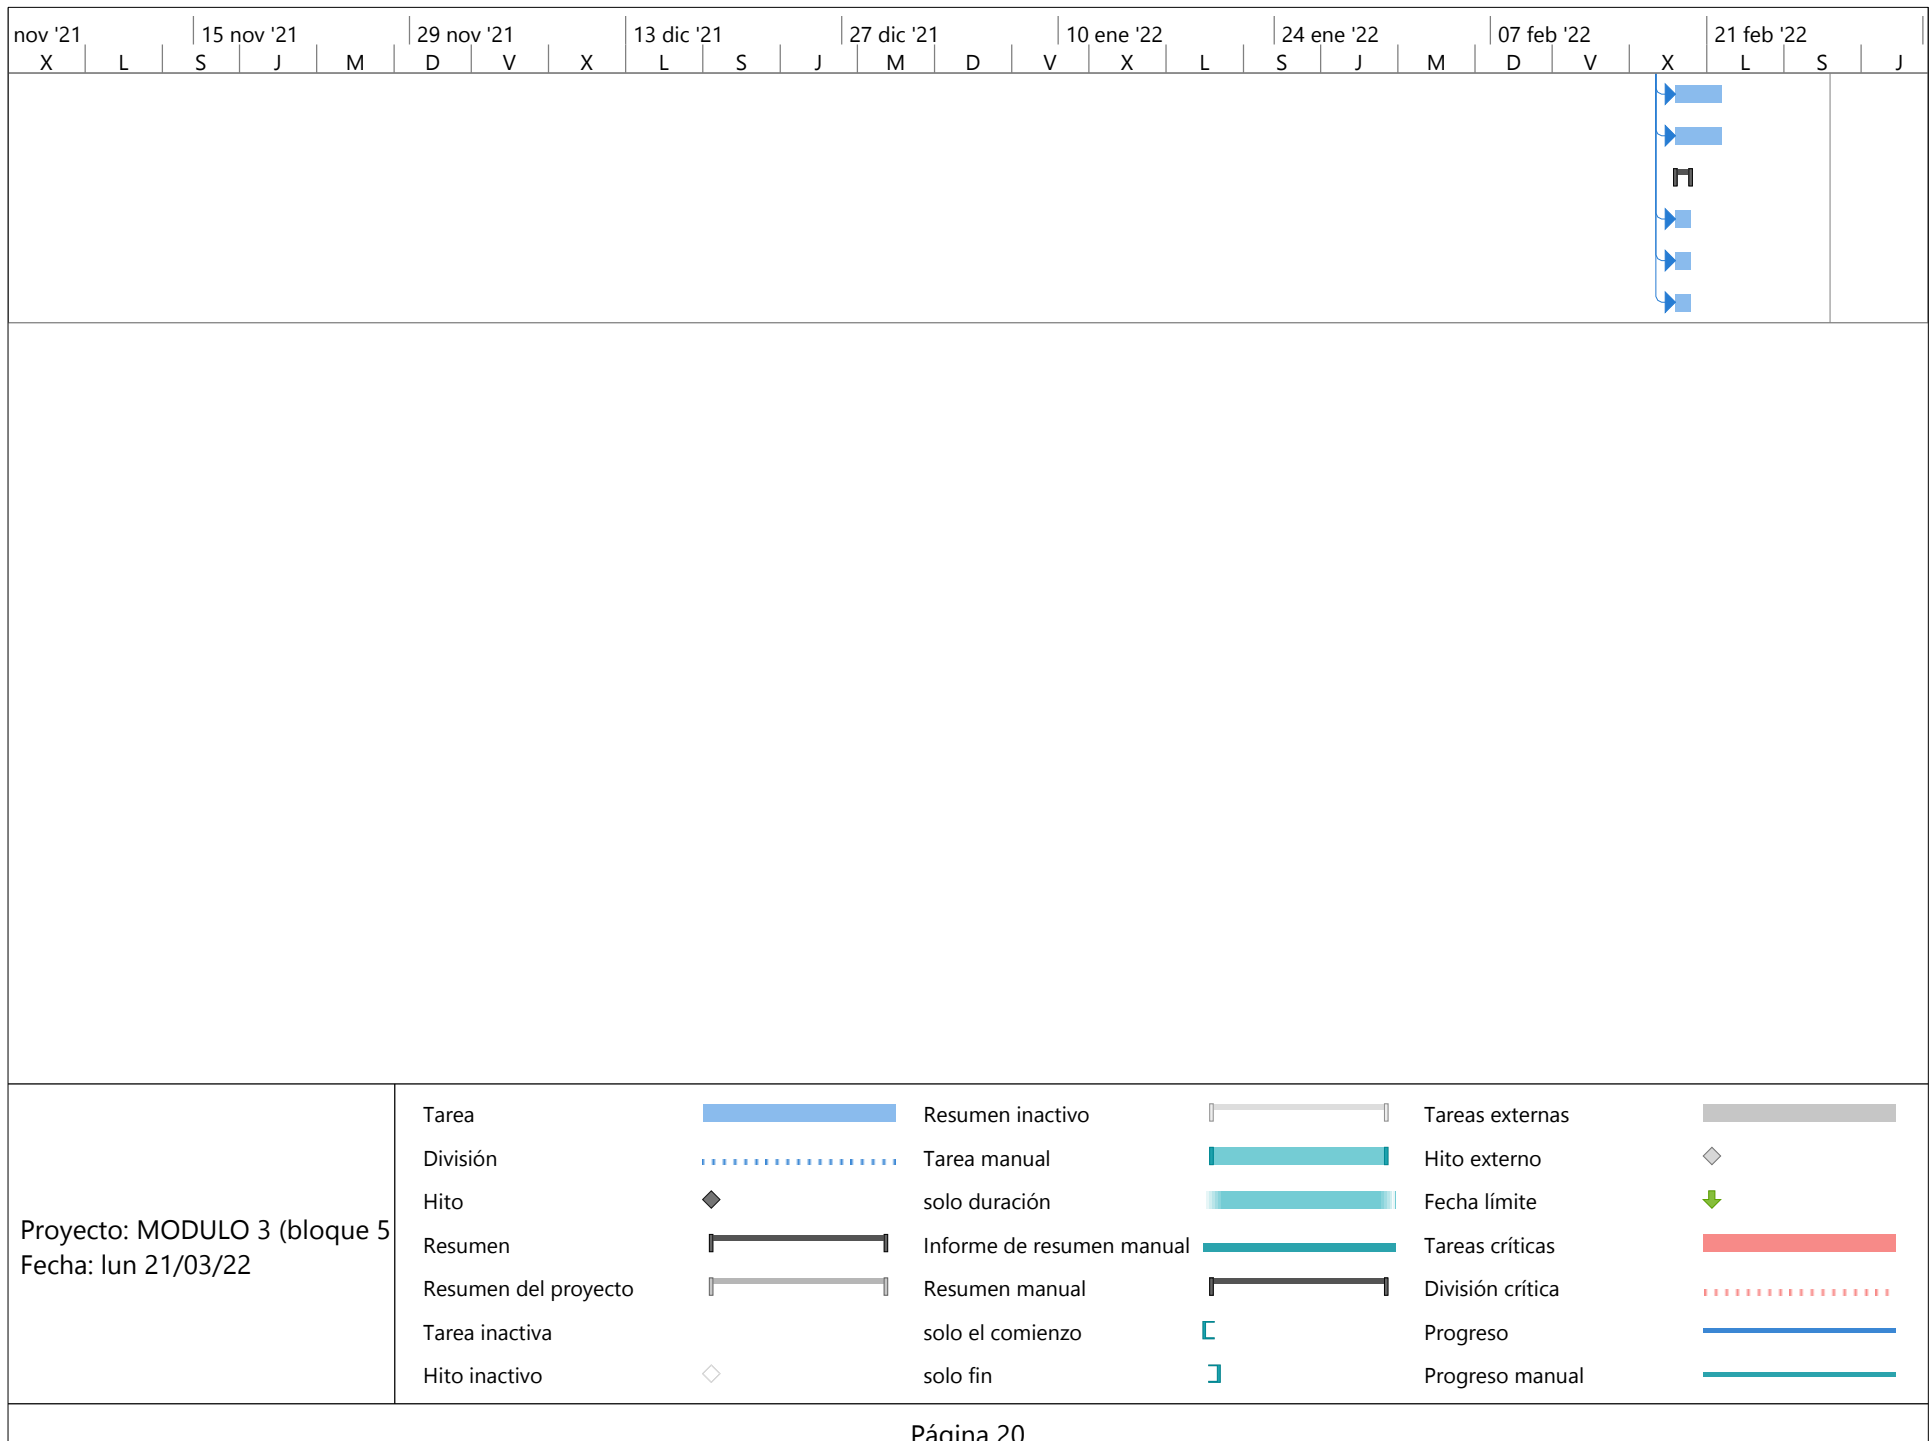





















































J	07 mar '22			V	21 mar '22			X	L	S	04 abr '22			J	M	18 abr '22			D	V	X	02 may '22			J	16 may '22			M	D	V	30 may '22			X	L	S	13 jun '22			J	M	27 jun '22			D	V			


Proyecto: MODULO 3 (bloque 5) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	







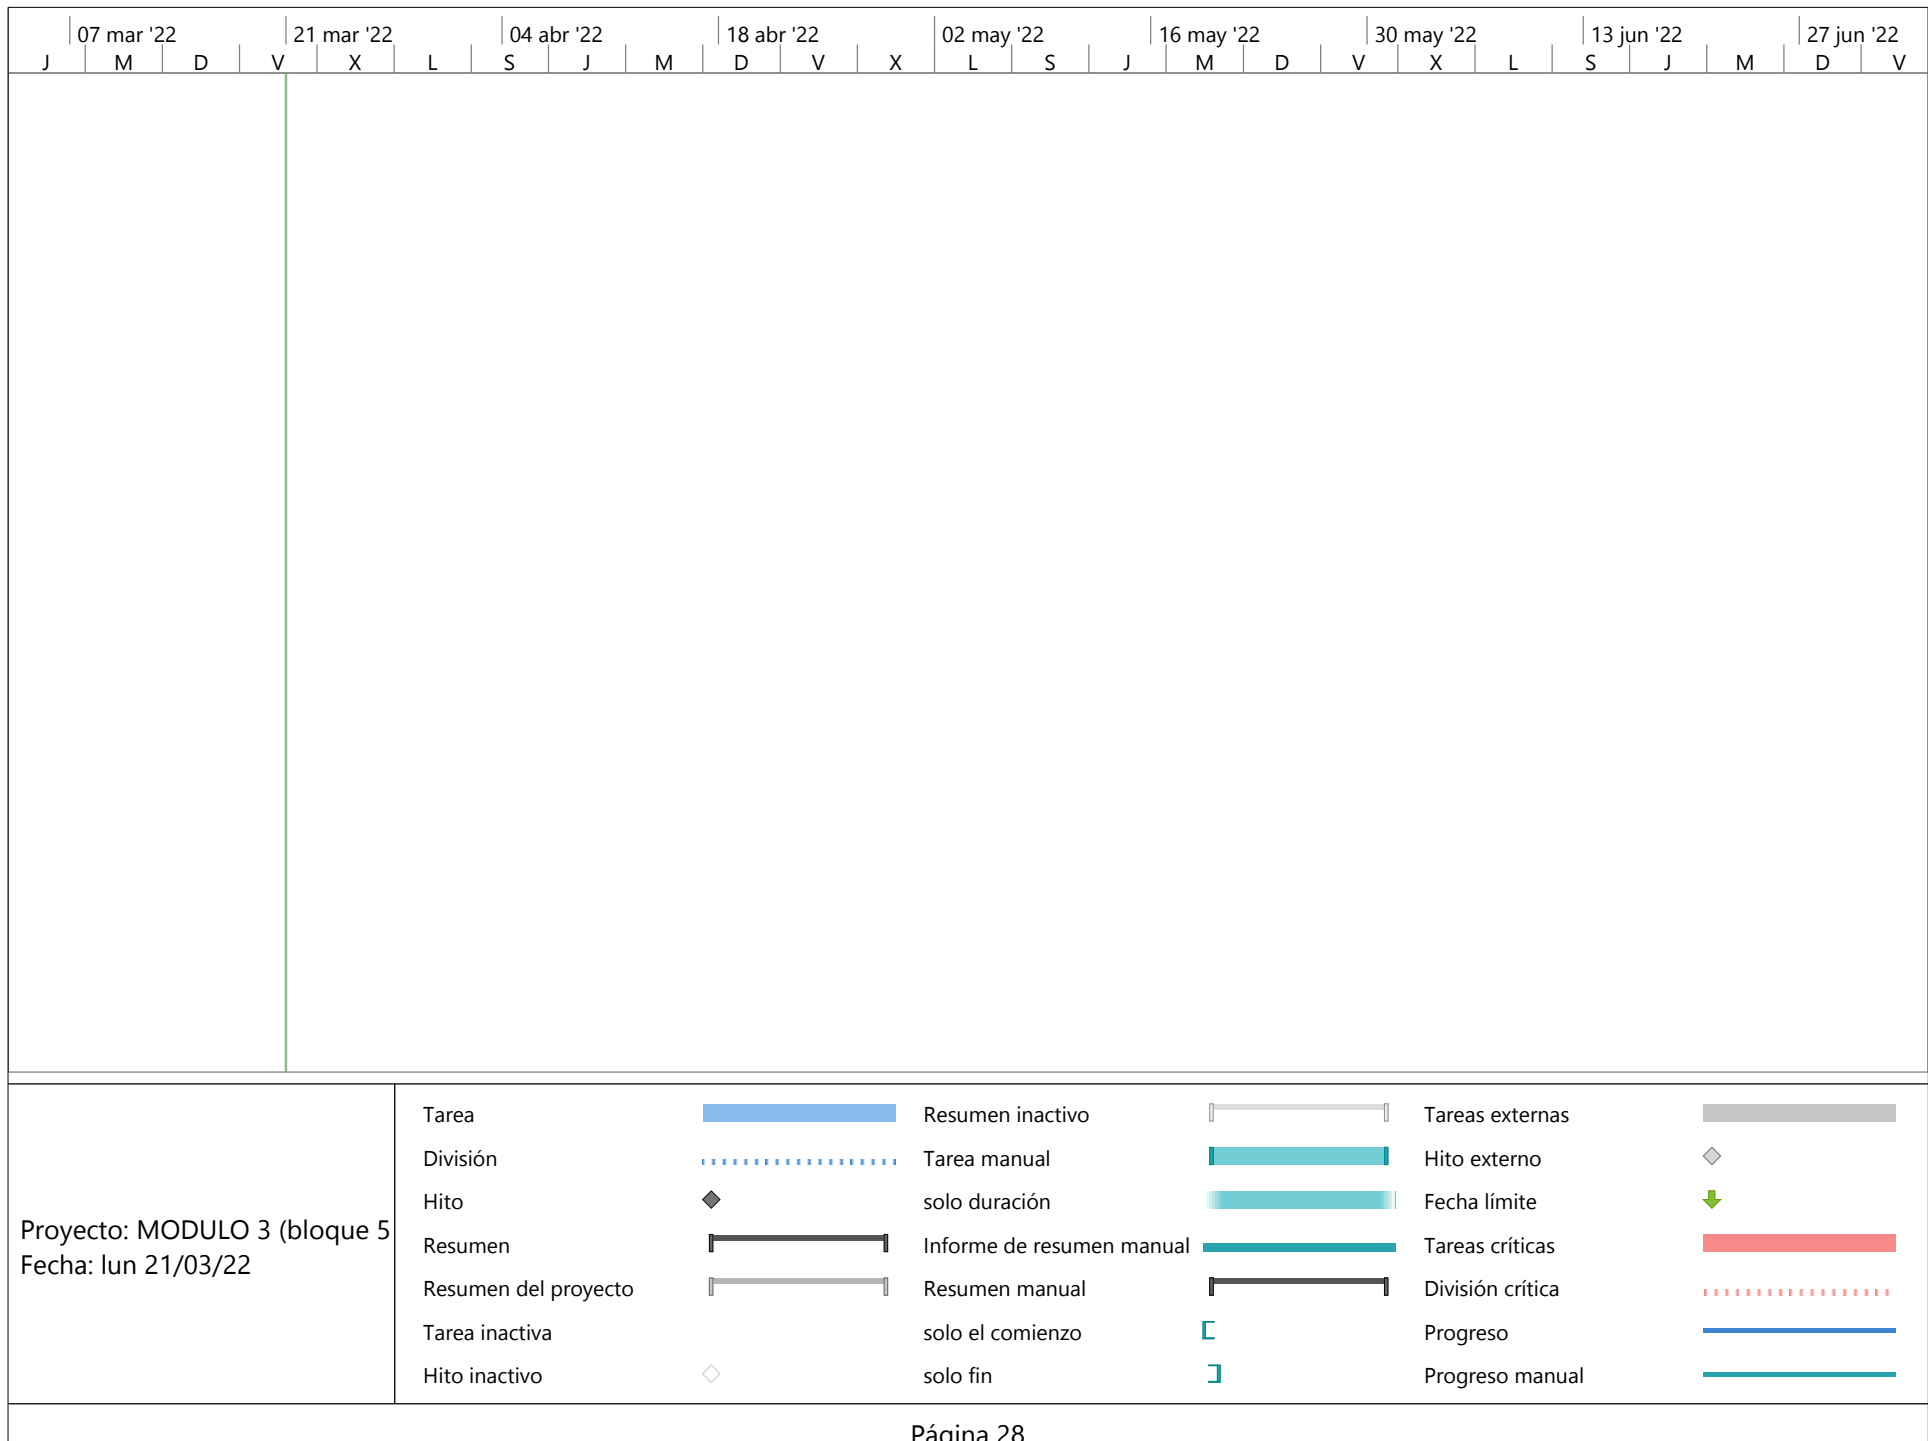

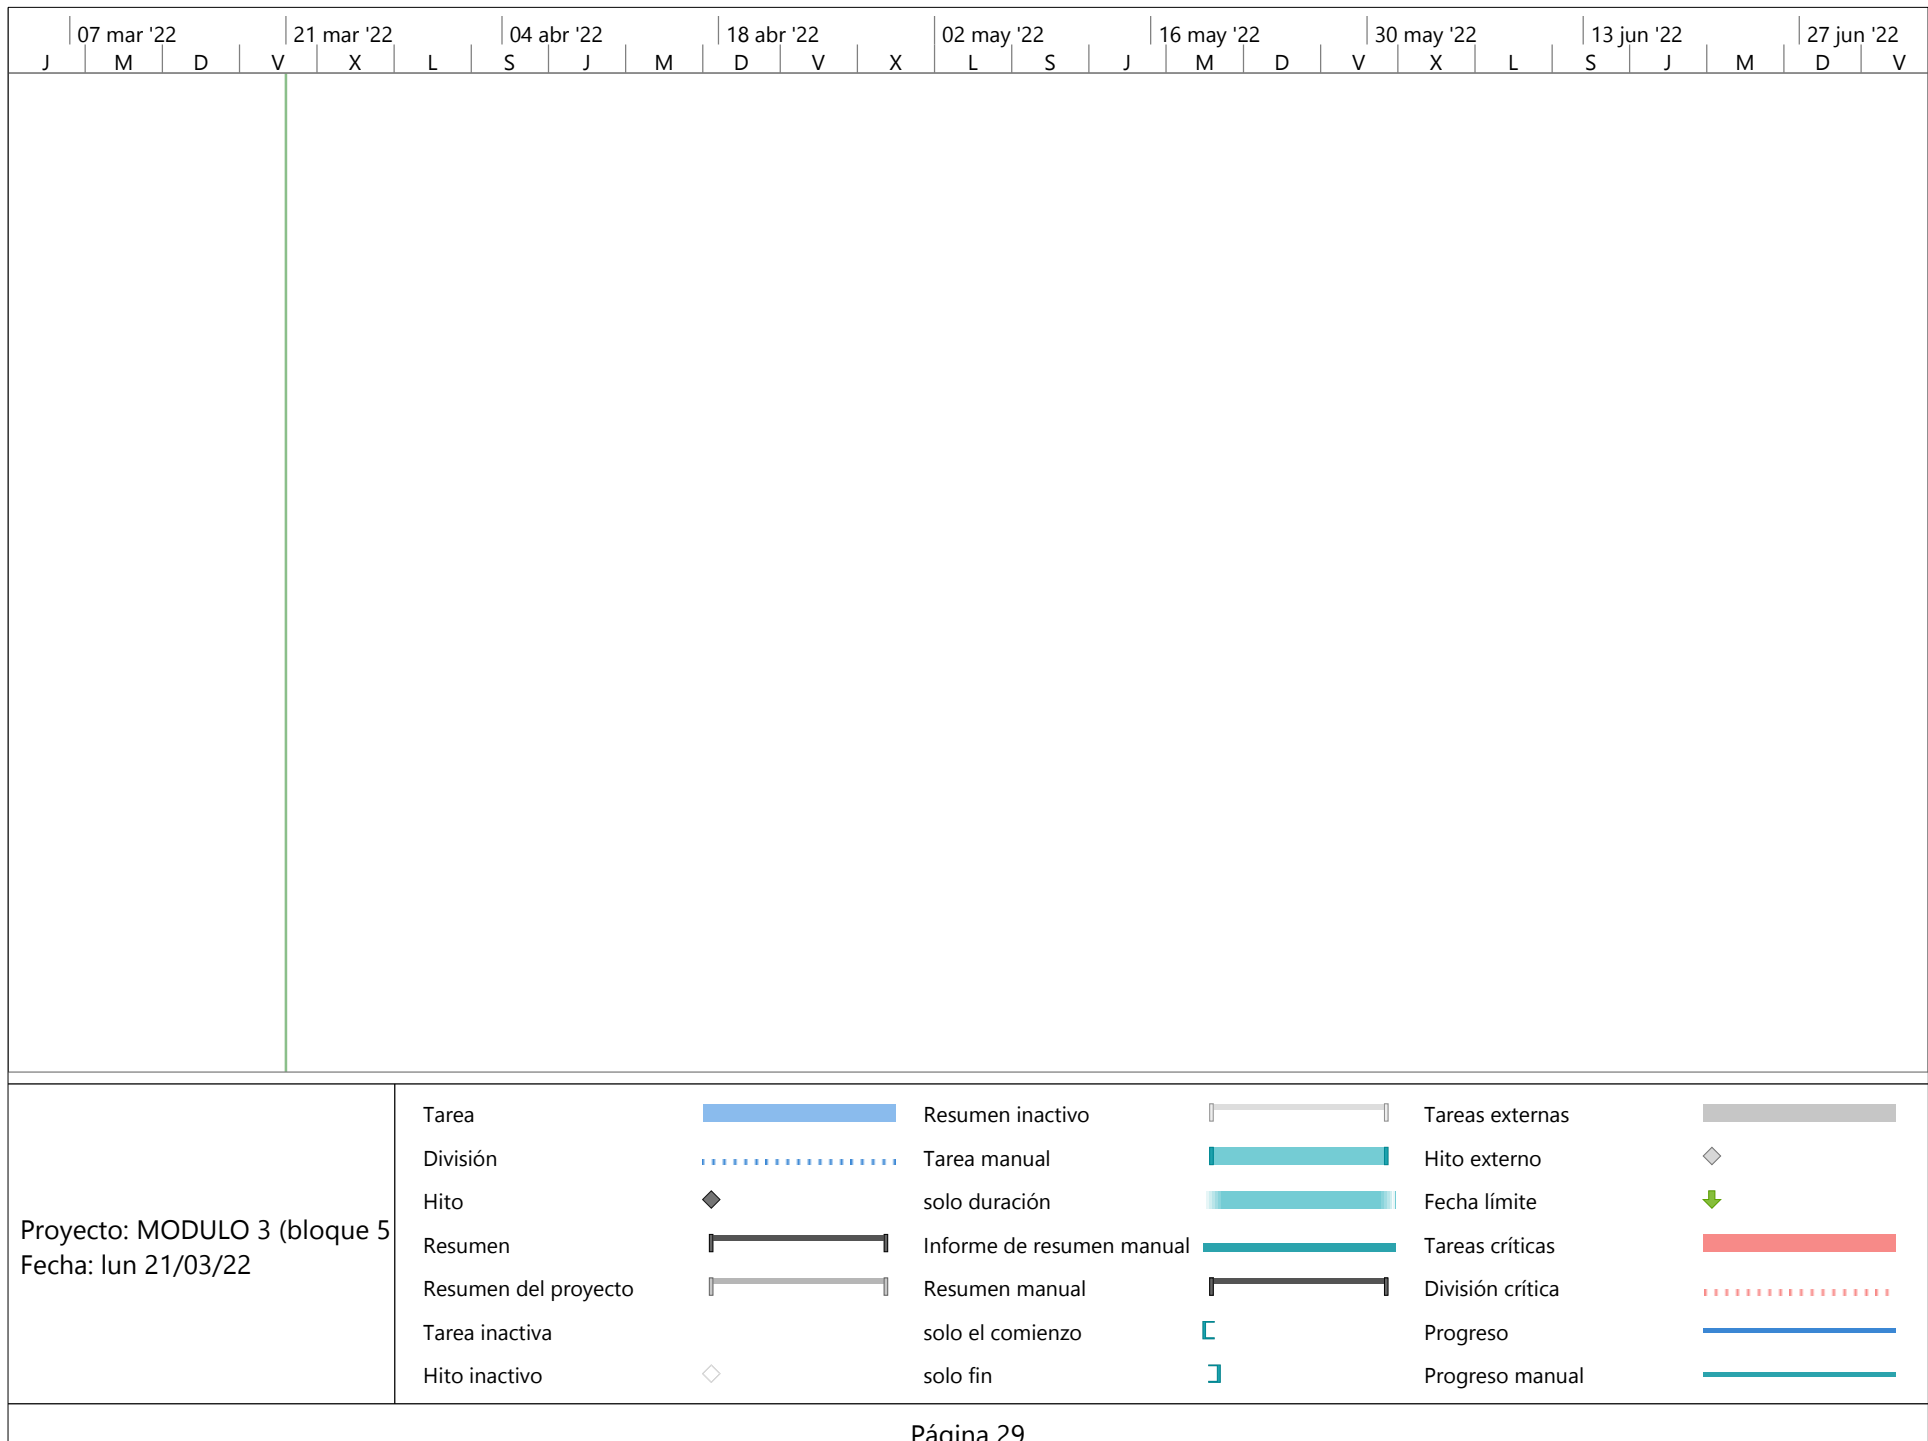













J	07 mar '22			V	21 mar '22			X	L	04 abr '22			S	J	M	18 abr '22			D	V	X	02 may '22			L	S	J	16 may '22			M	D	V	30 may '22			X	L	S	13 jun '22			J	M	27 jun '22			D	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Proyecto: MODULO 3 (bloque 5) Fecha: lun 21/03/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





		07 mar '22			21 mar '22			04 abr '22			18 abr '22			02 may '22			16 may '22			30 may '22			13 jun '22			27 jun '22		
J	M	D	V	X	L	S	J	M	D	V	X	L	S	J	M	D	V	X	L	S	J	M	D	V				
Proyecto: MODULO 3 (bloque 5) Fecha: lun 21/03/22				Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas																				
				División		Tarea manual		Hito externo																				
				Hito		solo duración		Fecha límite																				
				Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas																				
				Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica																				
				Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso																				
				Hito inactivo		solo fin		Progreso manual																				
Página 30																												
